



VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

2026

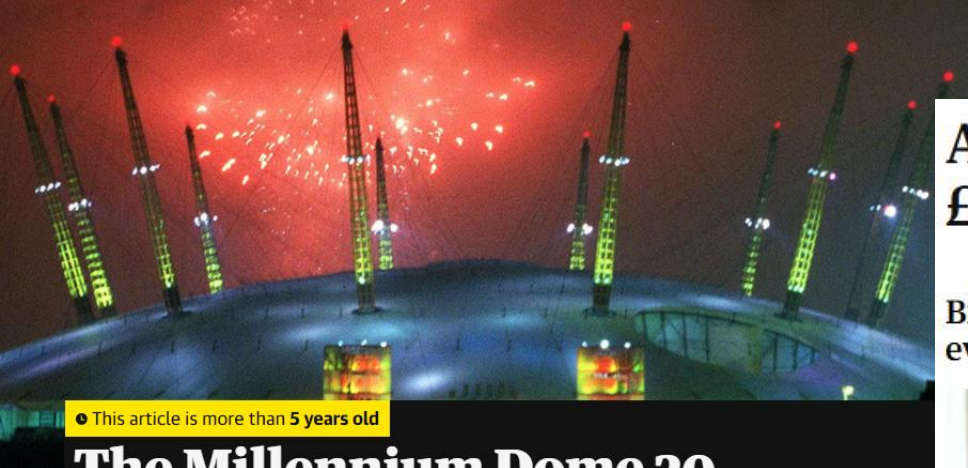

Abandoned NHS IT system has cost £10bn so far

Bill for abortive plan, described as 'the biggest IT failure ever seen', was originally estimated to be £6.4bn



Stuttgart 21 geht frühestens Ende 2027 in Betrieb

Die neue Chefin der deutschen Bahn, Evelyn Palla, hat sich in Stuttgart mit Projektpartnern getroffen. Bis Mitte nächsten Jahres soll ein neues Konzept für die Inbetriebnahme stehen.

🕒 2 min

21. Juni 2017, 17:40 Uhr | Lesezeit: 2 Min.



Kosten für BER übersteigen sieben Milliarden Euro

Fehlplanungen, Verzögerungen und Baumängel lassen die Kosten für den neuen Hauptstadtflughafen auf mehr als sieben Milliarden Euro steigen. Ursprünglich sollten es einmal zwei Milliarden sein.




QUELLEN

- Projektmanagement für Einsteiger (Mark Johnson)
- Projektmanagement (Litke,Kunow,Schulz-Wimmer)
- Projektmanagement Handbuch (Benjamin Michels)
- Jörg Klumpp (<https://jklumpp.de/>)
- openPM (<https://www.openpm.info/>)
- Wikipedia (<https://de.wikipedia.org/>)

VORSTELLUNG UND EINFÜHRUNG

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

BASTI(AN) SCHIECK

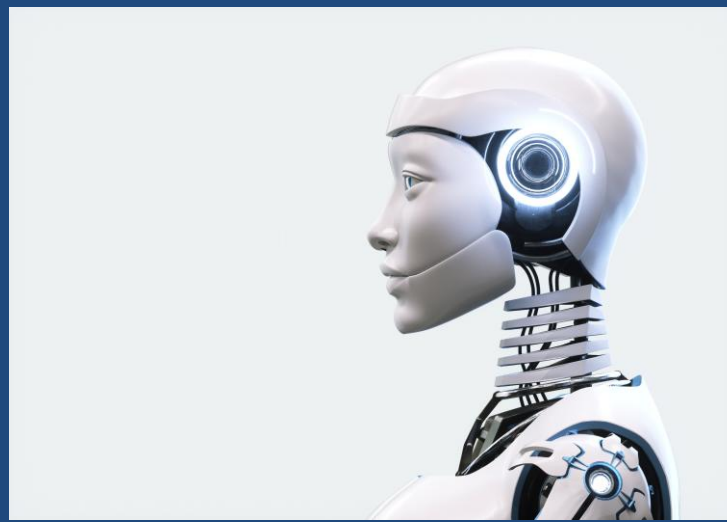

WER BIST DU?



BITTE ERZÄHLE MIR FOLGENDES:




DEIN NAME



AUSBILDUNGSUNTERNEHMEN

ERWARTUNGSMANAGEMENT

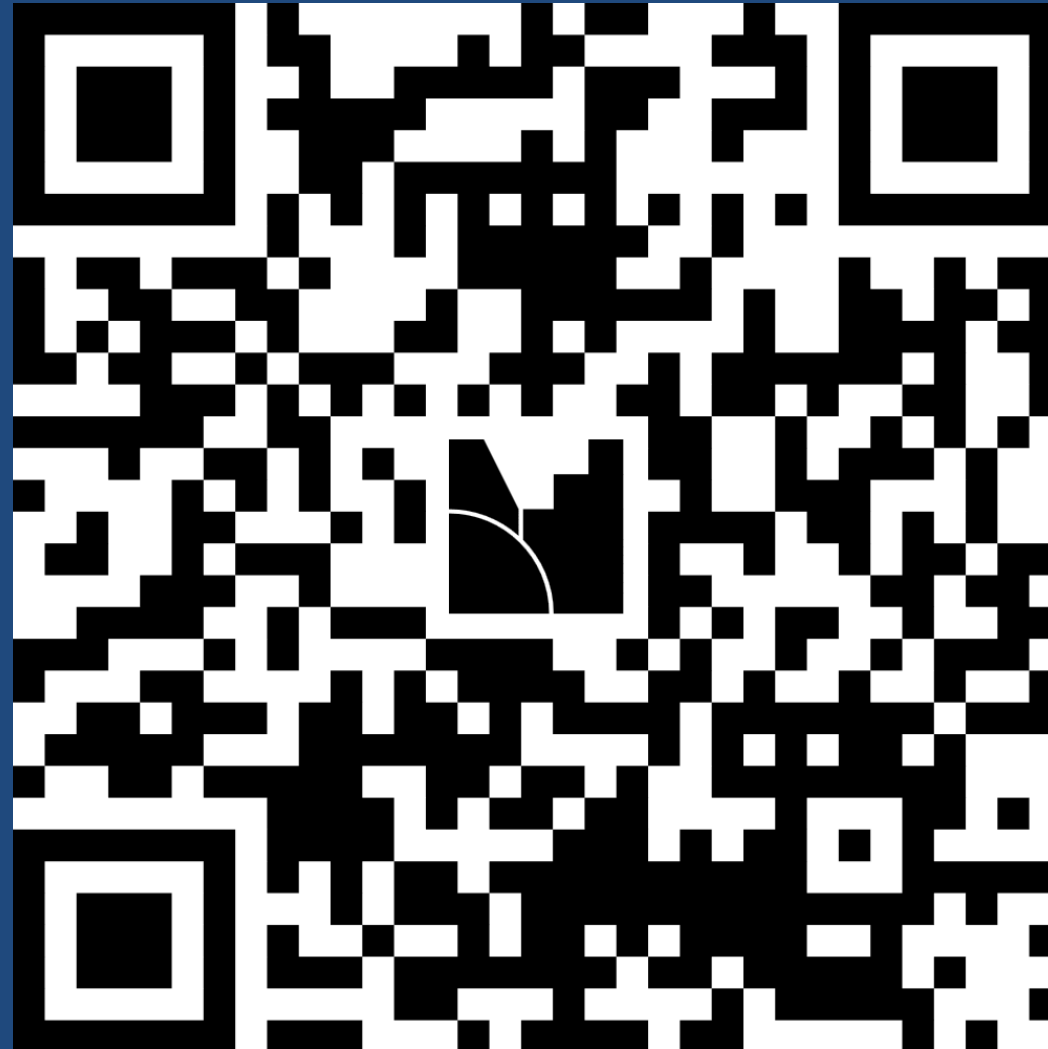

NOTENGEBUNG

Journal (10%)


Gruppenarbeit (40%)

Hausarbeit (50%)


WICHTIGE DATEN

- EINTEILUNG DER GRUPPEN
 - 26.02.26 EXCEL VOLLSTÄNDIG
- ABGABE DER HAUSARBEIT + TAGEBUCH
 - 08.05.2026 – 18:00 UHR
- ABGABE DER PRÄSENTATIONEN
 - 23.04.2026 – 18:00 UHR
- HALTEN DER PRÄSENTATIONEN
 - 24.04.2026

NOTENGEBUNG

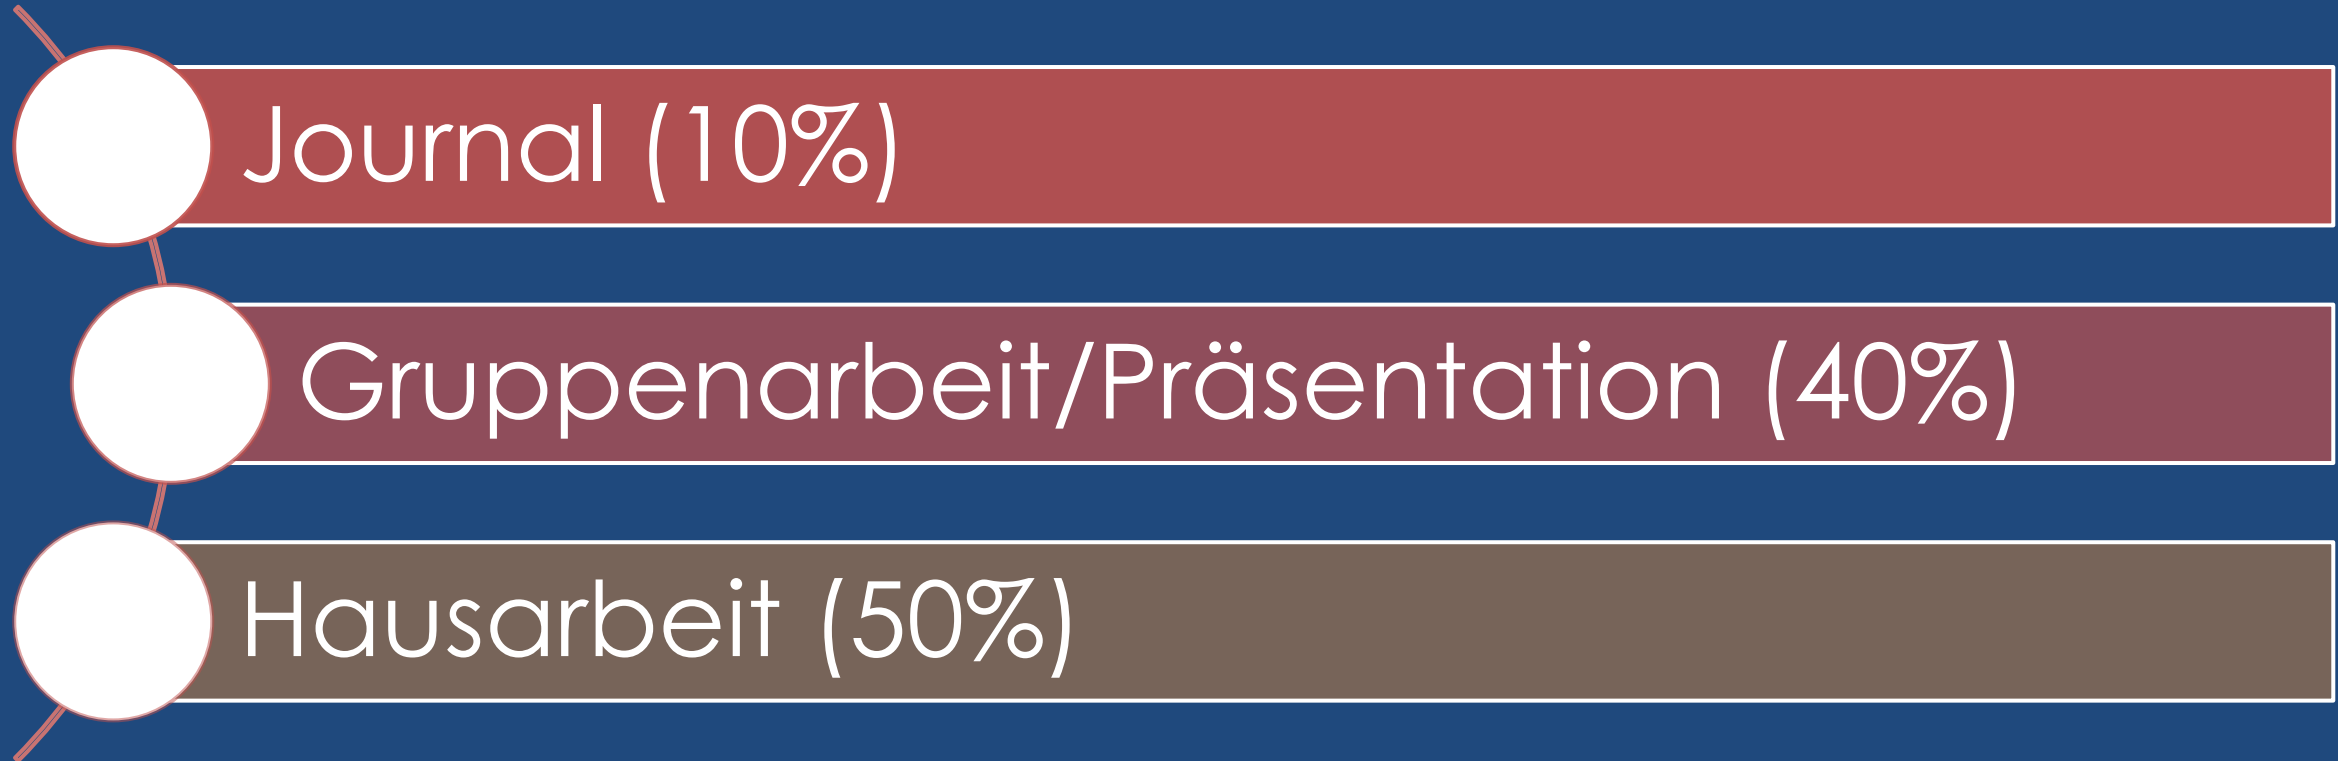


NOTENGEBUNG



Journal (10% - max. 6 Punkte)

- Dabei sein bei jeder Vorlesung
- Recap nach den Vorlesungen
- 3 Bullet Points mit den größten Learnings / kurzen Zusammenfassungen der Learnings
- Abgabe zusammen mit der Hausarbeit – reicht als Word oder als Print eurer Notes


NOTENGEBUNG

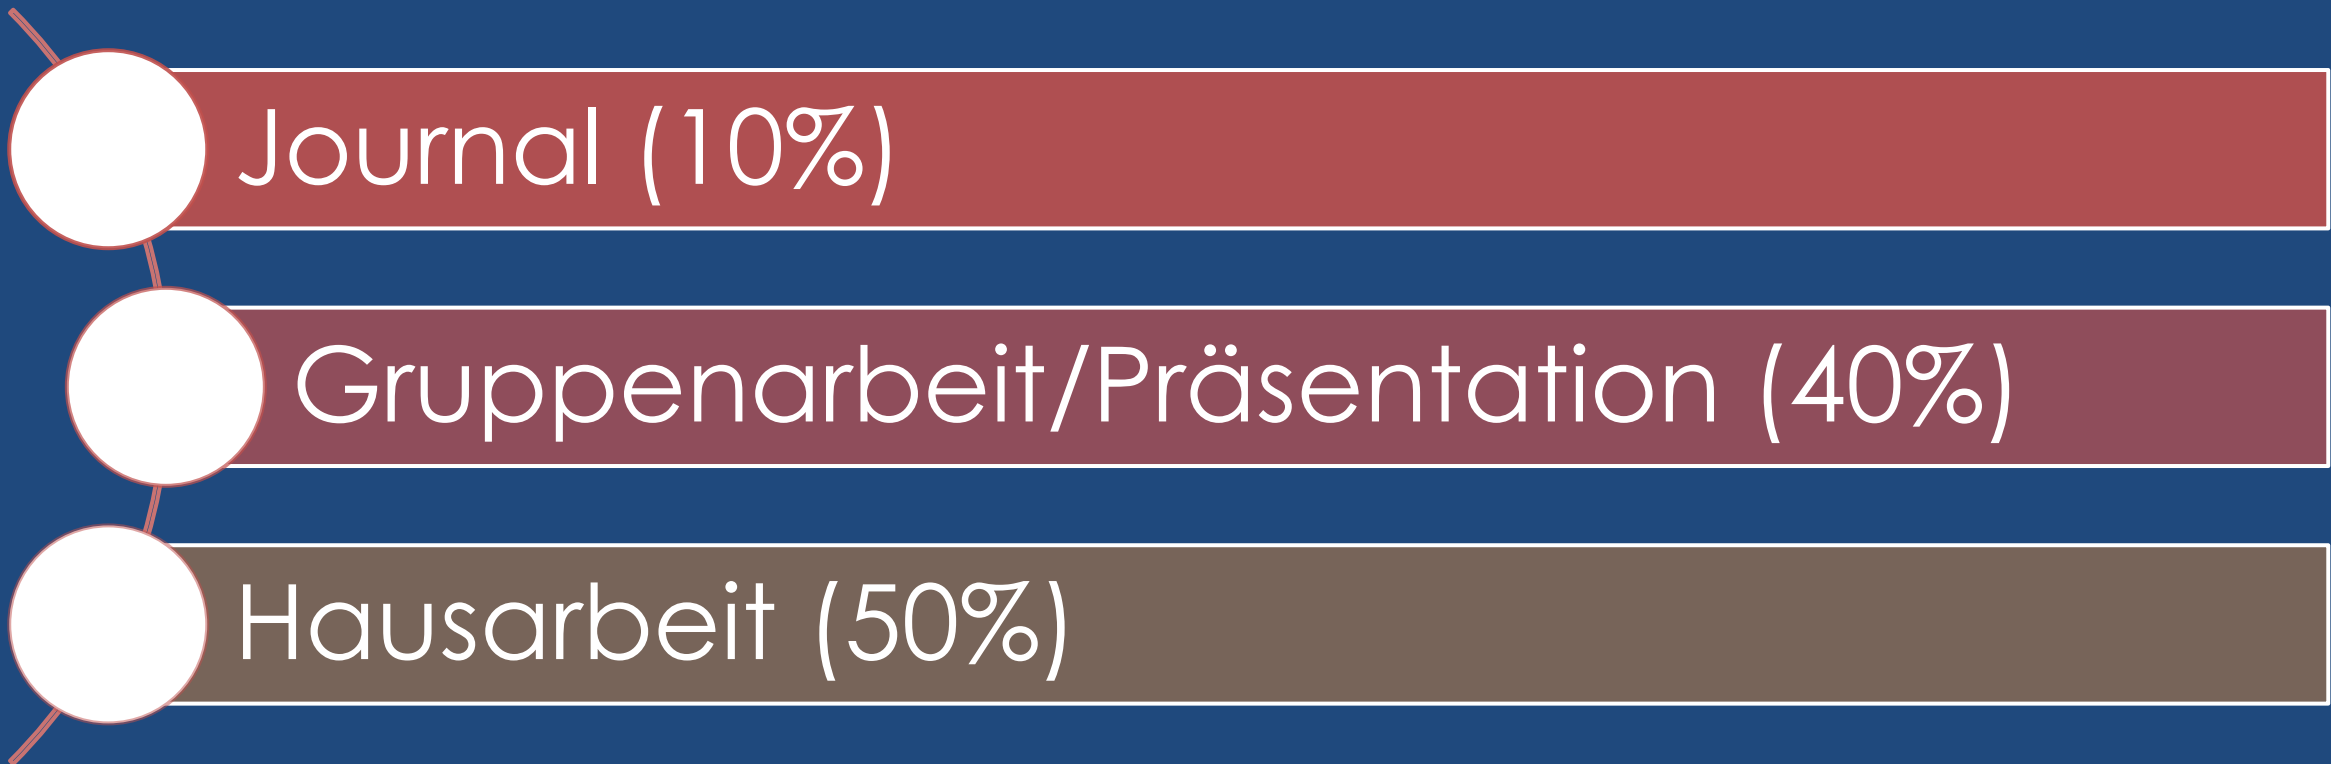

Journal (10%)

Gruppenarbeit/Präsentation (40%)


Hausarbeit (50%)



Gruppenarbeit/Präsentation (40%) – max. 24 Punkte

- Thema: Projektmethode
 - Grundlagen und Hintergrund
 - Umsetzung in der Praxis
 - Stärken und Schwächen
 - Relevante Artefakte
- Anforderungen
 - Gruppenpräsentation
 - Präsentationsdauer: 15 Minuten
 - Kurz Rückfragen durch mich
- Gruppen
 - 5 Student*innen (Wer präsentiert ist euch überlassen) – eine 5er Gruppe
 - Keine individuelle Bewertung
- Gruppenliste in Excel

NOTENGEBUNG



Gruppenarbeit/Präsentation (40%) – max. 24 Punkte

PMI / PMBOK

PRINCE2

SAFe

Kanban

Lean

Extreme
Programming

Design
Thinking

Scrumban

BEWERTUNG GRUPPENARBEIT

Vorlesung Projektmanagement

Kriterien	Gewichtung
Optik	0,5
Grundlagen	1
Anwendungsgebiete	1
Stärken und Schwächen	1
Relevante Artefakte	1
Fazit der Gruppe	1

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG


- OPTIK UND AUFTRETEN:
 - PROFESSIONELLES AUFTRETEN
 - ÜBERSICHTLICHE SLIDES
- GRUNDLAGEN:
 - WAS IST DIE METHODIK
 - WIE FUNKTIONIERT SIE
 - WAS CHARAKTERISIERT SIE
 - SEIT WANN GIBT ES SIE
 - IN WELCHEM KONTEXT WURDE SIE POPULÄR?
- ANWENDUNGSGEBIETE
 - ART VON PROJEKTEN
 - INDUSTRIEN
 - UMFANG EINES MÖGLICHEN PROJEKTS (KURZPROJEKTE ODER MONATELANG?)
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
 - ZU WELCHEN SZENARIEN PASST DIE METHODIK BESONDERS GUT?
 - WO ZEIGT DIE METHODIK IHRE STÄRKEN?
 - WORIN LIEGEN DIE SCHWÄCHEN DER METHODIK? WANN SOLLTE SIE BESSER NICHT EINGESETZT WERDEN

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG

- RELEVANTE ARTEFAKTE
 - WELCHE DOKUMENTE SIND UNABDINGBAR – PLANUNGSARTEFAKTE
 - WELCHE ARTEFAKTE ENTSTEHEN WÄHREND DER DURCHFÜHRUNG - DURCHFÜHRUNGSARTEFAKTE
 - WIE SIEHT DER OUTPUT DER METHODIK AUS? WIE DER MÖGLICHE PROJEKTPLAN? – ERGEBNISARTEFAKTE
- FAZIT
 - QUASI ONE-PAGER MIT ABLAUF, ANWENDUNGSGEBIETEN, STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
 - KÖNNTE DIE METHODIK IM STUDIENKONTEXT GENUTZT WARDEN?

ABGABE AN SCHIECK.DHBW@WEB.DE MIT PPTX
IM ANHANG!

NOTENGEBUNG

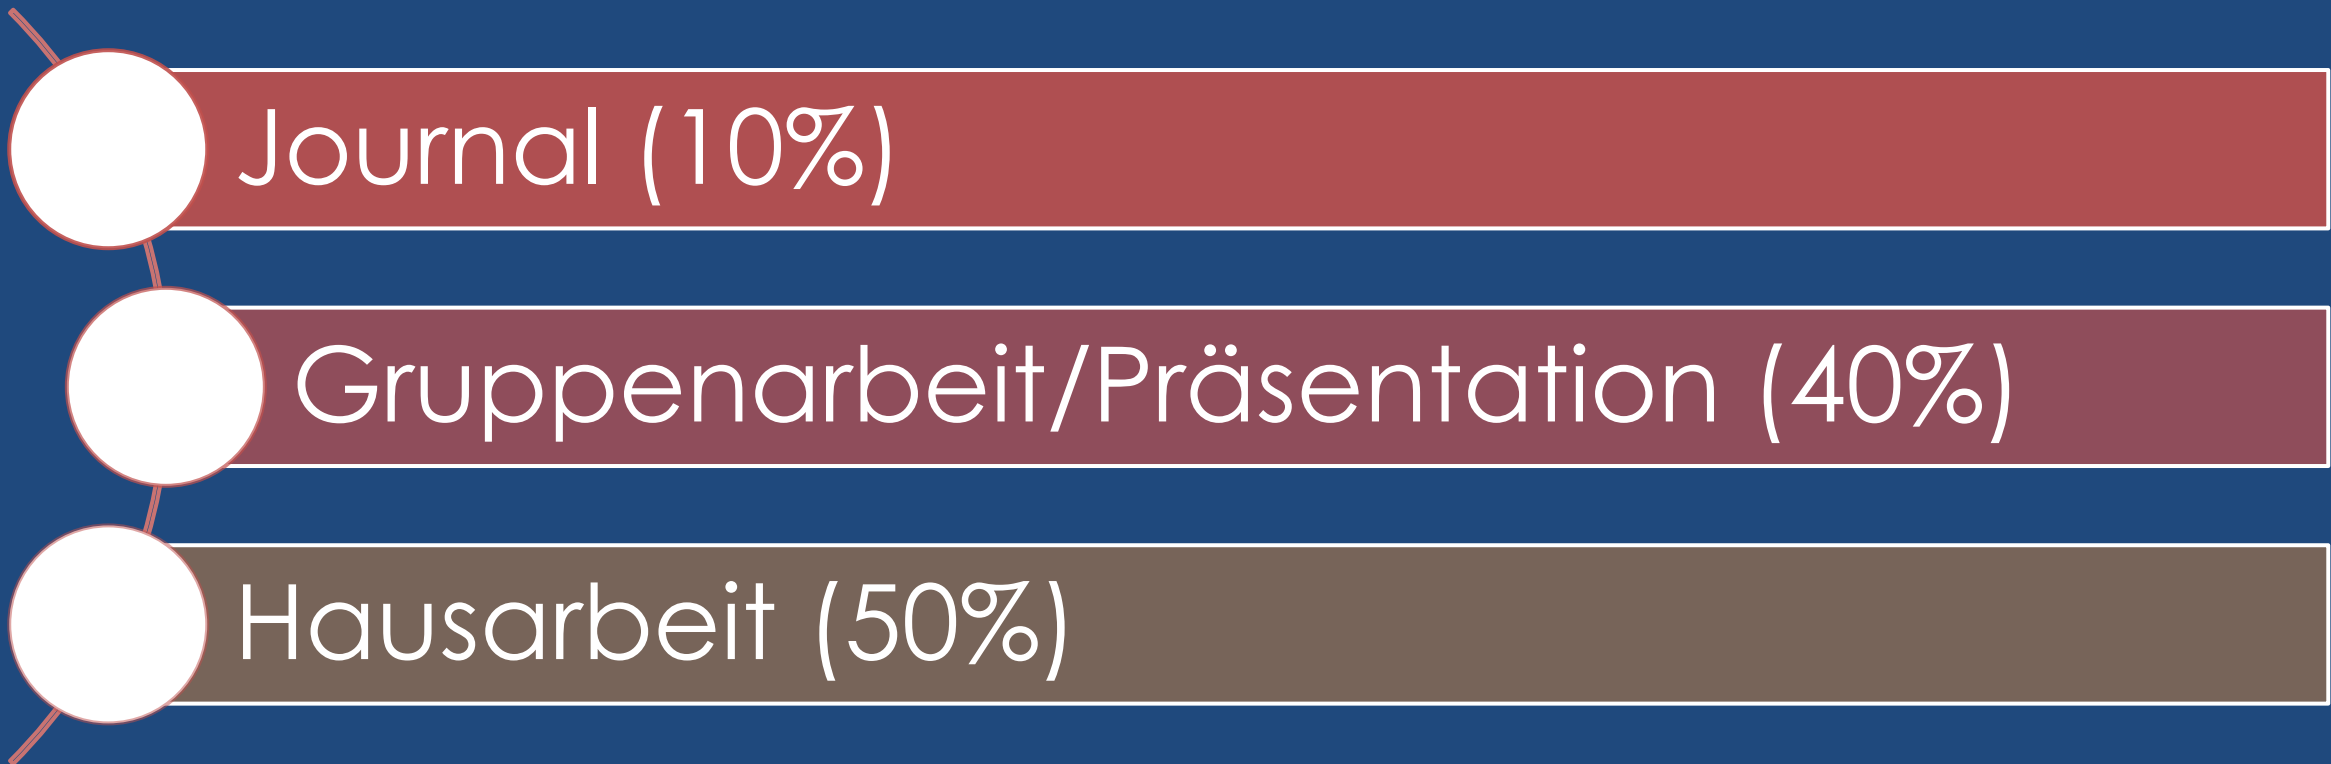

Journal (10%)

Gruppenarbeit/Präsentation (40%)

Hausarbeit (50%)

NOTENGEBUNG

Hausarbeit (50%) – max. 30 Punkte

- THEMA:
EIGEN GEWÄHLTES PERSÖNLICHES
PROJEKT
- KEINE GRUPPENARBEIT
- KEINE PLAGIATE – EHRENWÖRTLICHE
ERKLÄRUNG MUSS ENTHALTEN SEIN
- AUSARBEITUNGSUMFANG
 - AUSARBEITUNG VON 4 DATEIEN
 - KEINE ANHÄNGE
- RÜCKFRAGEN BIS ZUR LETZTEN
VORLESUNGSSTUNDE

WICHTIGER HINWEIS

**HAUSARBEITEN OHNE EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG
WERDEN MIT 0 PUNKTEN BEWERTET.**

ES WIRD GPT0 ZUM ÜBERPRÜFEN VON KI
VERWENDET.

KI MAßVOLL EINSETZEN

DETAILS AUSARBEITUNG HAUSARBEIT

- DECKBLATT 1 SEITE
PROJEKTNAME, NAME STUDENT*IN, IMMATRIKULATIONSNUMMER, UNTERNEHMEN, DATUM, ...
 - INKL. EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG UND UNTERSCHRIFT
- HINTERGRUND, DAZU PASSENDE PROJEKTMETHODIK UND BEGRÜNDUNG, NACH UNSEREN VORGABEN FORMULIERTE ZIELE MAX. 3 SEITEN
- STAKEHOLDER UND STAKEHOLDERMANAGEMENT MAX. 1 EXCELDATEI
- RISIKOMANAGEMENT (TABELLARISCH) MAX. 1 EXCELDATEI
(MIN. 5 / MAX. 10 RISIKEN)
- PROJEKTPLAN (GANT-CHART) 1 PDF-DATEI BIS DIN A0

BEWERTUNG HAUSARBEIT

Kriterien	Punkte
Deckblatt	1
Hintergrund	3
Projektmethodik + Begründung	5
Ziele	4
Stakeholder + Management	4
Risikomanagement	4
Projektplan	9
Summe	30

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG

- DECKBLATT
 - WIE BESCHRIEBEN
- HINTERGRUND
 - WAS IST DAS PROJEKT?
 - IN WELCHEM KONTEXT FINDET DAS PROJEKT STATT
 - ENTSPRICHT ES UNSERER PROJEKTDEFINITION?
- PROJEKTMETHODIK + BEGRÜNDUNG
 - WELCHE PROJEKTMETHODIK WURDE GEWÄHLT
 - WIE WIRD DIESE IN EUREM PROJEKT UMGESETZT
 - WIESO PASST DIESE METHODIK BESSER, ALS **EINE** ANDERE (VERGLEICH)

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG

- ZIELE
 - MIN 3, MAX 5
 - SMART ODER ANDERES FRAMEWORK AUS DER VL
 - WERTE FÜR ZEIT, QUALITÄT UND RESSOURCEN ANGEBEN
- STAKEHOLDER UND STAKEHOLDER MANAGEMENT
 - MAX 10 ZENTRALE STAKEHOLDER IDENTIFIZIEREN UND BESCHREIBEN
 - EINSTELLUNG ZUM PROJEKT
 - EINFLUSS DES STAKEHOLDERS
 - BEEINFLUSSBARKEIT DES STAKEHOLDERS
 - MAßNAHMEN

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG

- RISIKOMANAGEMENT
 - MIN 5, MAXIMAL 10 RISIKEN
 - BESCHREIBUNG
 - IMPACT AUF DAS PROJEKT
 - EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT
 - EINORDNUNG IN RISIKOMATRIX
 - RISIKOSTRATEGIE UND MAßNAHMEN
 - KOSTEN DER STRATEGIE

WEITERER INPUT ZUR NOTENGEBUNG

- PROJEKTPLAN
 - ABHÄNGIG VON DER METHODIK – GANTT, NETZPLAN ODER ALTERNATIVEN
 - KLARES START UND ENDDATUM (ERRECHNET)
 - DETAILLIERTE ARBEITSPAKETE
 - PARALLELISIERUNG FALLS SINNVOLL
 - MEILENSTEINE EINGEZEICHNET
 - PUFFER
 - KRITISCHER PFAD SICHTBAR
 - ANNAHMEN KOMMENTIERT
 - -> BEI ANDEREN METHODEN AUCH GERNE AUF MICH ZUKOMMEN

BEISPIELE HAUSARBEITEN - STAKEHOLDER

Stakeholder Analyse									
Projektname:	CRM-Einführung	Datum	06.07.2022						
Verantwortlicher:									
Stakeholder	Beschreibung / Ziele / Interessen	Einstellung zum Projekt	Bemerkungen	Einfluss des Stakeholders	Bemerkungen	Beeinflussbarkeit des Stakeholders	Bemerkungen	Gewichtung	Maßnahmen
Lieferant	Liefert das neu einzusetzende CRM-System	Positiv (1)	möglicher Zugewinn eines neuen Kunden	Groß (4)	Lieferant der neuen Software, damit ggf. Limitierung von gewünschte Funktionen	Gering (2)	ggf. durch Preisgestaltung beeinflussbar	Mittel (7)	zusätzliche Entwickler vorhalten, falls der externe Lieferant nicht alle Wünsche umsetzen kann
Bank	Freigabe von Fördermitteln	Positiv (2)	zusätzliche Einnahmequelle für die Bank	Klein (1)	Auflagen für die Finanzierung werden von den Behörden vorgegeben	Gering (1)	Bank ist an Auflagen gebunden	Niedrig (4)	-
Aufsichtsbehörde	Einhaltung der Richtlinien	Neutral (3)	unabhängig	Groß (4)	kann dazu führen, dass Fördermittel gestrichen werden	Hoch (4)	durch Berücksichtigung der Auflagen in Vorhinein	Hoch (11)	Berücksichtigung der Auflagen in der Analysephase durch Kontakt mit behördlichen Ansprechpartnern
Endnutzer aus Abteilungen	Endnutzer der einzuführenden CRM Software	Neutral (3)	positiv: neue Software erleichtert Arbeitsprozesse; negativ: bekannte Prozesse werden abgelöst -> Bereitschaft für Umstellung nötig	Mittel (3)	wenig Begeisterung und zu geringes Wissen bzgl. der Bedienung der neuen Software könnten die Produktivitätszuwächse schmälern	Hoch (4)	kann durch entsprechende Kommunikation in den Auswahlprozess mit einbezogen werden	Mittel (10)	Schulungen einplanen, um Mitarbeitenden die Vorteile der neuen Software-Lösung näher zu bringen, sowie Einstiegshürden zu erleichtern
CFO	Einhaltung finanzieller Restriktionen	Negativ (4)	Investitionen nötig, die das Betriebsergebnis gefährden könnten	Mittel (3)	stellt finanzielle Mittel zur Verfügung	Hoch (5)	kann intern durch stichhaltige Argumente überzeugt werden, dass sie die getätigte Investitions amortisiert	Hoch (12)	Amortisationsrechnungen für optimistische und pessimistische Annahme erstellen und präsentieren
Unternehmensvorstand (CEO etc.)	Einführung neuer Software, die zukünftige Anforderungen erfüllen soll, um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen	Positiv (1)	Initiator des Projektes	Hoch (5)	hat im Zweifel ein Einspruchsrecht	Mittel (3)	Beeinflussung durch regelmäßige Projektstatus-Reports	Mittel (9)	regelmäßige Projektstatus-Reports
Projektmanager	Planung der Ressourcen / Leitung des Projektes	Positiv (2)	Aussicht auf mittelfristige Beschäftigung	Groß (4)	insbesondere bzgl. des Zeitmanagements	Gering (2)	handelt nach Vorgaben / Zielen gegeben durch den Vorstand	Mittel (8)	Sicherstellung eines transparenten Informationsflusses durch regelmäßige Stand-Ups
IT-Abteilung	Wartung und Support für neue Software-Lösung	Negativ (4)	zusätzliche Aufwände für Wartung und Support notwendig	Klein (2)	bei der Auswahl der Software ist ein Mitarbeitender der IT-Abteilung involviert	Hoch (4)	Einbezug in Wahl der Softwarelösung	Mittel (10)	bei Auswahl der neuen Software zuvor Abstimmung mit der gesamten IT-Abteilung
Customer Service	möglichst geringe Störungen / Einschränkungen bedingt durch die Einführung des CRM	Neutral (3)	positiv: Entlastung der Mitarbeitenden in der Zukunft; negativ: infolgedessen mögliche Entlassungen	Mittel (3)	bei der Auswahl der Software sind Teile des Customer Service involviert	Hoch (4)	Berücksichtigung im Projektplan	Mittel (10)	Go-Live auf Phase mit vergleichsweise weniger Kundeninteraktionen datieren


PROJEKTNAME	Rollout neuer Kopierer	PROJEKTNUMMER	11-2-1-3	
VERANTWÖRTLICHER		DATUM	11.07.2022	
STAKEHOLDER	ZIELE / INTERESSEN	EINSTELLUNG ZUM PROJEKT (1-5)	BEINFLUSSBARKEIT DES STAKEHOLDERS (1-5)	EINFLUSS DES STAKEHOLDERS (1-5)
Alexander Disqué (Projektleiter)	Ist als Projektleiter für den Erfolg des Projektes verantwortlich.	Positiv (2)	Sehr Klein (1)	Hoch (4)
Jeff Bezos (CEO des Unternehmens)	Steht als Leiter des Unternehmens Geld und Ressourcen zur Verfügung.	Sehr Positiv (1)	Mittel (3)	Sehr Hoch (5)
Leon Jäger (Mitarbeiter aus der IT)	Unterstützt den Projektleiter mit dem nötigen Know-How.	Mittel (3)	Groß (4)	Gering (2)
Hans Zimmer (CEO des Lieferanten)	Ist als Leiter des Zulieferungsunternehmens für die korrekte Bereitstellung der benötigten Geräte verantwortlich.	Positiv (2)	Mittel (3)	Mittel (3)
Klaus Schäfer (Mitarbeiter der Bank / Aufsichtsbehörde)	Verwaltet die öffentlichen Fördermittel und überwacht die Verteilung dieser.	Negativ (4)	Klein (2)	Mittel (3)

BEISPIELE HAUSARBEITEN – RISIKOMANGT.

Risiko Management									
Projektnummer: 1111		Projektname: Softwareeinführung kleines Unternehmen (CRM-Software)							
Gesamtes Projektrisiko:		6.176.011,00 €	25%	Gesamtdauer des Projektes 01.01.2023-01.07.2023					
Risiko	Beschreibung	Verantwortlich	Stakeholder	Kosten	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahmen	Behandlung	
1	Mitarbeiterkrankheit	Krankheitsbedingte Ausfälle aufgrund der Winterzeit	Projektleiter	Projektteam, Unternehmen	2.000.000,00 €	Verringerte Verfügbarkeit von Ressourcen, potenzielle Verzögerungen	50%	Erstellung eines Ressourcenplans für mögliche Vertretungen und Aufgabenpriorisierung	Wöchentliche Überprüfung des Ressourcenplans und Anpassung bei Bedarf.
2	Verzögerung	Verzögerung von 2 Wochen aufgrund interner Gründe	Projektleiter	Projektteam, Unternehmen	200.000,00 €	Verschiebung des Projektzeitplans	100%	Identifizierung der internen Gründe für die Verzögerung und Implementierung von Maßnahmen zur Aufholung des Rückstands	Regelmäßige Kommunikation mit dem Projektteam zur Überwachung des Fortschritts und Identifizierung von Maßnahmen zur Beschleunigung des Prozesses.
3	Schwierige Vertragsverhandlungen	Herausforderungen bei der Verhandlung und Klärung von Vertragsbedingungen aufgrund einer externen Kanzlei	Projektleiter	Projektteam, Lieferant	200.000,00 €	Verzögerungen bei der Vertragsgestaltung und Unsicherheit über Liefervereinbarungen	40%	Einbeziehung von erfahrenen Vertragsanwälten, enge Kommunikation und Klärung von Erwartungen mit dem Lieferanten	Dokumentation der Vertragsverhandlungen, festgehaltene Vereinbarungen und getroffene Entscheidungen.
4	Fehlende IT-Infrastruktur	Mangelnde technische Infrastruktur für die Implementierung der CRM-Software	Projektleiter	IT-Abteilung, Projektteam	600.000,00 €	Einschränkungen bei der Implementierung und Leistung der Software	20%	Dokumentation der Infrastrukturbewertung, erforderlicher Ressourcen und Einbindung der IT-Abteilung zur Identifizierung und Bewertung von Alternativen, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Lieferanten und regelmäßige Überprüfung der Vereinbarungen	Dokumentation der Infrastrukturbewertung, beschaffter Ressourcen und Implementierung der erforderlichen Änderungen.
5	Abhängigkeit von externen Lieferanten	Abhängigkeit von externen Lieferanten für Software, Dienstleistungen usw.	Projektleiter	Lieferant, Projektteam	200.000,00 €	Verzögerungen und Unsicherheit in Bezug auf Lieferungen und Leistungen	20%	Regelmäßige Kommunikation mit Lieferanten, Überprüfung der Leistung und Aktualisierung von Vereinbarungen bei Bedarf.	Regelmäßige Kommunikation mit Lieferanten, Überprüfung der Leistung und Aktualisierung von Vereinbarungen bei Bedarf.
6	Mangelnde Schulung und Kenntnisse	Unzureichende Schulung der Mitarbeiter für die Nutzung der CRM-Software	Zweiter Teilprojektleiter	Projektteam, Unternehmen	15.000,00 €	Geringe Akzeptanz und ineffektive Nutzung der neuen Software	10%	Entwicklung eines umfassenden Schulungsplans, Durchführung von Schulungen und kontinuierliche Unterstützung für die Mitarbeiter	Regelmäßige Überprüfung des Schulungsfortschritts und Feedbacks der Mitarbeiter zur Anpassung des Schulungsplans.
7	Unzureichende Ressourcen durch unvorhergesehenen Preissteigerungen	Mangelnde personelle oder finanzielle Ressourcen für das Projekt und es kann zu unvorhergesehenen Preissteigerungen kommen z.B. von Seiten der CRM-Lieferanten	Projektleiter, CRM-Unternehmen	CFO, Projektleiter, CRM-Unternehmen	300.000,00 €	Überlastete Teammitglieder, Verzögerungen und Verminderung der Qualität	10%	Ressourcenmanagement und -zuweisung optimieren, Priorisierung von Aufgaben und enge Kommunikation mit dem CFO	Regelmäßige Überprüfung des Ressourcenbedarfs und -verfügbarkeit, Anpassung der Ressourcenplanung bei Bedarf.

Risiko	Beschreibung	Verantwortliche Stakeholder	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahmen
Krankheitsfälle	Aufgrund der Jahreszeit könne viele Mitarbeiter des Projekts erkranken	Projektteam Mitarbeiter*inne aus den Abteilungen	Reduzierte Ressourcen, Projektverlauf verzögert sich	60%(Hoch)	durch Impfung Mitarbeiter gegen saisonale Krankheiten, Ressourcenengpässe einplanen und temporäre Unterstützung bereitstellen
Verzögerung am Anfang des Projekts	wegen internen Problemem kommt es zu einer Verzögerung von 2 Wochen am Anfang des Projekts	Projektteam	Projektabschluss verzögert sich, Engpässe in den folgenden Projektphasen	40%(Mittel)	Ursachen identifizieren und beseitigen, um wieder im Zeitplan zu liegen, Frühzeitige Aufklärung der Stakeholder
Schwierigkeiten bei der Vertragsverlängerung	durch die Zusammenarbeit mit der externen Kanzlei gestaltet sich Klärung aller vertraglichen Themen sehr schwer	Projektteam Lieferantenprojektteam	Vertragsunterzeichnung verzögert sich, Missverständnisse bei Vertragsbedingungen	70%(Hoch)	klare Kommunikation mit Kanzlei, regelmäßige Updates zur aktuellen Lage, Vertragsbedingungen ausreichend verstehen und überprüfen
Technische Probleme	mit der neuen CRM-Software können Probleme auftreten, die die Implementierung der Nutzung beeinträchtigen kann	Projektteam IT-Leiter, Kollege aus der IT, Lieferantenprojektteam	Eingeschränkte Funktionalität, Geschäftsbetrieb könnte Unterbrochen werden	50%(Mittel)	ausführliches Testen vor der Implementierung der Software, vor Implementierung Schulung der User, guter Support vor und während Einführung

BEISPIEL PROJEKTPLAN

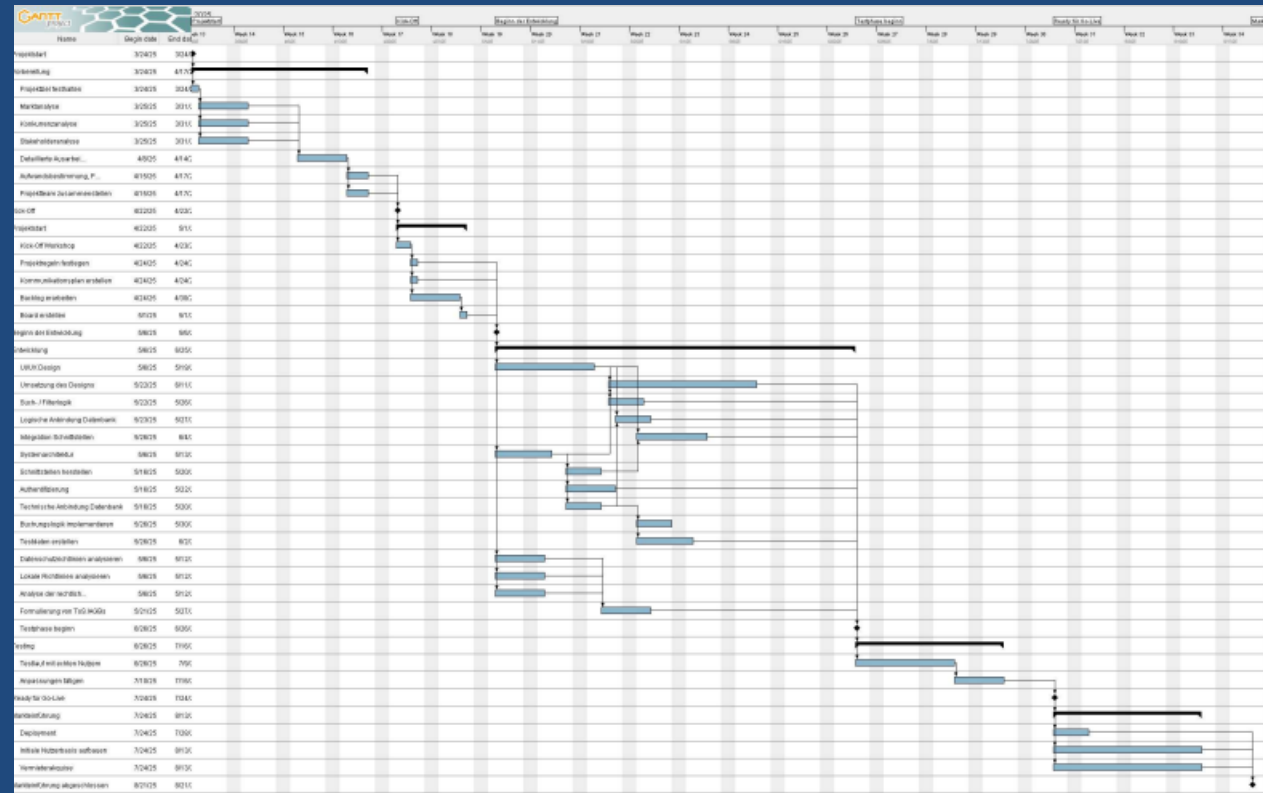

ABGABE AN SCHIECK.DHBW@WEB.DE MIT PDFS
UND EXCEL IM ANHANG!

LERNEINHEITEN UND INHALTE

LEHR- UND LERNEINHEITEN

PRÄSENZZEIT

SELBSTSTUDIUM

Projektmanagement

27

47

Definition von Projekt und Projektmanagement - Projektauftrag - Projektziele - Anforderungen - Wirtschaftlichkeit - Machbarkeit - Risikomanagement - Projektaufbauorganisation - ggf. Teamfähigkeit - Projektablauforganisation - Phasenkonzepte - Vorgehensmodelle sowie deren Integration in Projektmanagement - Agiles Projektmanagement - Netzplantechnik - Projektstrukturplan - Aufwandsschätzung - Terminplan - ggf. Ressourcenplan - ggf. Kostenplan - Projektdurchführung und -controlling - Fortschrittskontrolle - ggf. erster Überblick über Qualitätssicherung - ggf. Berichtswesen - Projektsteuerung - Projektabschluss - ggf. Projektmanagement-Werkzeuge - Fallbeispiele

VORLESUNGSTERMINE

Vorlesung	Datum	Themen	Start	Ende
1	02.06.2025	Intro Definitionen Auftrag	09:00	12:00
2	27.02.2026	Anforderungen Ziele & Machbarkeit Wirtschaftlichkeit und Kostenplanung	09:00	12:00
3	06.03.2026	Aufbauorganisation Stakeholder & Teams Vorgehensmodelle & agil	09:00	12:00
4	13.03.2026	Ablauforga Planung	09:00	12:00
5	20.03.2026	Controlling Risikomanagement	09:00	12:00
6	27.03.2026	Werkzeuge Projektabschluss AI im PM PM im Studium	09:00	12:00
7	10.04.2026	Puffer	09:00	12:00
8	17.04.2026	Puffer	09:00	12:00
9	24.04.2026	Vortrag Gruppenarbeit Wrap-Up	09:00	12:00

EMPFOHLENE SOFTWARE



<https://www.ganttproject.biz/download/free>



<https://sourceforge.net/projects/projectlibre/>



<https://www.yworks.com/yed-live/>

PROJEKTBESCHREIBUNG BEISPIELPROJEKT

UNSER BEISPIELPROJEKT FÜR DIESE VORLESUNG

SOFTWAREEINFÜHRUNG

Projektsteckbrief

- 3 Teilbereiche
 - Vertrieb
 - Marketing
 - Service
- 2.000 User an 5 Standorten in 3 Ländern
- Integration mit 4 anderen Systemen
- Projektlaufzeit ca. 12 Monate, 1. Rollout nach 8 Monaten



FMCGCorp

Rahmenbedingungen

Wir möchten noch in diesem Jahr eine neue CRM Software für Vertrieb, Marketing und Service einführen. Wir wollen den Rollout in Deutschland starten und dann in Österreich und der Schweiz nachziehen. So sollen alle 1000 User in den Ländern und Abteilungen live sein.

Ziele

- Integration des Systems in unsere Bestandssysteme
- Keine Medienbrüche
- Usability und Leistungsfähigkeit im Fokus
- In 80% der täglichen Arbeit und 20% unserer Sonderfälle
- Integration an ERP muss gewährleistet sein

Project-Lead

Pascal
Erfahren in CRMS
Projektplanung
Key-User und Stakeholder Management

Erwartungshaltung

Schneller
Effizienter
Günstiger
Digitaler
AI!

Milestones

M01: Anforderungsaufnahme und erarbeiten des Big-Picture	M02: Beginn der Definition und Umsetzung unserer Anforderungen
M04: Beginn der Integration der Lösung in unsere bestehende Architektur	M08: Vertrieb Produktiv setzen

BEISPIELPROJEKT – BEGRIFFE

CRM

- CRM = CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
- MANAGEN VON KUNDENDATEN UND PROZESSEN UM BEZIEHUNGEN ZU PFLEGEN UND ZU VERBESSERN

ERP

- ERP = ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
- DAS MÖGLICHST EFFIZIENTE MANAGEMENT VON UNTERNEHMENSRESSOURCEN ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE

IMPLEMENTIERUNGSPARTNER

- BERATUNGS- ODER SOFTWAREUNTERNEHMEN, MIT DENEN MAN GEMEINSAM EINE STANDARDSOFTWARE AN DIE UNTERNEHMENSBEDÜRFNISSE ANPASST UND EINFÜHRT.



BEISPIELPROJEKT – ABGRENZUNG CRM/ERP

Kriterium	CRM	ERP
Ziel	Kundenbeziehungen pflegen	Geschäftsprozesse steuern
Fokus	Vertrieb, Marketing, Service	Finanzen, Lager, Produktion
Daten	Kundendaten	Unternehmensdaten
Nutzen	Umsatz steigern durch Kundenbindung	Effizienz steigern durch Prozessoptimierung
Beispiele	Salesforce, HubSpot	SAP, Microsoft Dynamics

BEISPIELPROJEKT – ABGRENZUNG CRM/ERP

Bereich	Nutzung von CRM	Nutzung von ERP
Vertrieb	Kontaktmanagement, Leads, Verkaufschancen	Auftragsabwicklung, Preislisten, Lagerverfügbarkeit
Marketing	Kampagnenplanung, Zielgruppenanalyse, Erfolgskontrolle	Budgetverwaltung, Produkt- und Preismanagement
Service	Kundenanfragen, Support-Historie, Wissensdatenbank	Ersatzteilbestände, Serviceaufträge, Ressourcenplanung

NOCH FRAGEN



PROJEKTDEFINITION

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT



**„Projektmanagement ist die
Kunst, mit 10 Fingern 11 Korken
unter Wasser zu halten.“***

DEFINITION

DEFINITION

Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben, das mit einer klar definierten Zielvorgabe und einer bestimmten Projektorganisation durchgeführt wird. Es zeichnet sich durch Einmaligkeit aus und verfolgt die Erreichung spezifischer Ergebnisse, die durch eine strukturierte Projektdefinition festgelegt werden. Die Projektziele werden in der Regel durch ein Projektteam und einen Projektleiter koordiniert. Dabei sind Projekte stets von der Routine der täglichen Aufgaben eines Unternehmens abgegrenzt.

Quelle:
<https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensfuehrung/projektmanagement/projektmanagement-definition-projekt-kriterien-zur-abgrenzung-und-verschiedene-projektarten/>

CHARAKTERISTIKA



Quelle: <https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/definition-projekt/>

ÜBUNG – PROJEKT ODER KEIN PROJEKT

SIND DIESE BEISPIELE PROJEKTE ODER
REINE ROUTINE?



ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF




Initialisierung



Definition



Planung



Steuerung



Abschluss

ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF



ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF



Initialisierung

Klärung des Auftrags

Klärung der
Zuständigkeiten

Zusammenstellung des
Teams


Kick-Off des Projektes



Definition



Planung




Steuerung



Abschluss

ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF

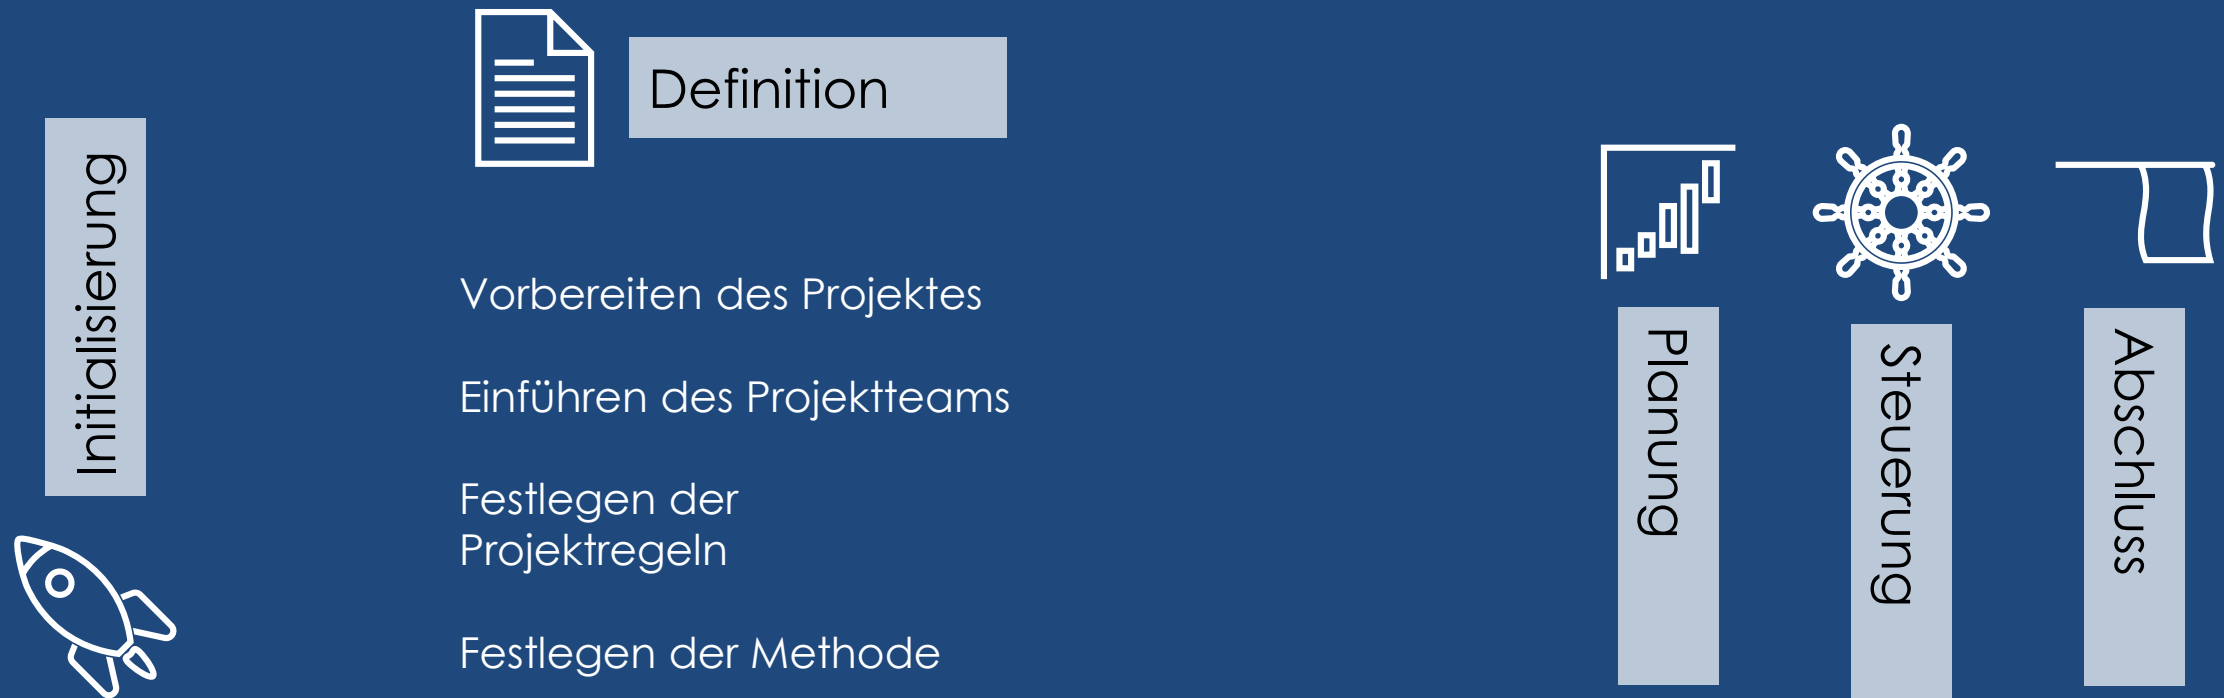


ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF



ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF



ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF

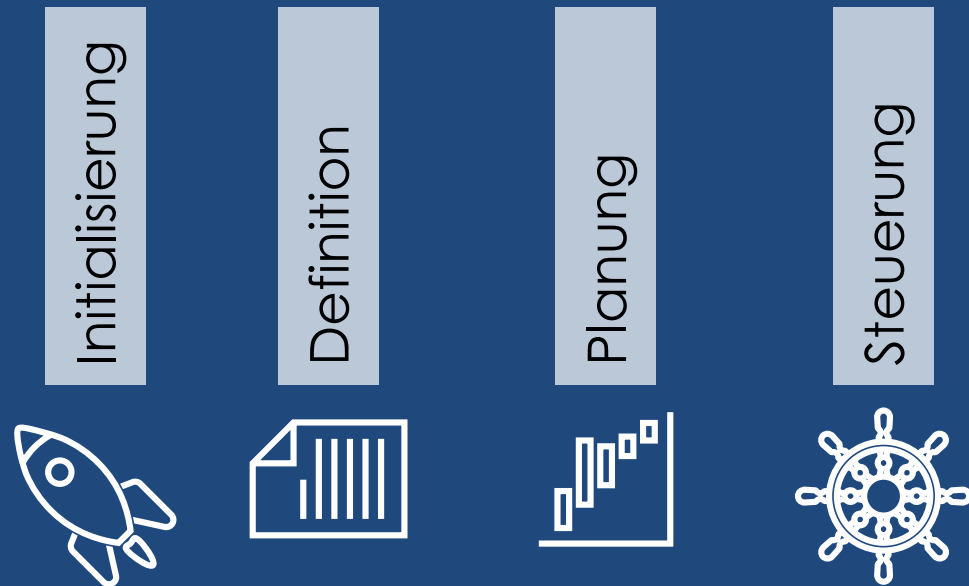

Abschluss

Abnahme des Projektes

Abschlussanalyse

Erfahrungssicherung

Übergabe in Betrieb

Auflösung

ALLGEMEINER PROJEKTABLAUF



DEFINITION PROJEKTMANAGEMENT

- DIN-NORM (DIN 69901-5:2009-01): „GESAMTHEIT VON FÜHRUNGSAUFGABEN, -ORGANISATION, -TECHNIKEN UND -MITTELN FÜR DIE INITIIERUNG, DEFINITION, PLANUNG, STEUERUNG UND DEN ABSCHLUSS VON PROJEKTEN.“
- PMBOK GUIDE: „DIE ANWENDUNG VON WISSEN, FÄHIGKEITEN, WERKZEUGEN UND METHODEN AUF PROJEKTAKTIVITÄTEN, DIE DER ERFÜLLUNG DER PROJEKTANFORDERUNGEN DIENEN.“
- PROJEKTMANAGEMENT IST DIE PLANUNG, STEUERUNG UND KONTROLLE VON AUFGABEN, RESSOURCEN UND ZEIT, UM EIN DEFINIERTES ZIEL INNERHALB EINES BESTIMMTEN RAHMENS ERFOLGREICH ZU ERREICHEN.

DER PROJEKTMANAGER



Planung und Führung des Projektes



Steuerung und Organisation
des Projektes



Kontrolle des Projektes



Verantwortung für das Projekt

WAS BENÖTIGT DER PROJEKTMANAGER




ÜBUNG – WAS SIND PROJEKTE

AUFGABE / FRAGESTELLUNG

- IST UNSER BEISPIEL WIRKLICH EIN PROJEKT? UNTERSUCHE DIE BESCHREIBUNG UND FINDE ANHALTSPUNKTE DIE FÜR UND GEGEN EIN PROJEKT SPRECHEN.



BEISPIELPROJEKT

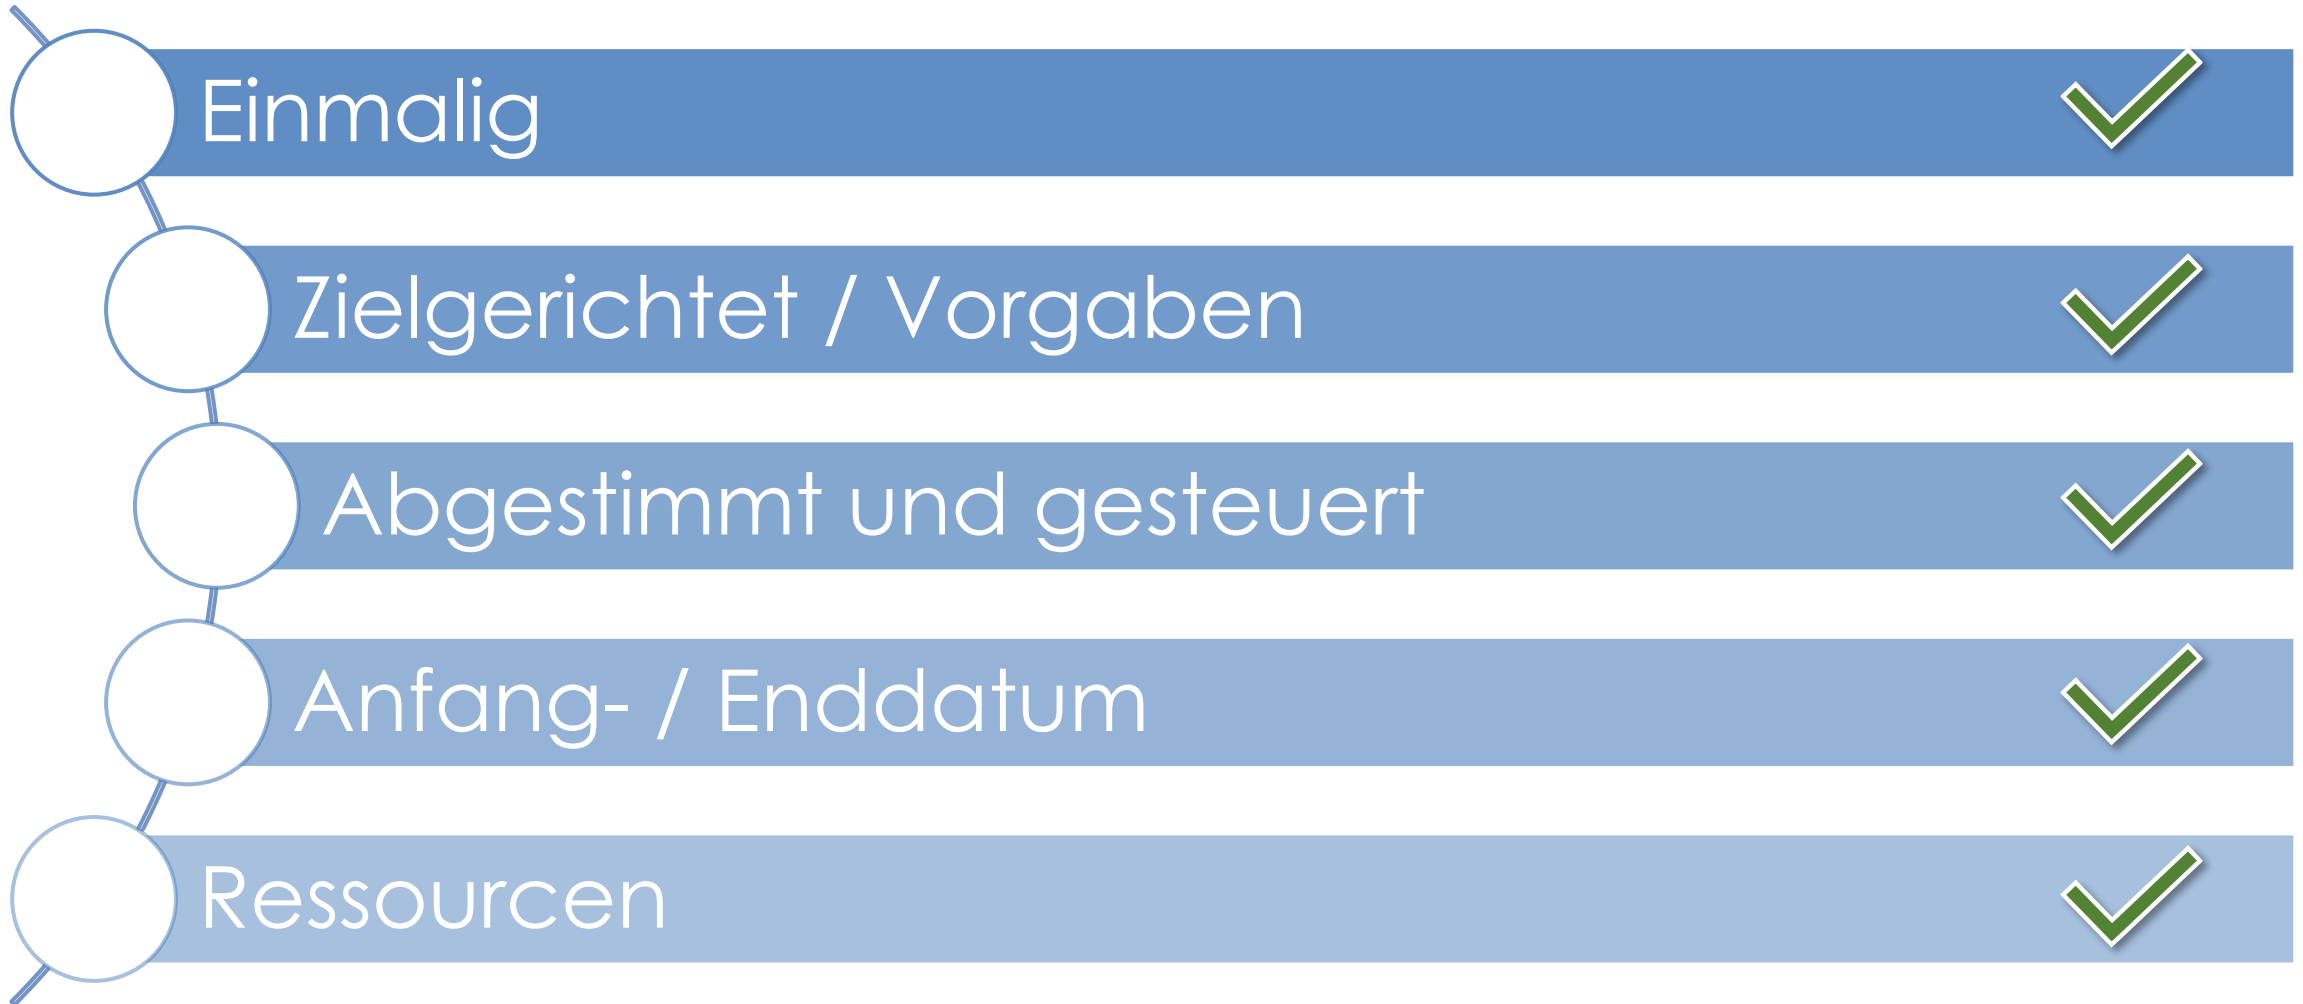

PROJEKTAUFTRAG

- AUCH PROJECT CHARTER ODER PROJEKTLITDOKUMENTATION
- “WICHTIGSTE GRUNDLAGE EINES PROJEKTS” – VERTRAGSGRUNDLAGE UND STEUERUNGSSINSTRUMENT
 - AUTORISIERUNG DES PROJEKTS
 - MÖGLICHKEIT ZUM STEuern
- STARTPUNKT DES PROJEKTS – ABSCHLUSS DER VORBEREITUNG
- STELLT DAS “WAS” UND “WARUM” DAR

Projektauftrag: Musterprojekt

Projektname:	Musterprojekt
Projektnummer:	2020-ABC
Projektauftrag	
Ausgangslage	Vorgeschichte des Projektes, Beschreibung des IST-Zustandes und der eigentlichen Problemstellung
Projektziele:	Mit diesem Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden: 1. Ziel 1 2. Ziel 2 3. Ziel 3
Abgrenzungen:	Um welche Probleme soll sich das Projekt explizit nicht kümmern? Wo wird eine bewusste Abgrenzung vorgenommen?
Meilensteine	Eckpunkte des Projektes, Grobterminplan
Termine	Welche wichtigen Termine gilt es einzuhalten?
Kosten	Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Grobe Kostenaufstellung der extern zu leistenden Kosten
Personenaufwand	Mit welchem Personalaufwand (in Personentage) ist zu rechnen? Grobe Kostenaufstellung der intern zu erbringenden Leistung
Sachmittel	Braucht es spezielle Sachmittel, um das Projektziel zu erreichen, welche weder in den Kosten noch im Personalaufwand eingerechnet ist? Grobe Aufstellung der Kosten!
Projektorganisation	
Auftraggeber	Es muss klar sein, wer der Auftraggeber ist. Der Auftraggeber ist in aller Regel auch der Projektausschuss.
Projektleiter	Die Projektleitung ist verantwortlich für die operative Abwicklung des Projektes.
Projektmitglieder	Wer ist aktiv im Sinne der Mitarbeit in die Projektorganisation aufzunehmen?
Projektausschuss	Der Projektausschuss ist in der Regel aus verschiedenen hochrangigen Interessenvertretern bestückt (Auftraggeber, Projektleiter, Gremien, evtl. Politische Vorgesetzte)
Verteiler	Welche Personen müssen mit diesem Projektantrag konfrontiert werden, wer muss davon wissen?
Unterschrift	 _____ Projektauftraggeber
Beilagen	Notwendige Beilagen wie Projektpläne oder erste Richtofferten

PROJEKTAUFTRAG - INHALT

- PROJEKTBEZEICHNUNG – IDENTIFIKATION
- AUSGANGSSITUATION – KONTEXT
- PROJEKTZIELE
- PROJEKTIINHALT UND UMFANG
- RESSOURCENGROBPLANUNG
- ZEITGROBPLANUNG
- ORGANISATION UND ROLLEN
- RISIKEN UND ANNAHMEN
- KOMMUNIKATIONSREGELUNGEN

ZENTRALE DOKUMENTE

Projektphase	Dokument	Zweck	Wann benötigt
Initialisierung	Projektantrag / Business Case	Wirtschaftliche und strategische Begründung des Projekts	Vor Projektfreigabe
Initialisierung	Projektauftrag (Project Charter)	Offizielle Beauftragung, grober Rahmen zu Zielen, Budget, Rollen	Nach Genehmigung
Initialisierung	Stakeholderliste	Identifikation relevanter Anspruchsgruppen	Früh in der Phase
Initialisierung	Machbarkeitsanalyse	Prüfung technischer, wirtschaftlicher Machbarkeit	Bei komplexen Projekten

ZENTRALE DOKUMENTE

Projektphase	Dokument	Zweck	Wann benötigt
Definition	Projektzieldefinition	Präzise und messbare Zielbeschreibung	Zu Beginn der Phase
Definition	Lastenheft	Anforderungen aus Sicht des Auftraggebers	Bei externen/IT-Projekten
Definition	Pflichtenheft	Beschreibung der konkreten Umsetzung	Nach Lastenheft
Definition	Projektstrukturplan (PSP)	Zerlegung in Arbeitspakete	Kern der Definitionsphase
Definition	Scope-Beschreibung	Klare Abgrenzung des Projektumfangs	Vor Planungsphase

ZENTRALE DOKUMENTE

Projektphase	Dokument	Zweck	Wann benötigt
Planung	Terminplan (Gantt-Plan)	Zeitliche Strukturierung aller Arbeitspakete	Nach Erstellung des PSP
Planung	Meilensteinplan	Definition wichtiger Kontrollpunkte	Früh in der Planungsphase
Planung	Ressourcenplan	Planung von Personal- und Sachressourcen	Nach Terminplanung
Planung	Kosten- / Budgetplan	Detaillierte Kostenkalkulation	Vor Umsetzungsbeginn
Planung	Risikomanagementplan	Maßnahmen zur Risikosteuerung	Vor Umsetzungsbeginn

ZENTRALE DOKUMENTE

Projektphase	Dokument	Zweck	Wann benötigt
Steuerung	Statusbericht	Transparenz über Fortschritt, Kosten und Risiken	Regelmäßig während der Umsetzung
Steuerung	Soll-Ist-Vergleich	Analyse von Abweichungen	Laufend
Steuerung	Sitzungsprotokolle	Dokumentation von Entscheidungen	Laufend

ZENTRALE DOKUMENTE

Projektphase	Dokument	Zweck	Wann benötigt
Abschluss	Abnahmeprotokoll	Formale Bestätigung der Zielerreichung	Nach Fertigstellung
Abschluss	Projektabschlussbericht	Zusammenfassung von Ergebnissen, Kosten und Erkenntnissen	Am Projektende
Abschluss	Lessons Learned	Sicherung von Erfahrungswissen	Vor Projektauflösung
Abschluss	Übergabedokumentation	Übergabe an Betrieb oder Linie	Vor Projektende
Abschluss	Restpunktliste	Transparenz über offene Punkte	Vor formellem Abschluss
Abschluss	Archivierungsdokumentation	Revisionssichere Ablage aller Unterlagen	Nach Projektabschluss
