

TEAMS, STAKEHOLDER UND METHODEN

VORLESUNG 3

	Lastenheft	Pflichtenheft
	Was? Wofür?	Wie? Womit?
Ersteller	Auftraggeber	Auftragnehmer
Inhalt	Zusammenstellung aller Anforderungen hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang - aus Anwendersicht	Beschreibung der Realisierung aller Anforderungen des Lastenheftes
Funktion	Ausschreibungs-, Angebots-, evtl. Vertragsgrundlage	Grundlage für Realisierung und Projektabwicklung

SMART

Spezifisch

Messbar

Akzeptiert

Realistisch

Terminiert

CLEAR

Collaborative

Limited

Emotional



Appreciable

Refinable

OKR

Objective

Key Results

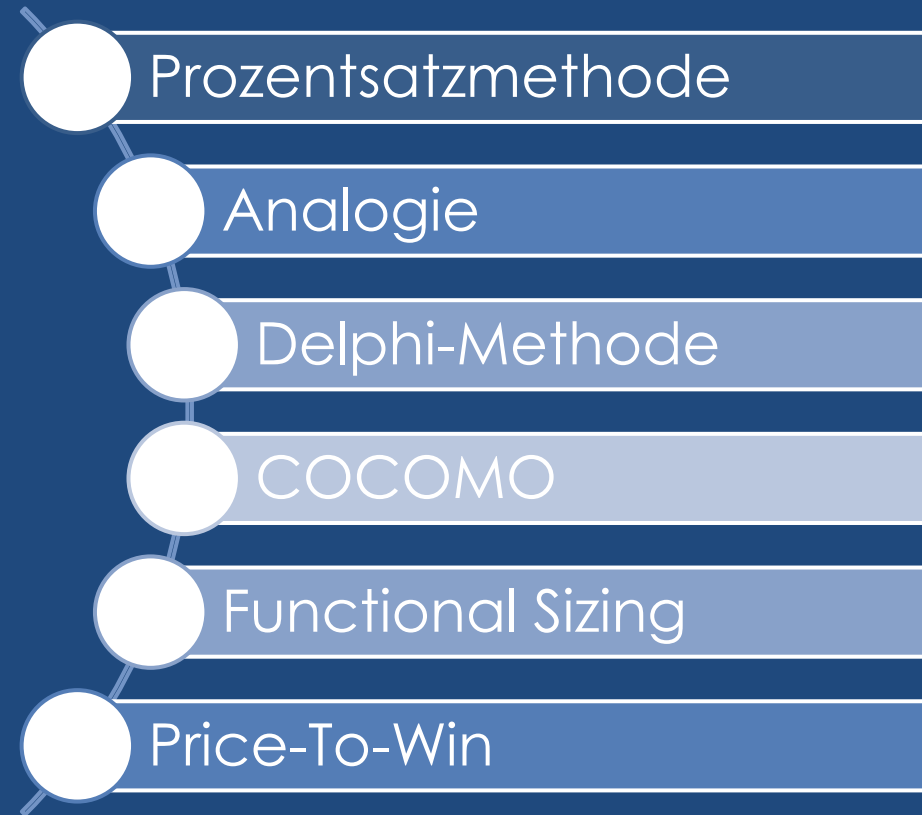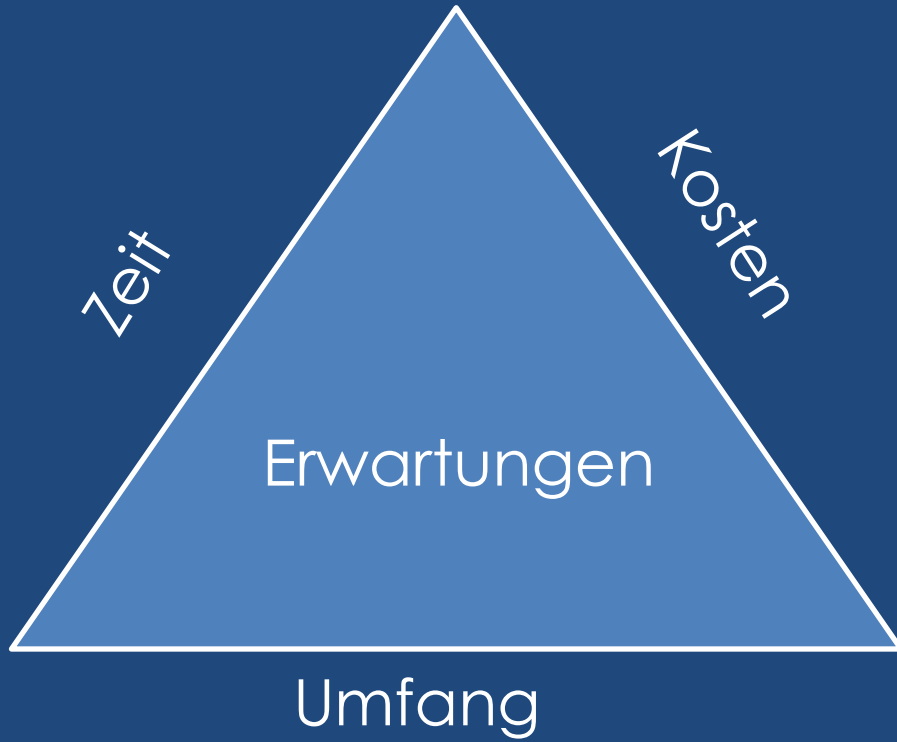

PROJEKTORGANE/PROJEKTTEAM

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

„Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“



Winston Churchill Premierminister Großbritannien
1940 – 1945 und 1951 – 1955

TEAMFÄHIGKEIT

- „TEAMFÄHIGKEIT HEIßT, EIGENE INTERESSEN MIT DEN INTERESSEN DER GRUPPE ABZUSTIMMEN UND GEMEINSAM LÖSUNGEN ZU ENTWICKELN.“
- TEAMFÄHIGKEIT SOZIALE KOMPETENZ FÜR ZIELGERICHTETE ZUSAMMENARBEIT
 - KOOPERATIONSFÄHIGKEIT
 - KRITIKFÄHIGKEIT
 - VERLÄSSLICHKEIT
 - EMPATHIE
 - KOMPROMISSBEREITSCHAFT
- TEAMFÄHIGKEIT UNGLEICH HARMONIEBEDÜRFTIGKEIT




RELEVANZ IM PROJEKTMANAGEMENT


- PROJEKTE SIND TEAMARBEIT
- EFFIZIENTE ZUSAMMENARBEIT SPART ZEIT UND RESSOURCEN
 - PROJEKTE STEHEN UNTER KOORDINATIONS- UND LEISTUNGSDRUCK
- TEAMS SIND INTERKULTURELL UND INTERDISZIPLINÄR
 - KONFLIKTE WERDEN ENTSTEHEN – DIESE MÜSSEN ANGEANGEN WERDEN
- PROJEKTE BESTEHEN AUS MENSCHEN – WENN TEAM GUT, DANN PROJEKT GUT



EINFLUSSNEHMER EINES PROJEKTES



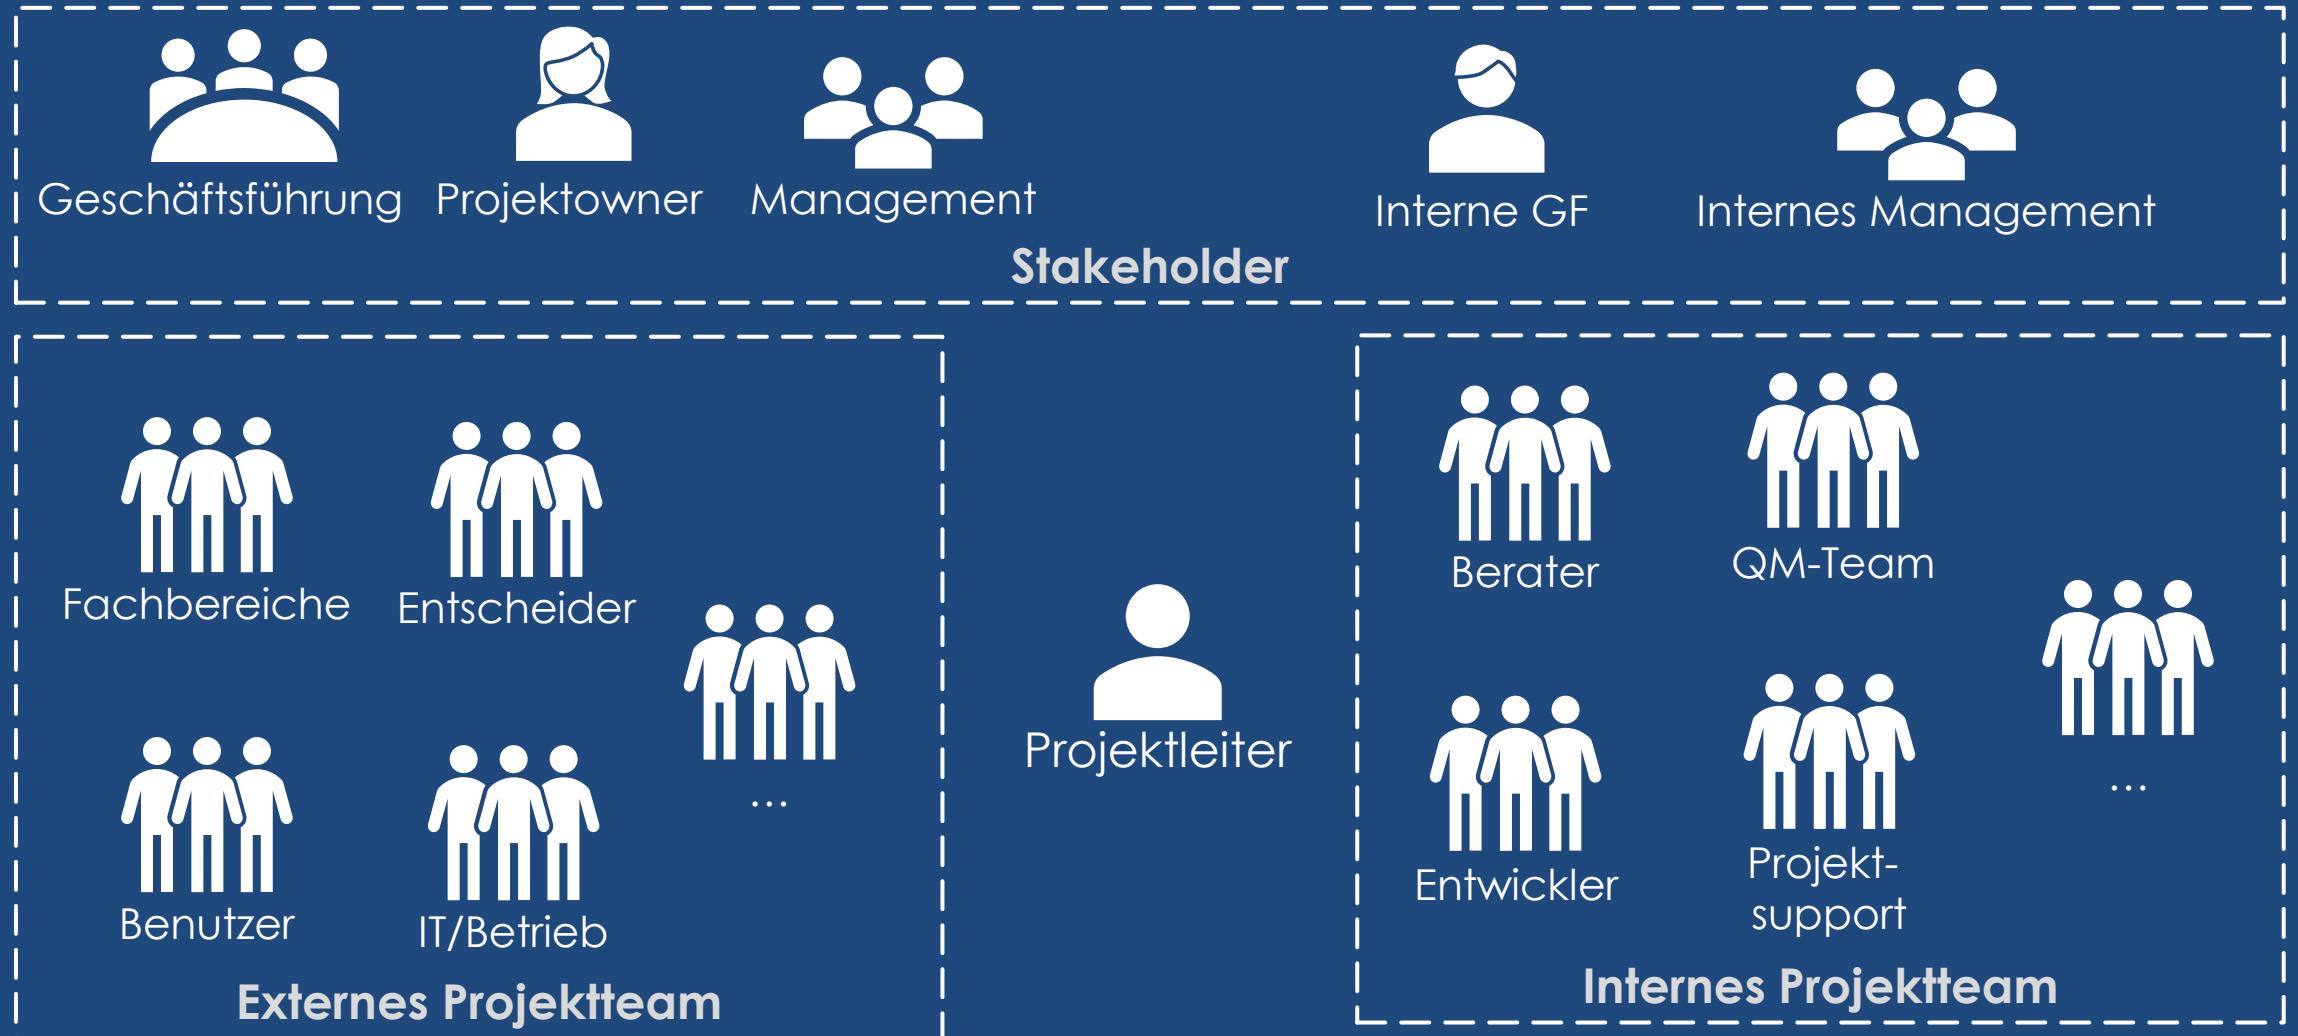


ORGANE EINES PROJEKTES

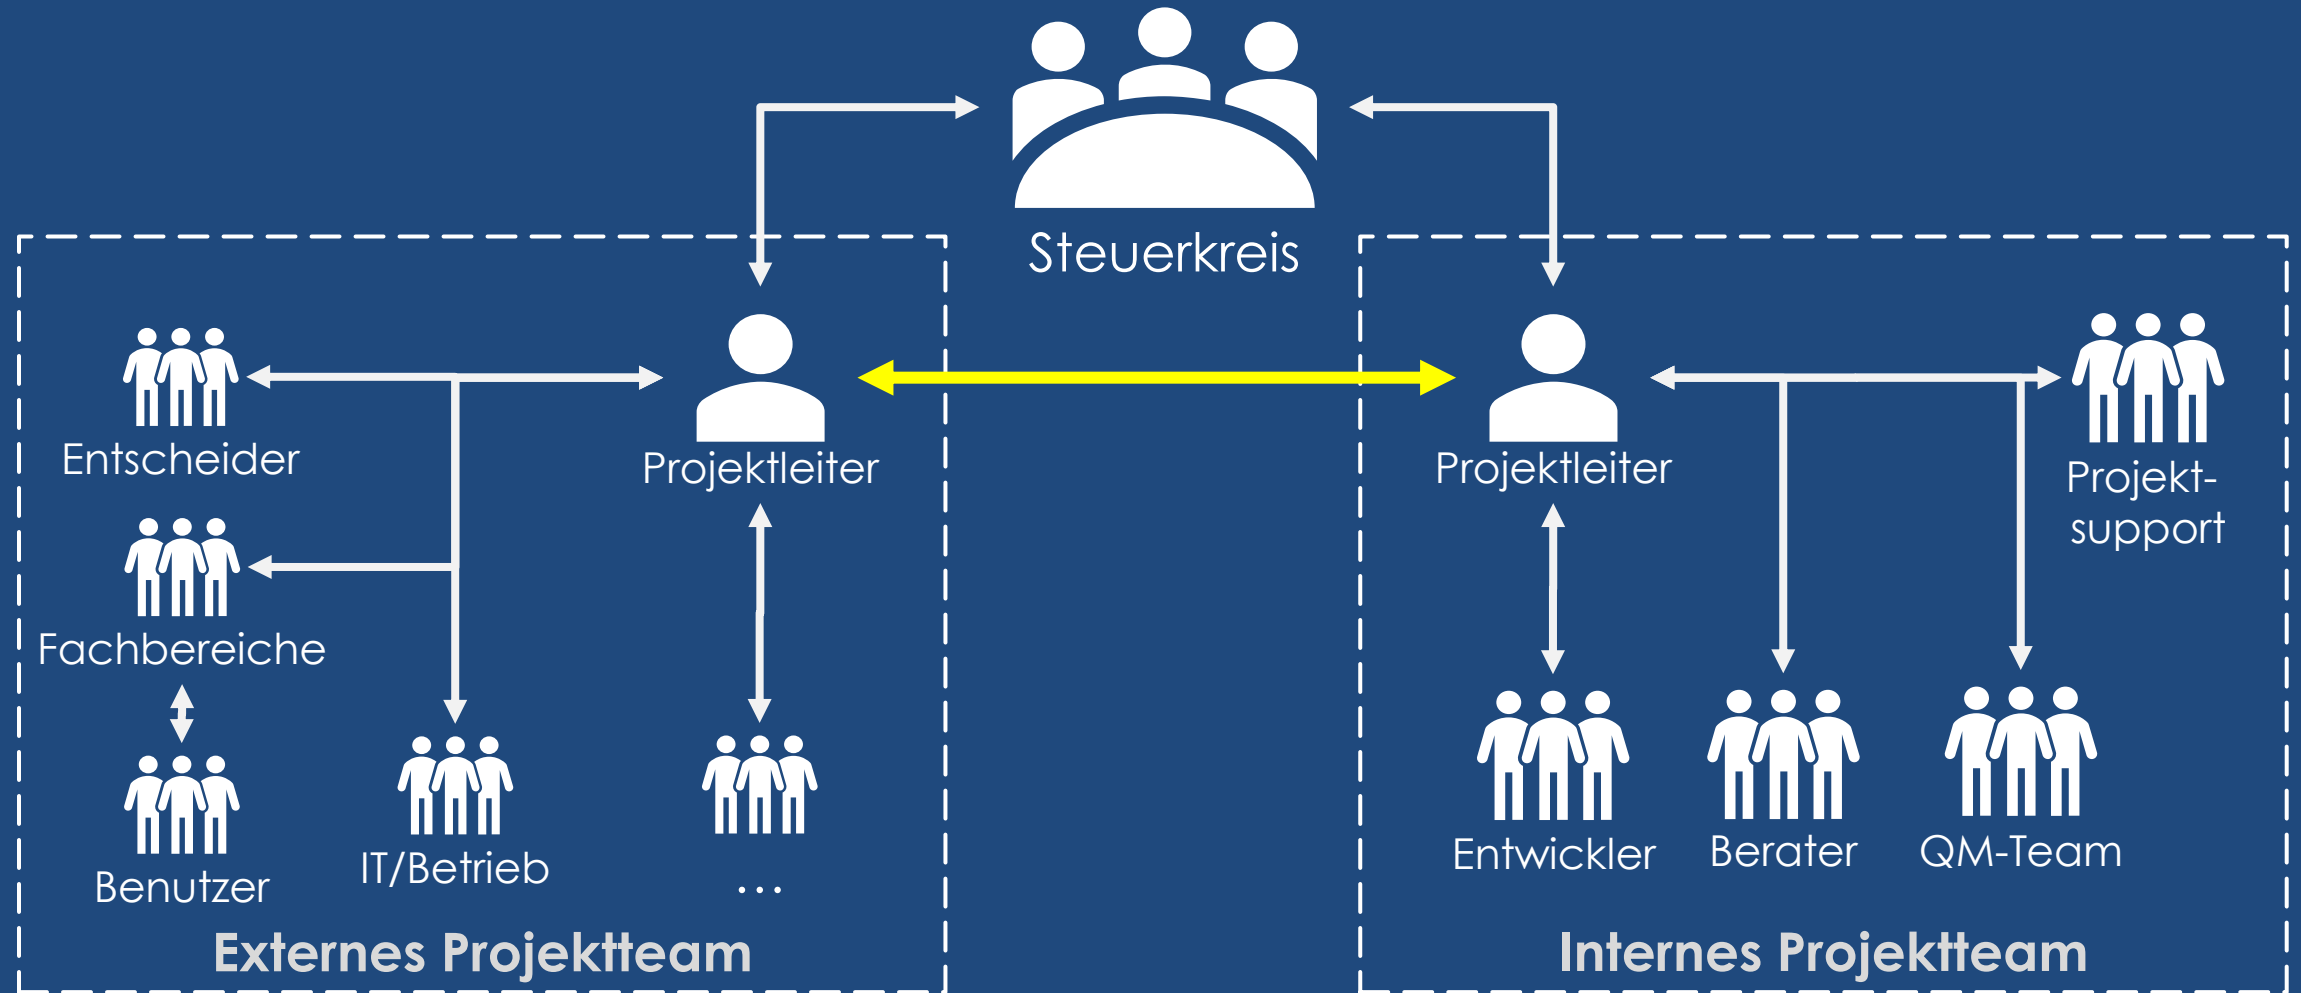

ABLAUFORGANISATION

- KLARE VERANTWORTLICHKEITEN SCHAFFEN UND KONFLIKTE VERMEIDEN
- AUFBAU EINER KLAREN KOMMUNIKATIONSKULTUR
- 3 PROJEKTORGANISATIONSTYPEN
 - REINE PROJEKTORGANISATION
 - MATRIX PROJEKTORGANISATION
 - STABS PROJEKTORGANISATION
- VERANTWORTLICHKEITEN DURCH RACI-MATRIX
 - RESPONSIBLE – ZUSTÄNDIGKEIT FÜR UMSETZUNG
 - ACCOUNTABLE – TRÄGT VERANTWORTUNG
 - CONSULTED – MEINUNG WIRD EINGEHOLT
 - INFORMED – BEKOMMEN INPUT ZUM AKTUELLEN STAND

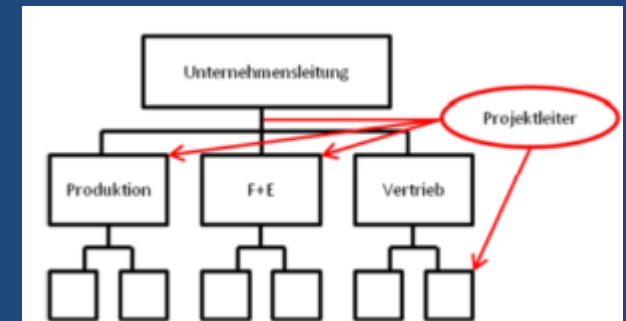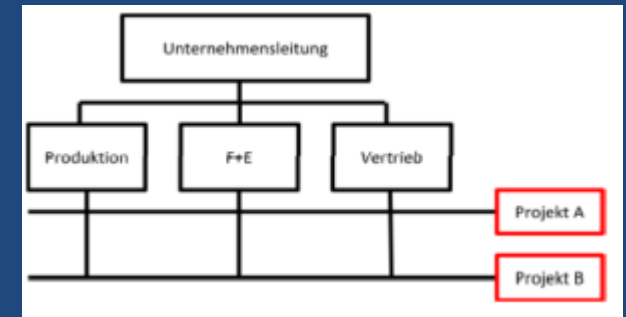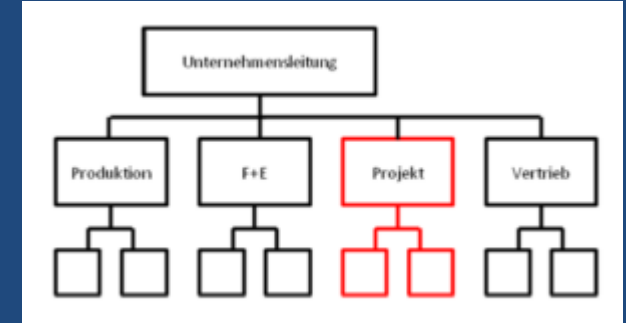

ABLAUFORGANISATION

Project Tasks	Product Owner	Business Analyst	Financial Lead	Design Director	Design Lead	CRM Lead	Head of CRM	Senior Stakeholders	Senior Stakeholders	AGENCY
1. Research										
Econometric model	C	C	A	I	I	C	I	C	I	R
Strategic framework	A	C	C	I	I	C	I	C	I	R
2. Define										
Product concept	A	C	I	C	I	C	C	C	I	R
User testing	A	C	I	I	I	C	I	I	I	R
User journey	A	C	I	I	I	C	I	C	I	R
Design framework	C	C	I	R	A	I	I	C	I	R
Technology recommendations	C	A	I	I	I	I	I	C	I	R
Measurement framework	R	C	A	I	I	C	I	C	I	R
Product backlog	A	R	I	C	I	C	I	C	I	C
Delivery roadmap	A	R	I	R	C	C	I	C	C	R


BEDÜRFNISSE DER TEAMMITGLIEDER

- BEDÜRFNISPYRAMIDE NACH MASLOW



BEDÜRFNISSE DER TEAMMITGLIEDER

PROJEKT

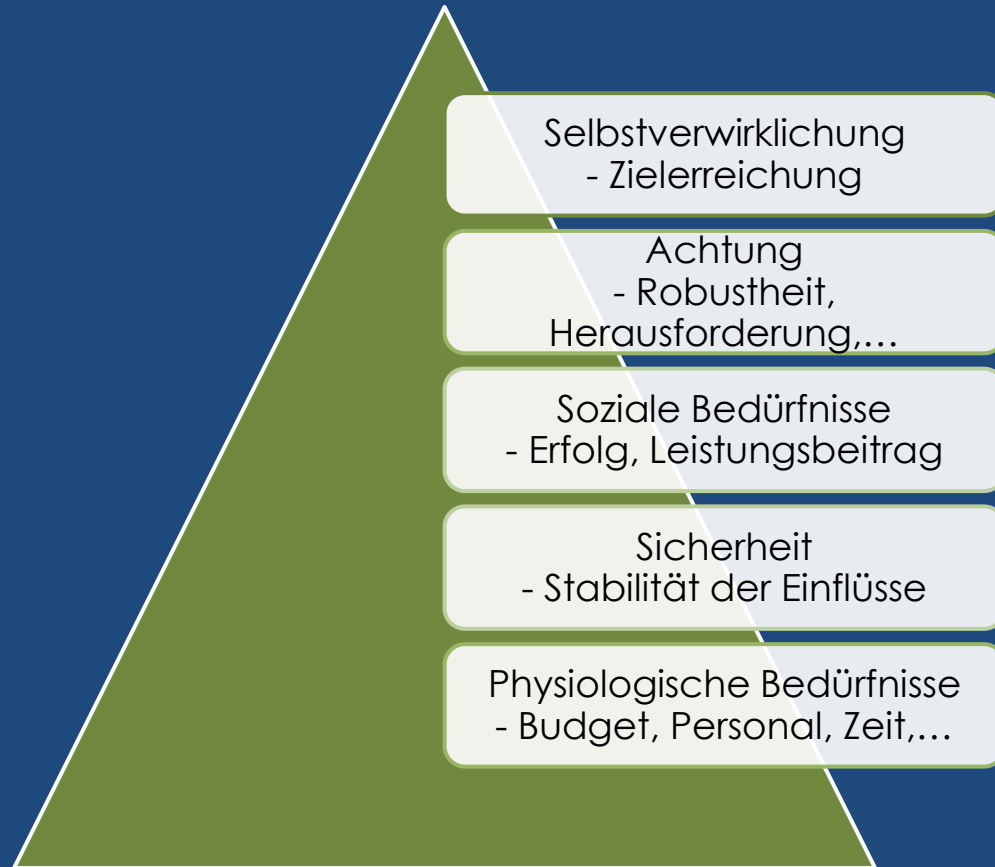

PROJEKTMITARBEITER



ROLLEN DER PROJEKTMITGLIEDER

- MODELL NACH BELBIN

Handlungs-
orientiert

Implementierter

Perfektionist

Macher

Kommunikations-
orientiert

Koordinator

Teamarbeiter

Wegbereiter

Wissens-
orientiert

Neuerer

Beobachter

Spezilist




Bedürfnisse

Kennen
Einordnen
Managen
Befriedigen



Team

Analysieren
Schwächen
reduzieren
Stärken nutzen
Vertrauen und
Kommunikation



Projekt

Priorisieren
Strukturieren
Kommunizieren
Aufgaben sinnvoll
verteilen

ERKENNTNISSE FÜR DIE TEAMFÜHRUNG

STAKEHOLDERANALYSE

DEFINITION

ALS STAKEHOLDER ODER ANSPRUCHSBERECHTIGTER WIRD EINE PERSON ODER GRUPPE BEZEICHNET, DIE EIN BERECHTIGTES INTERESSE AM VERLAUF ODER ERGEBNIS EINES PROZESSES ODER PROJEKTES HAT.



STAKEHOLDERANALYSE

WARUM IST DAS WICHTIG?

NICHT BEACHTETE STAKEHOLDER KÖNNEN EIN PROJEKT IM SCHLIMMSTEN FALLE ZUM SCHEITERN BRINGEN. UND DESHALB IST ES EINE DER WICHTIGSTEN AUFGABEN DES PROJEKTLITERS, DIE INTERESSEN DER STAKEHOLDER ZU KENNEN UND GEEIGNETE MAßNAHMEN ZU ENTWICKELN.

STAKEHOLDER SAMMELN




- FRAGESTELLUNGEN

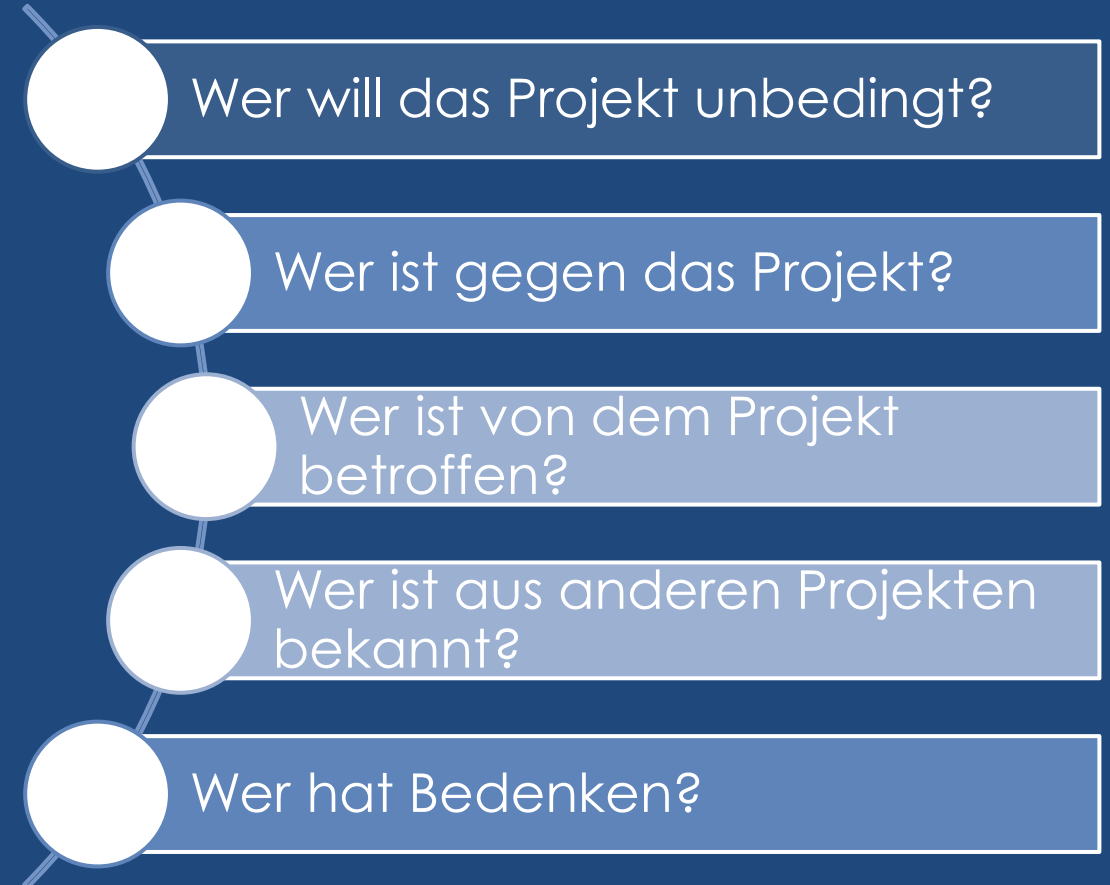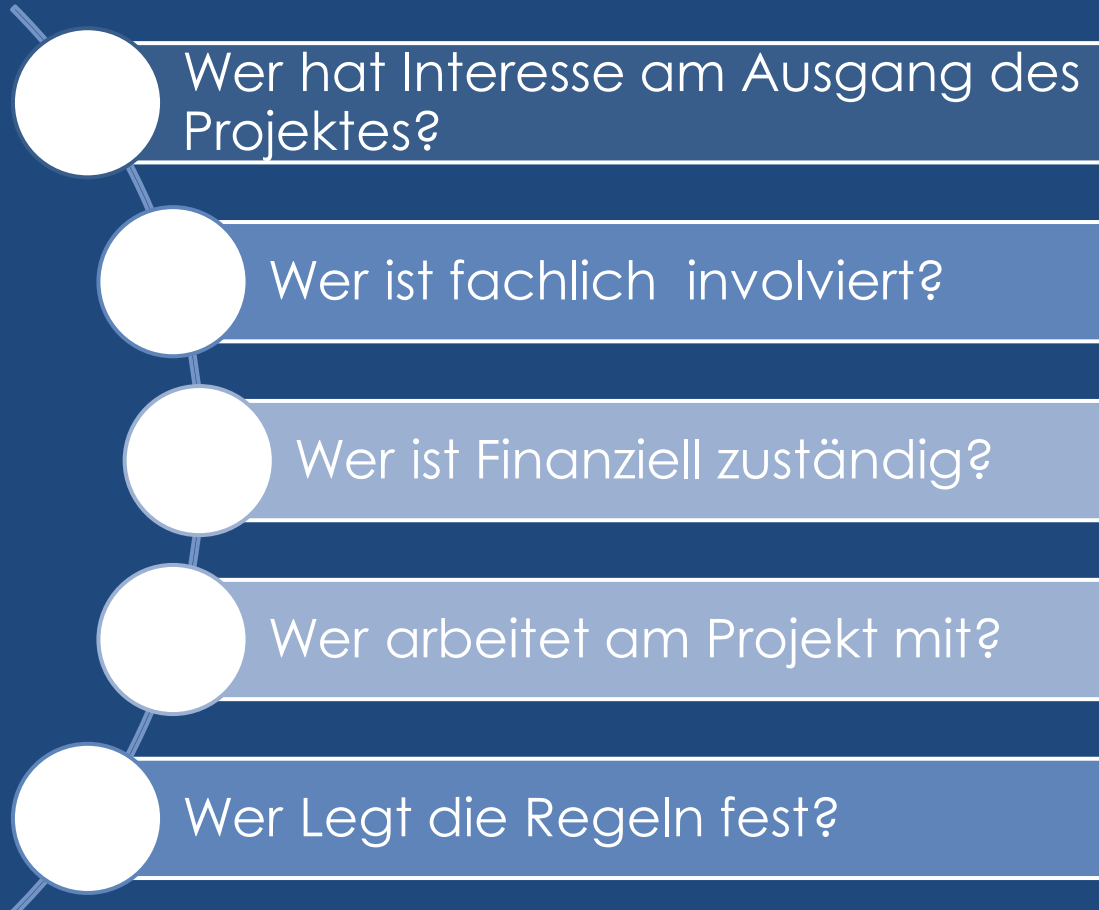

STAKEHOLDER SAMMELN

- DARSTELLMUNGSMÖGLICHKEITEN

om Projekt	an das Projekt	Wertigkeit	Faktor	Bemerkung	Grad der Wichtigkeit	Faktor	Bemerkung	Grad der Wichtigkeit
atlich, utzung bei ege, erhebung an, Unterstutzung mltlicheitserbeit	Präsident und gungste Konditionen, opweise Platzverhältnisse	4	Präsident und gungste Konditionen, opweise Platzverhältnisse	3				
schonen und re zur Verfügung, die	Aufhebung der Truende, gungste Hegebote, Jugendarbeit	2	Aufhebung der Truende, gungste Hegebote, Jugendarbeit	1				
bei Waldarbeiten	vergünstigte Konditionen für sich und Familie	4	vergünstigte Konditionen für sich und Familie	1				
atien bei der und der Biotope hüt-Räumen	michte noch weitere Flächen verpachten	4	michte noch weitere Flächen verpachten	1				
utzung bei ng und Werbung	ist Gegner von Golfplätzen allgemein	3	ist Gegner von Golfplätzen allgemein	5				
atien, watenuschweise	Schaffung von Arbeitsplätzen	4	Schaffung von Arbeitsplätzen	2				
Angebote, gute langhaltig	Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, Saunagen und Feasts des Golfclubs sollen im Sommer stattfinden	4	Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, Saunagen und Feasts des Golfclubs sollen im Sommer stattfinden	2				
	Konkurrenzdruck zwischen den Firmen ist hoch	2	Konkurrenzdruck zwischen den Firmen ist hoch	2				

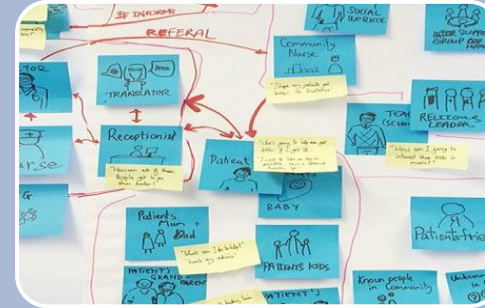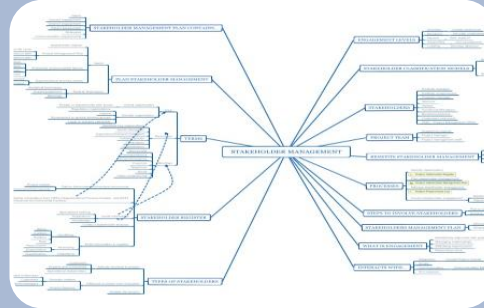


Excel

Mindmap

Postit

Blatt
Papier

STAKEHOLDER BEWERTEN

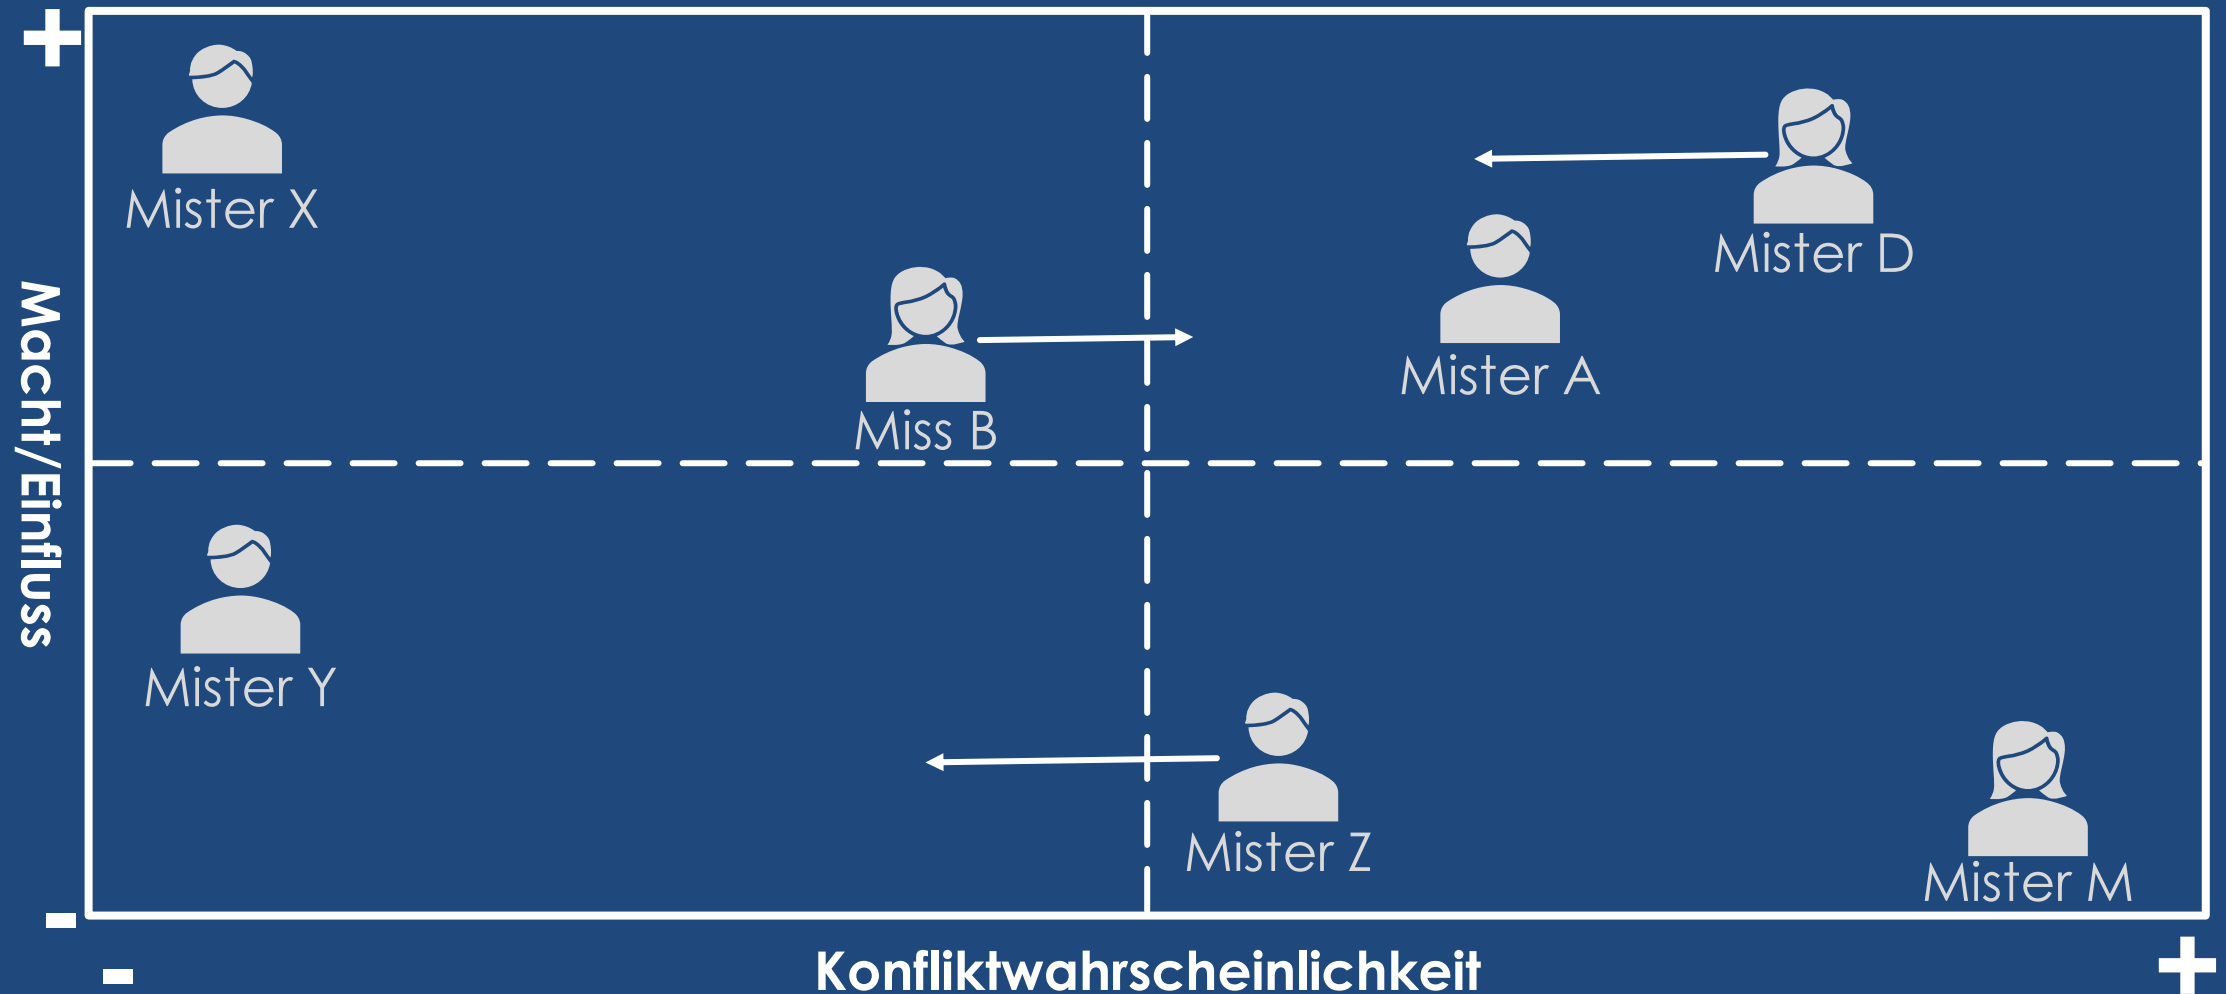

STAKEHOLDER ZIEL-/HANDLUNGSAN.

Stakeholder 1	Stakeholder 2	Stakeholder 3	Stakeholder 4
• Ziel • Maßnahme • Konflikt	• Ziel • Maßnahme • Konflikt	• Ziel • Maßnahme • Konflikt	• Ziel • Maßnahme • Konflikt

- ZIEL: WELCHES ZIEL VERFOLGT DER STAKEHOLDER
- MAßNAHME: VERSTÄRKEN ODER GEGENWIRKEN GEGEN DAS ZIEL
- KONFLIKT: WELCHE MITWIRKENDEN BIETEN DAS GRÖßTE KONFLIKTPOTENTIAL

Ü - ÜBUNG – ERSTELLE DAS PERFEKTE TEAM

RAHMENBEDINGUNGEN

- DU BIST DER GESCHÄFTSFÜHRER UNSERES BEISPIELUNTERNEHMENS.
- ALS MITGLIEDER DES PROJEKTES STEHEN DIR ALLE STUDENT*INNEN IN DIESEM RAUM ZUR VERFÜGUNG.

AUFGABE

- WÄHLE EINE PROJEKTMETHODE AUS!
- WÄHLE EINEN PROJEKTLEITER AUS!
- NENNE 3 STAKEHOLDER
- STELLE DAS FÜHRUNGSTEAM FÜR DAS PROJEKT ZUSAMMEN – UND DAS PROJEKTTEAM
- BEGRÜNDE DEINE WAHL UND BEWERTEN DEINE PROJEKTMITGLIEDER NACH BELBIN!

VORGEHENSMODELLE & AGIL

VORGABEN UND NORMEN

- DIN-NORM (DIN 69901-5:2009-01)
BESCHÄFTIGT SICH MIT GRUNDLAGEN, PROZESSEN, PROZESSMODELLEN, METHODEN, DATENMODELLEN UND BEGRIFFSDEFINITIONEN
- ISO-NORM (ISO 21500)
UMFASSENDES REGELWERK IN WELCHEM ALLE LEITLINIEN FÜR DAS PROJEKTMANAGEMENT DEFINIERT WURDEN. SIE IST FÜR JEDE ART VON PROJEKTEN GÜLTIG
- PMI – PROJEKT MANAGEMENT INSTITUTE (USA)
DIE BASIS DER PMI-NORMEN BILDET DABEI DER PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE, AUCH ALS PMBOK-GUIDE ABGEKÜRZT. DIESE „PROJEKTBIHEL“ WIRD DEN MITGLIEDERN DES PMI ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.
- IPMA – INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION
HAUPTSÄCHLICH AUßERHALB VON NORDAMERIKA. NICHT NUR BEGRIFFSDEFINITIONEN SONDERN AUCH KONKRETE HILFESTELLUNGEN
- PRINCE2 – PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS – VERSION 2 (1996)
VON DER BRITISCHEN REGIERUNG ALS STANDARD FÜR IT-PROJEKTE ENTWICKELT. PROJEKTE WERDEN IN 7 PROZESSE (PHASEN) UNTERTEILT.

ÜBLICHE PROJEKTMETHODEN

Traditionell

PMI

Wasserfall

V-Modell

IPMA

PRINCE2

Agil

Scrum

Kanban

XP

Crystal

DSDM

Scrumban

Andere

LPM

Six Sigma

KLASSISCHE PROJEKTMETHODEN

PMI

5 Prozessgruppen & 10
Knowledge Areas

Prozessgruppen

Knowledge Areas

IPMA

ICB (International
Competence Baseline)

Practice

People

Perspectiv

PRINCE2 7 Prozesse

Vorbereiten eines Projekts

Lenken eines Projekts

Initiieren eines Projekts

Steuern einer Phase

Managen der Produktlieferung

Managen eines Phasenübergangs

Abschließen eines Projekts

PROJEKTMETHODEN – PRINCE 2

Vorbereiten eines
Projekts

Lenken eines
Projekts

Initiieren eines
Projekts


Steuern einer
Phase

Managen der
Produktlieferung


Managen eines
Phasenübergangs

Abschließen eines
Projekts

PRINCE 2 - PROJEKTPLAN

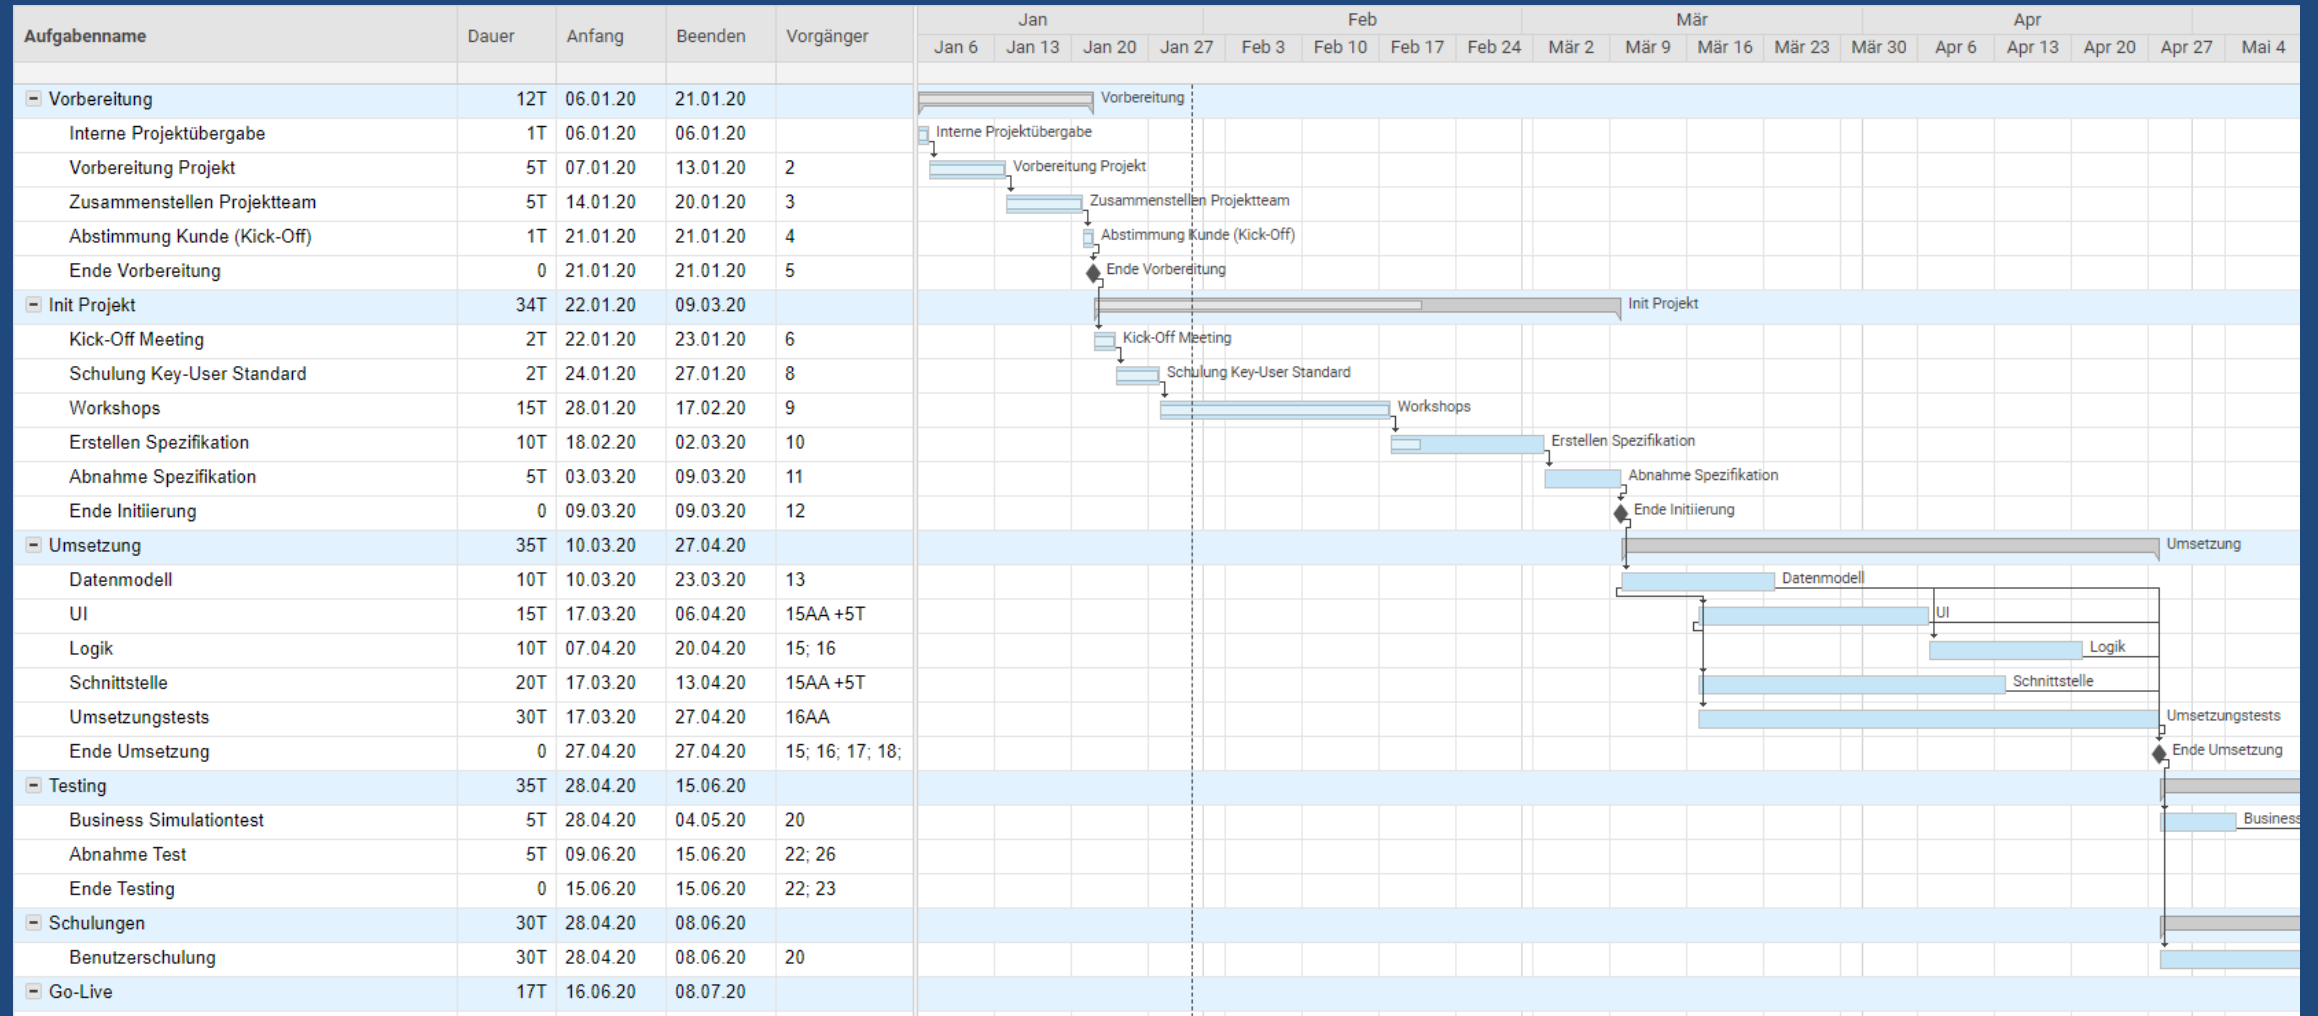

WASSERFALL

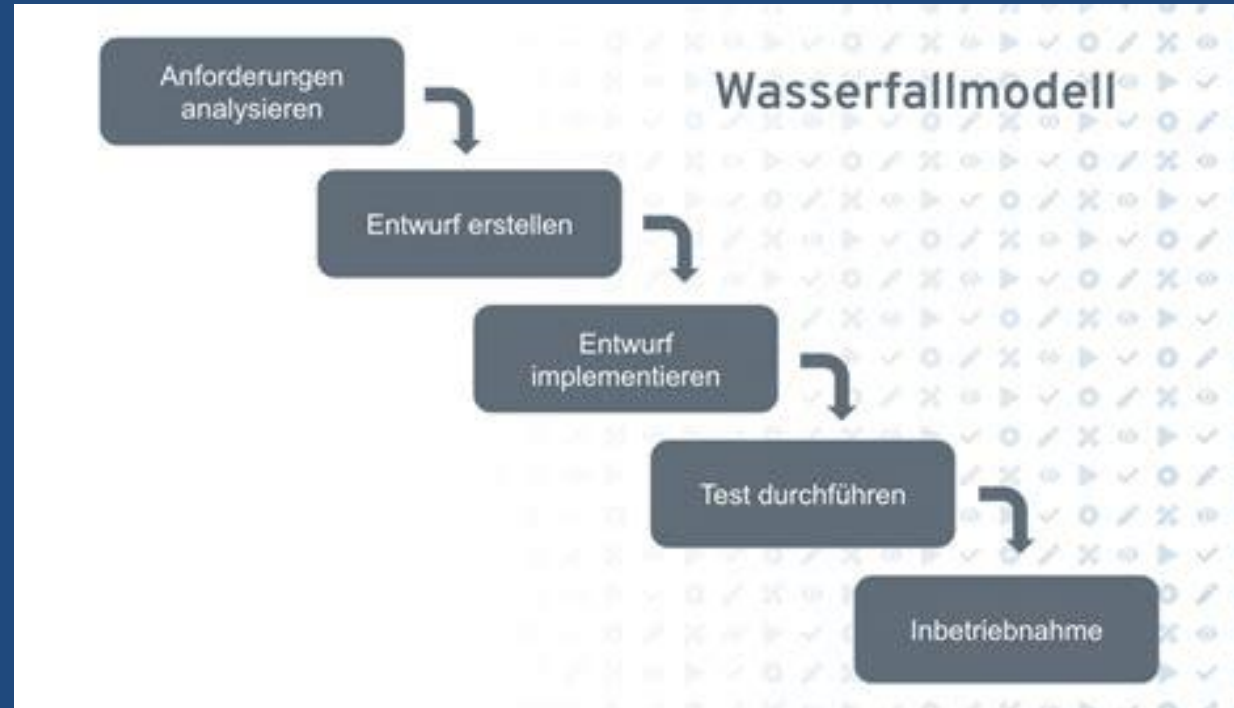


WASSERFALLMODEL

- KLASSISCH
- PHASEN FLIEßEN NACHEINANDER AB – KEINE RÜCKSPRÜNGE VORGESEHEN
 - STRIKT SEQUENTIELL
- DOKUMENTATIONSLASTIG

WASSERFALLMODEL - ANWENDUNG

- BAUWESEN (BEDARFSANALYSE → ENTWURF → GENEHMIGUNG → BAUAUSFÜHRUNG → ABNAHME)
- MASCHINENBAU
- HOHE PLANUNG, GROßER AUFWAND IN DER ÄNDERUNG
- (FRÜHER AUCH IN SOFTWAREENTWICKLUNG)

V-MODELL

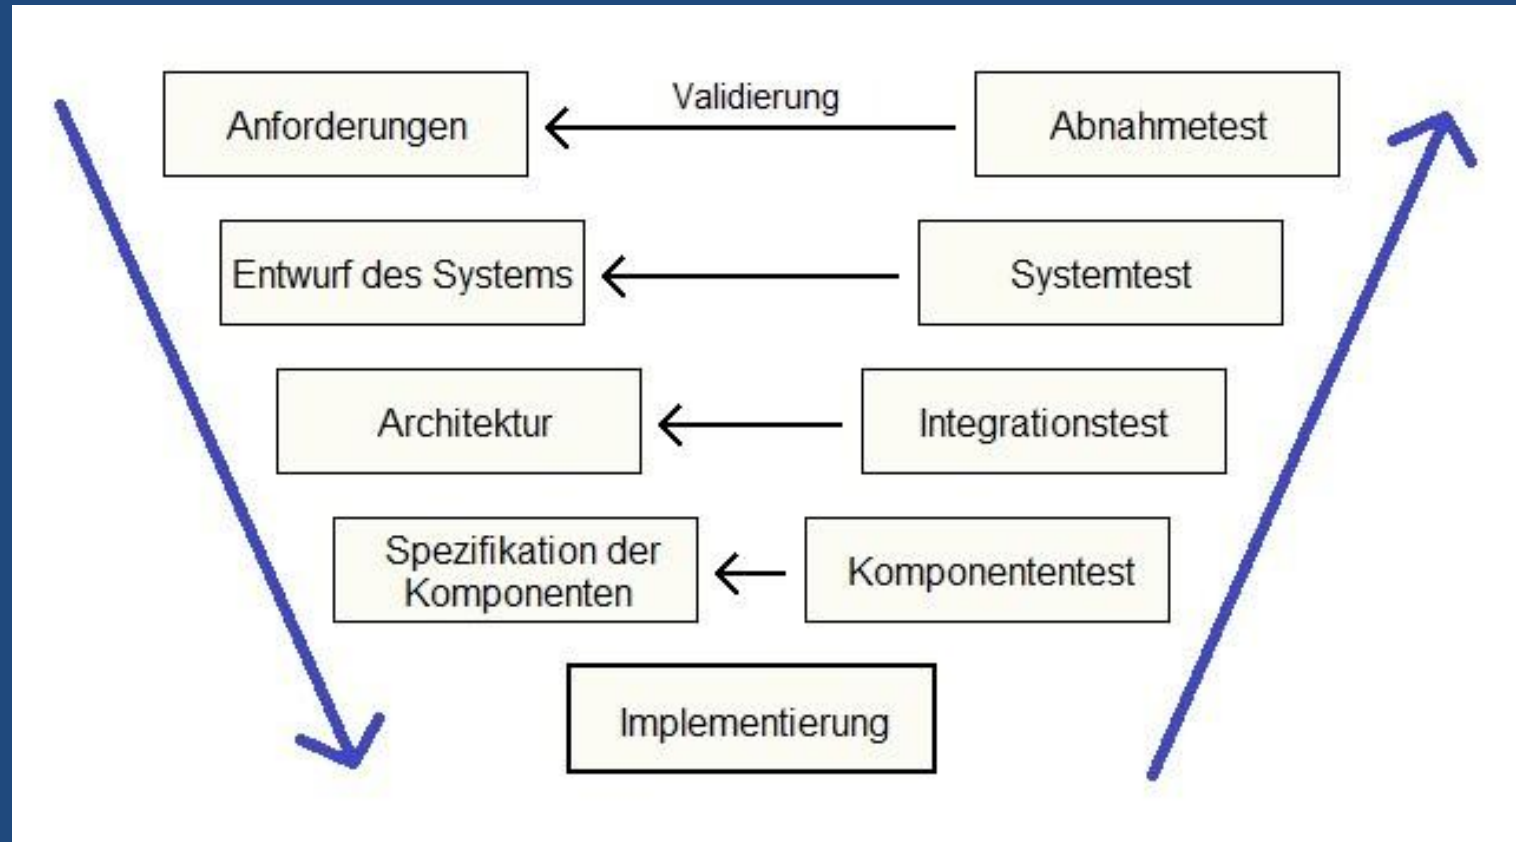


V-MODELL

- KLASSISCH
- PHASENORIENTIERT, SEQUENTIELL, PLANGETRIEBEN
- BASIERT AUF VOLLSTÄNDIGEN ANFORDERUNGEN ZUM PROJEKTBEGINN
- ÄNDERUNGEN SIND AUFWENDIG

V-MODELL - ANWENDUNG

- PROJEKTE MIT KLARER REGULATORISCHER ANFORDERUNG (MEDIZINTECHNIK)
- GROßPROJEKTE MIT VIELEN STAKEHOLDER
- BEHÖRDEN-IT – V-MODELL XT -> BUNDESWEHR, ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

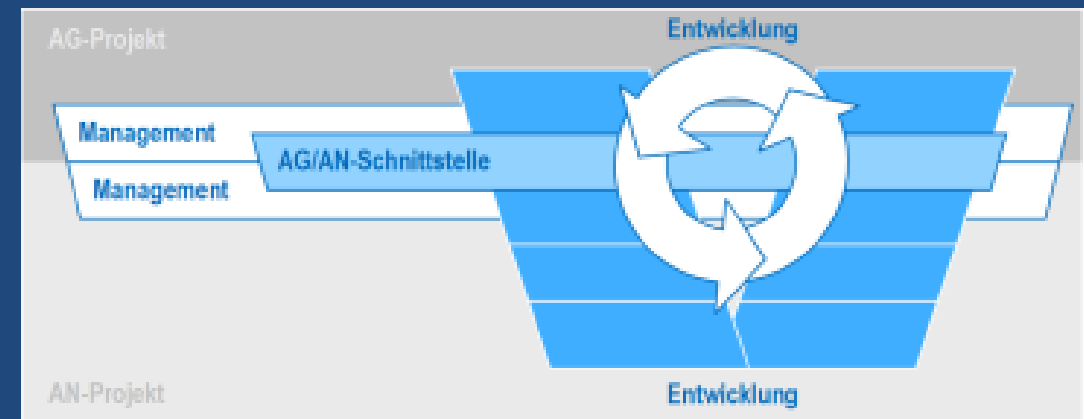

AGILE PROJEKTMETHODEN - SCRUM

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

WAS BEDEUTET AGIL?

- FLEXIBILITÄT, ZUSAMMENARBEIT UND KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
 - SCHNELLE ANPASSUNGEN IM PROJEKTVERLAUF
- ITERATIVE ARBEIT, KUNDENFOKUS, EIGENVERANTWORTLICHE TEAMS, TRANSPARENZ
- AGILES MANIFEST 2006 ALS GRUNDLAGE

- NICHT MEHR SO IM HYPE WIE VOR 2-3 JAHREN
- MEHR HYBRIDE MODELLE
- EIN SCHLECHTER PROZESS UND EIN SCHLECHTES TEAM WIRD NICHT BESSER, NUR WEIL AGIL DRAUFSTEHT

WAS BEDEUTET AGIL?

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler

James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick

Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

ÜBLICHE AGILE PROJEKTMETHODEN

Scrum

Kleine Teams

Selbstorganisation

Kurze Iterationen

Kundenfeedback

Kanban

Begrenzung paralleler Arbeit

Kanban-Boards

Ziel auf Fertigstellung von Tasks

Scrum


Kleine Teams

Selbstorganisation


Kurze Iterationen

Kundenfeedback


SKIZZE SCRUM PROJEKT

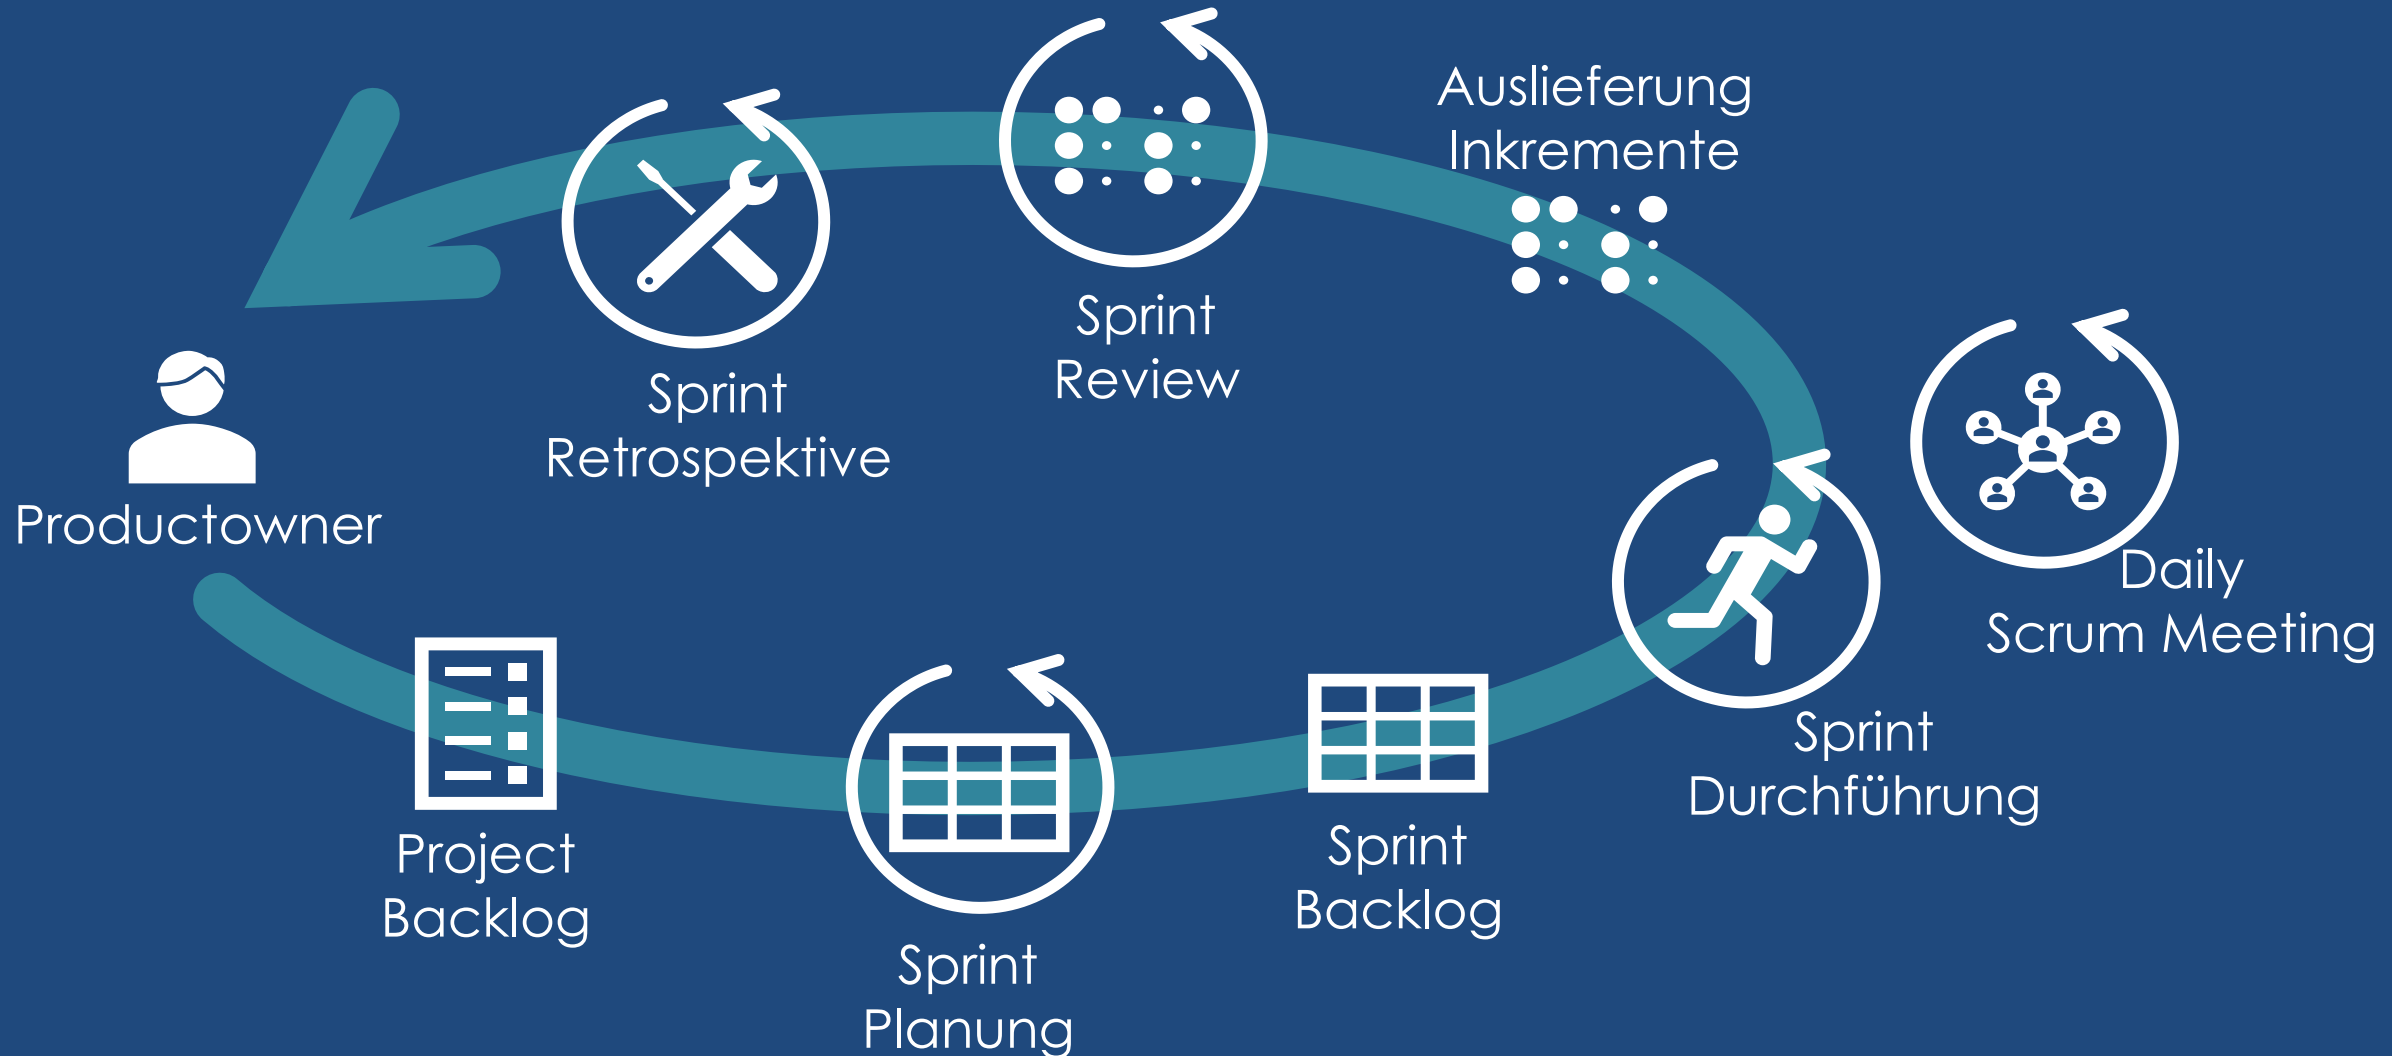


SCRUM ROLLEN

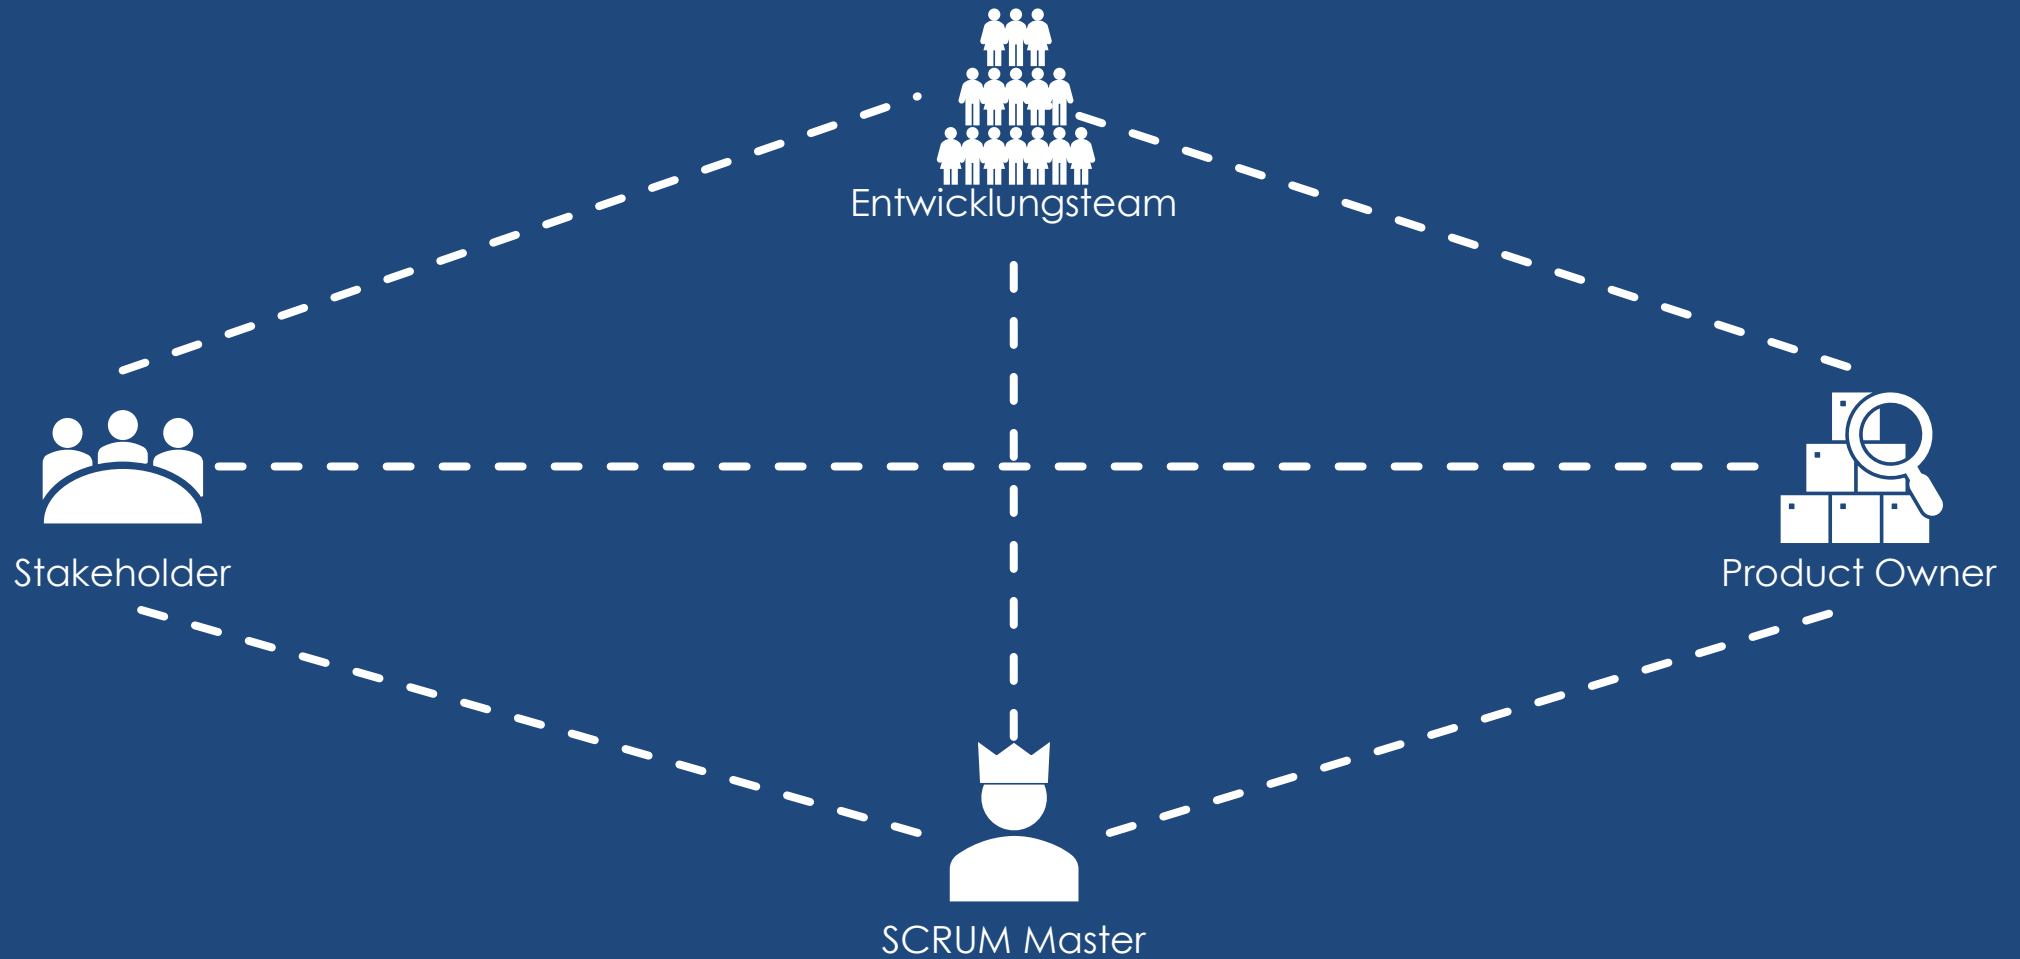

SCRUM ROLLEN – DER SCRUM-MASTER

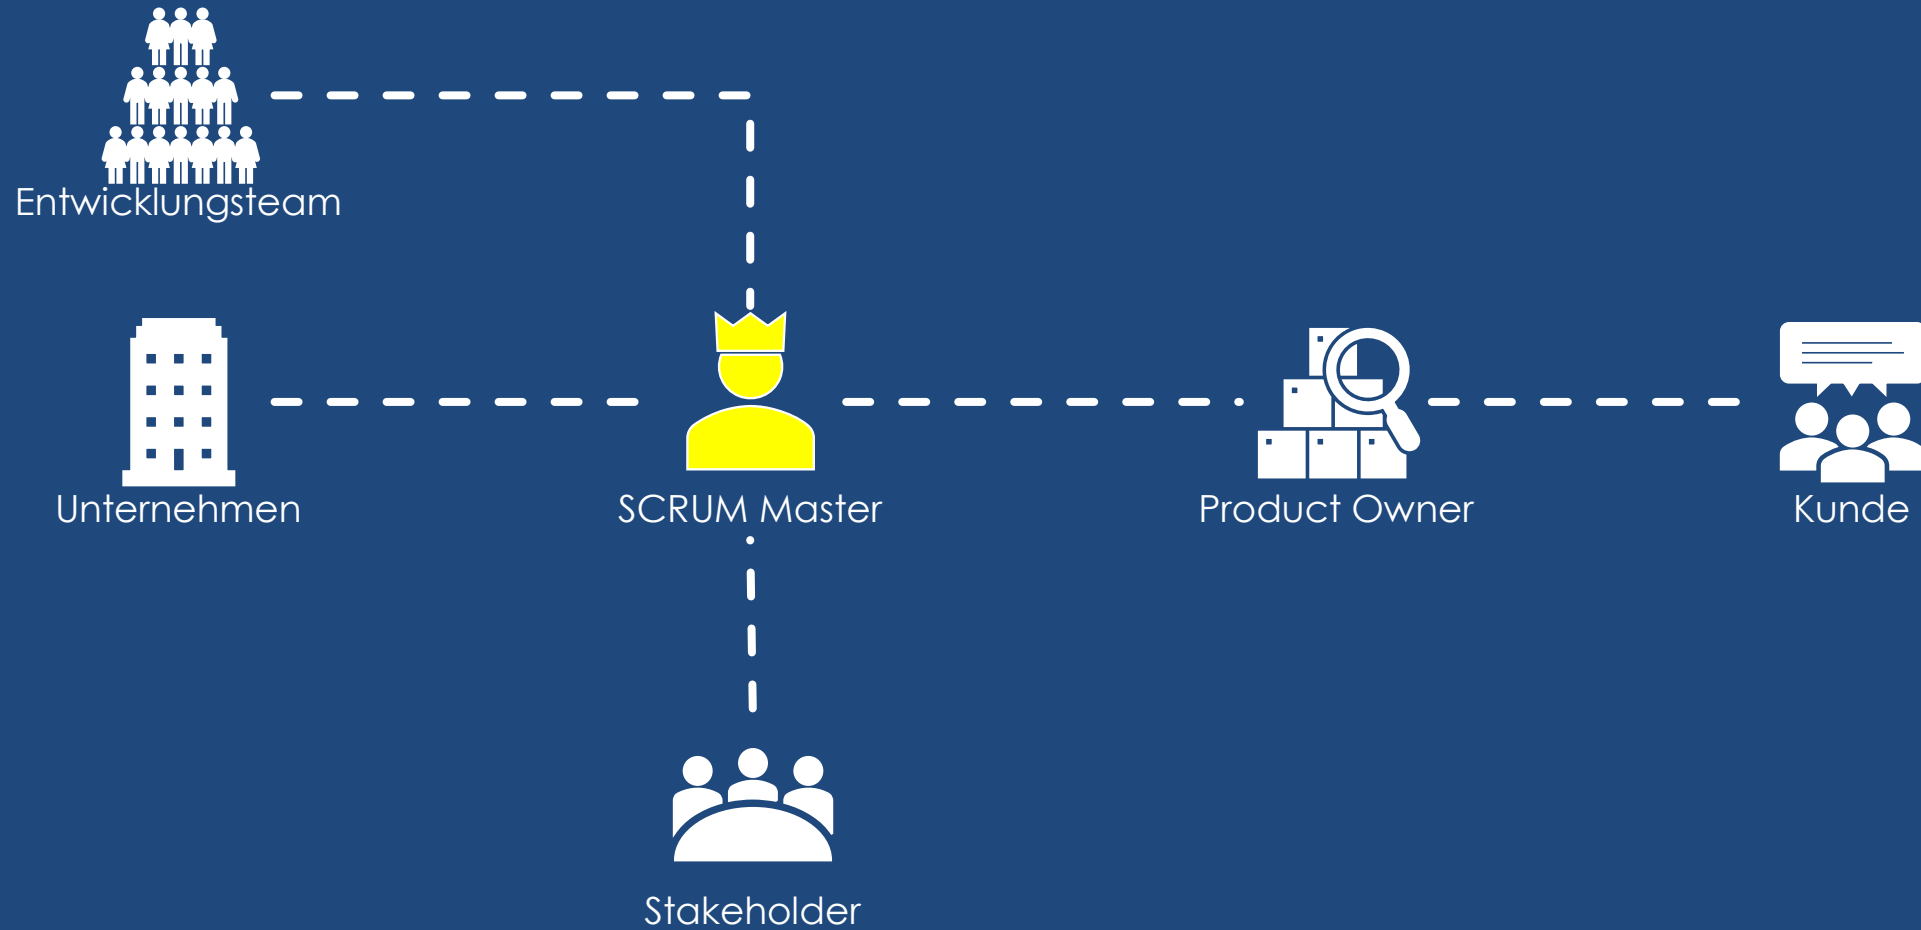

SCRUM ROLLEN – DER PRODUCT OWNER

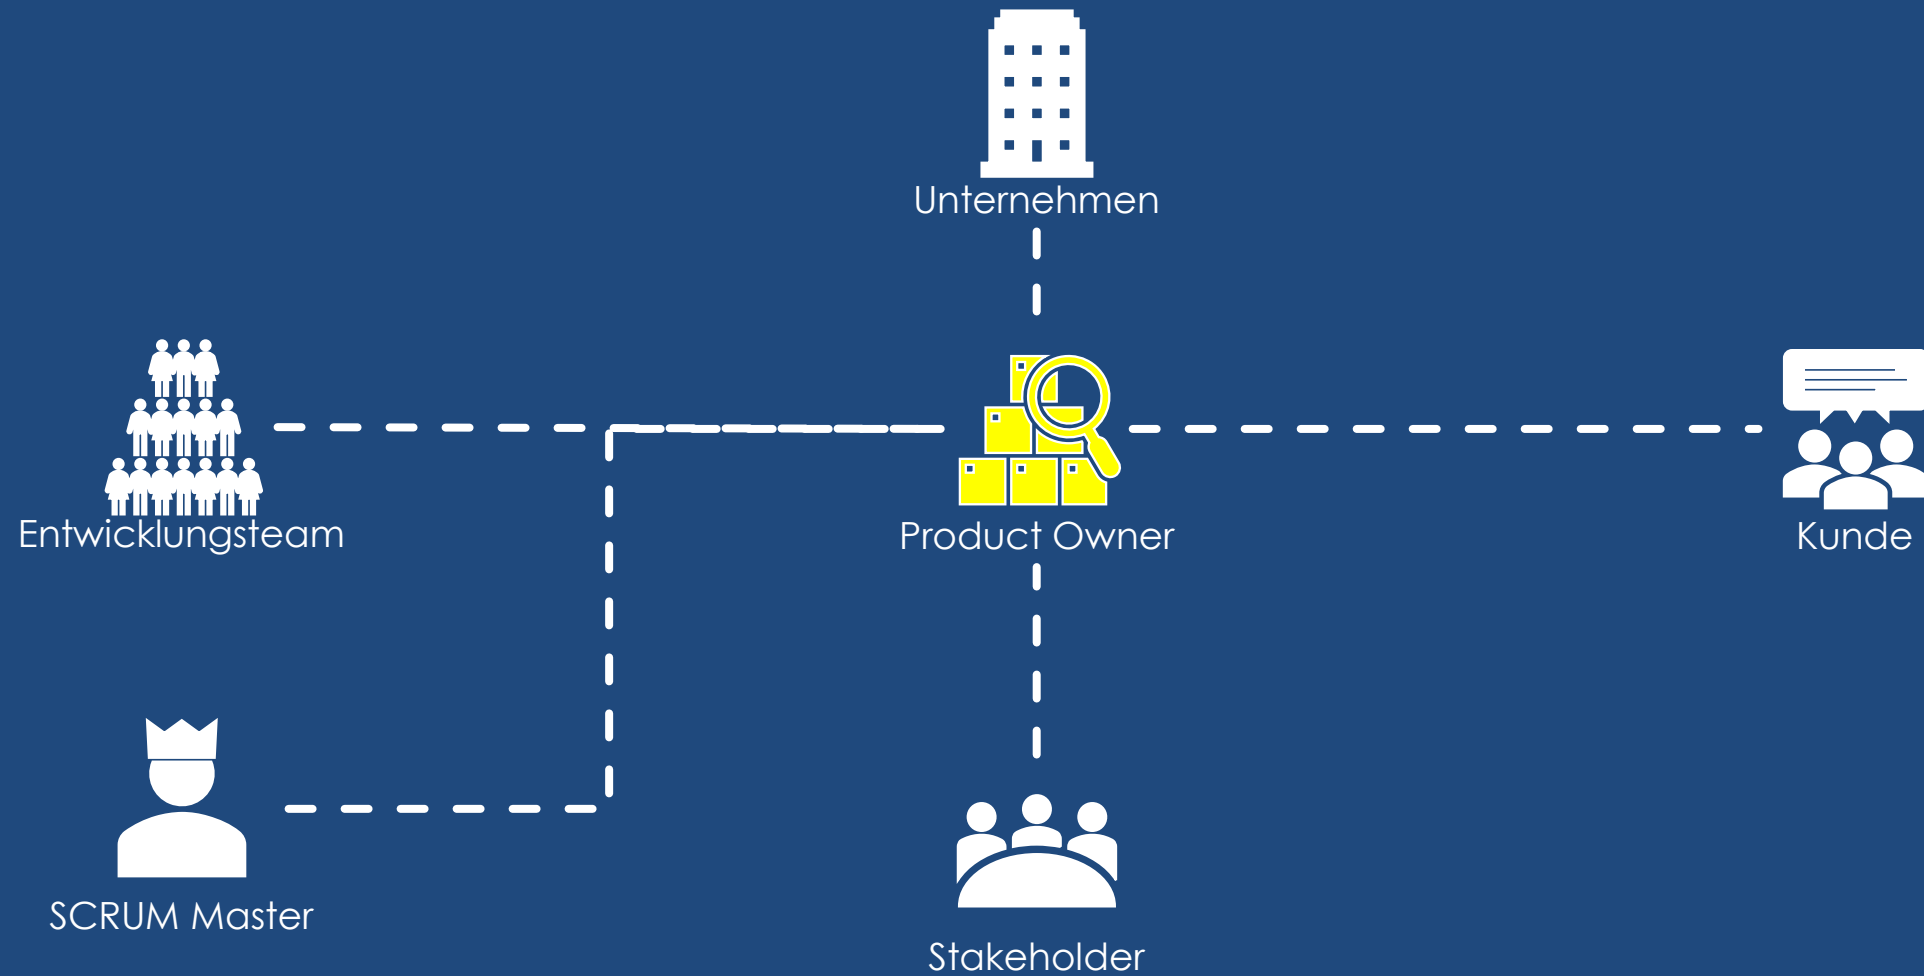

SCRUM ROLLEN – DAS ENTWICKLUNGSTEAM



SCRUM CEREMONIES

Sprint

Fest definierter Zeitraum

Alle Sprints gleich lang

Dauer zwischen 1 und 4 Wochen

Planung

Gesamtes Team Beteiligt

Planung der Arbeiten

Max. 8 Stunden

Ausblick: Was und wie?

Daily-Scrum

Höchstens 15 Minuten

Abstimmung der Arbeiten

Plan für 24 Stunden

Status und Hindernisse

Review Meeting

Ende jedes Sprint

Reflektion des Sprint

Anpassen Backlog

Max. 4 Stunden

Scrum-Team+
Stakeholder +
Product Owner


Retrospective

Rückblick auf Team, Mitarbeiter, Prozesse

Suche nach Verbesserungen

Plan für Verbesserungspunkte

SCRUM ARTEFAKTE

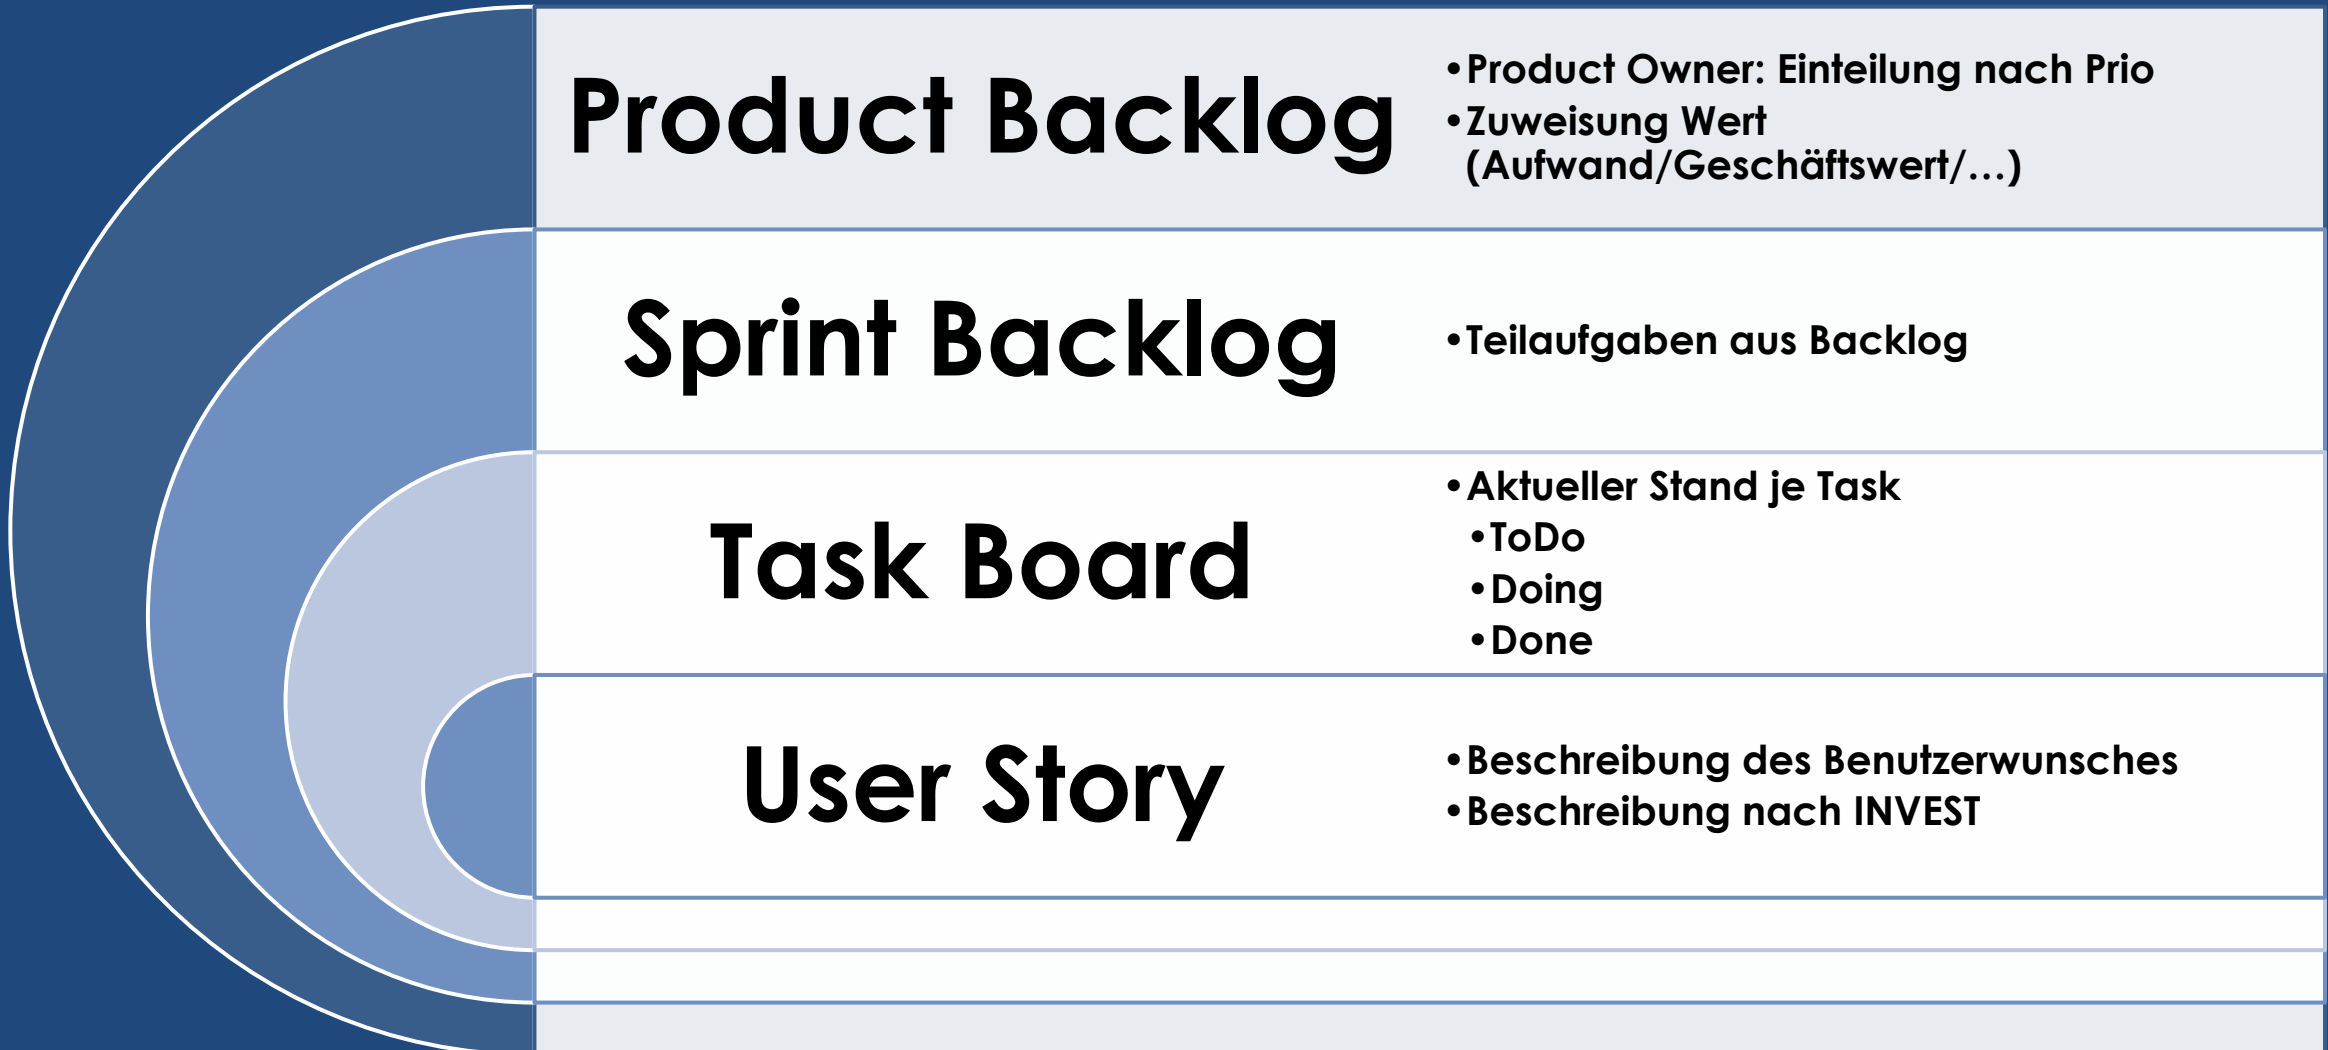


SCRUM OF SCRUMS



Vertreter ist Mitglied des SCRUM
of SCRUM Meeting

TEAM Bestimmt einen Vertreter

SCRUM OF SCRUMS

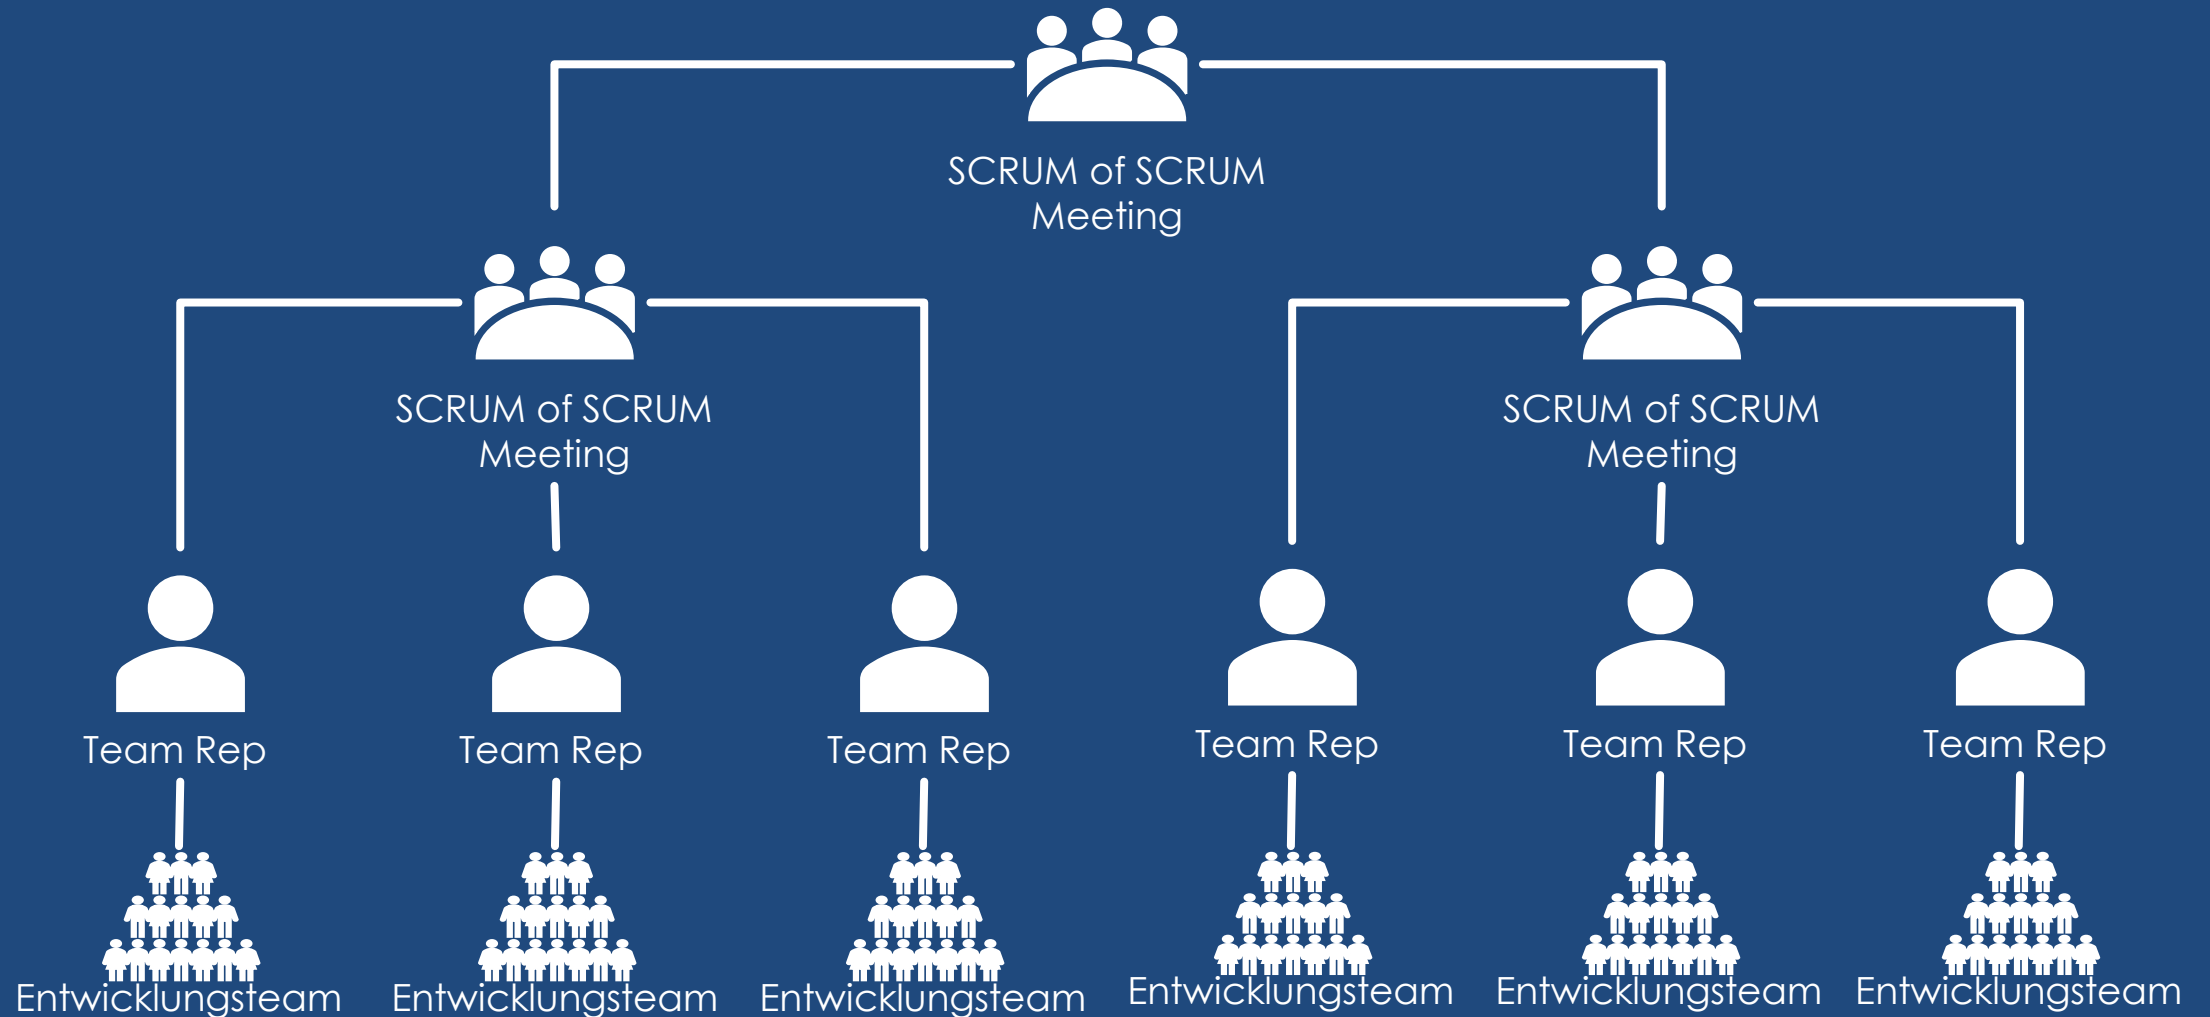

PROJEKTMETHODEN - KANBAN

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

ÜBLICHE AGILE PROJEKTMETHODEN

Scrum

Kleine Teams

Selbstorganisation

Kurze Iterationen

Kundenfeedback

Kanban

Begrenzung paralleler Arbeit

Kanban-Boards

Ziel auf Fertigstellung von Tasks

ÜBLICHE AGILE PROJEKTMETHODEN

Kanban


Begrenzung paralleler Arbeit

Kanban-Boards


Ziel auf Fertigstellung von Tasks

KANBAN IM IT PROJEKTMANAGEMENT

- GRUNDPRINZIPIEN NACH DAVID ANDERSON
- VIER GRUNDPRINZIPIEN FÜR DIE ANWENDUNG IN IT PROJEKTEN
- MATERIALFLUSS WIRD ALS AUFGABEN VISUALISIERT. JEDE AUFGABE WIRD AUF DEM KANBANBOARD DARGESTELLT



Start = Status Quo



inkrementell,
evolutionäre
Veränderung



Prozesse, Rollen und
Verantwortlichkeiten
respektieren



Leadership ist zu
fördern

KANBAN IM IT PROJEKTMANAGEMENT


- 6 GRUNDLAGEN
- DER EINSATZ VON KANBAN IN DER PROJEKTARBEIT HAT DEN VORTEIL, DASS DER MANAGEMENTAUFWAND REDUZIERT WIRD UND DIE ABARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT STEIGT.
- DABEI KANN KANBAN SOWOHL IM RAHMEN VON TRADITIONELLEN WIE AGILEN MANAGEMENTMETHODEN EINGESETZT WERDEN.
- BEI AGILEN METHODEN PROFITIEREN TEAMS AUCH BEI KANBAN VON KURZEN SPRINTS (SCRUM), SODASS FEHLENTWICKLUNGEN SCHNELLER BEMERKT WERDEN. ZUDEM
- KANBAN ERHÖHT DIE ARBEITSMOTIVATION, DA DIE EINZELNEN TEAMS AUTONOMER ARBEITEN UND MITGLIEDER SICH IHRE AUFGABEN AUS DEM VORHANDENEN POOL SELBST „HOLEN“.




Klare Regeln



Aufgabenlimit



Workflow



Kont.
Verbesserung




Leadership




Modelle


KANBAN BOARD

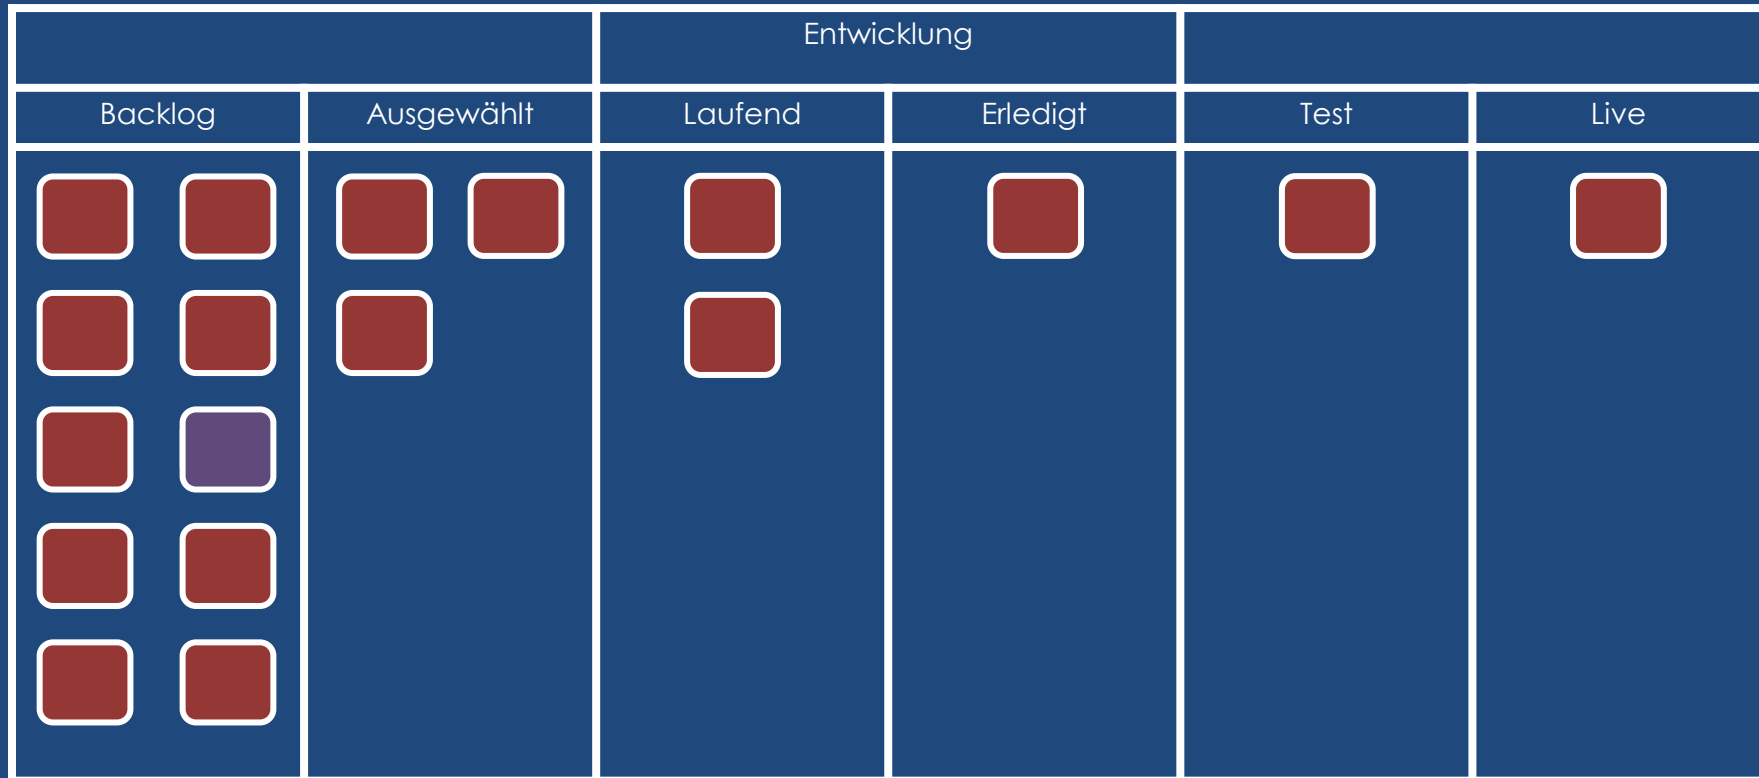


KANBAN BOARD

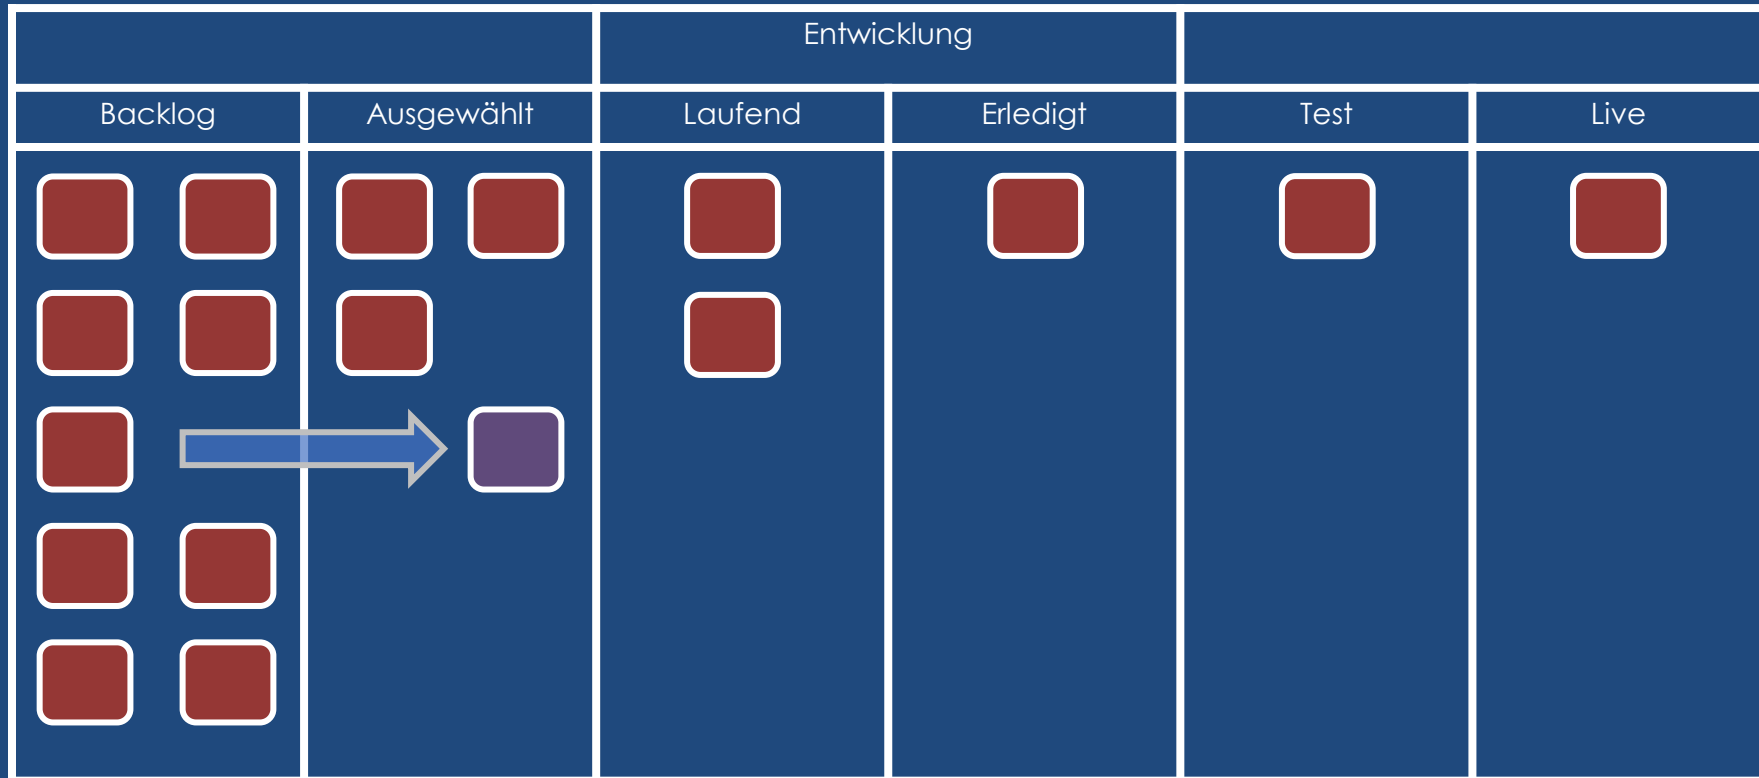


KANBAN BOARD

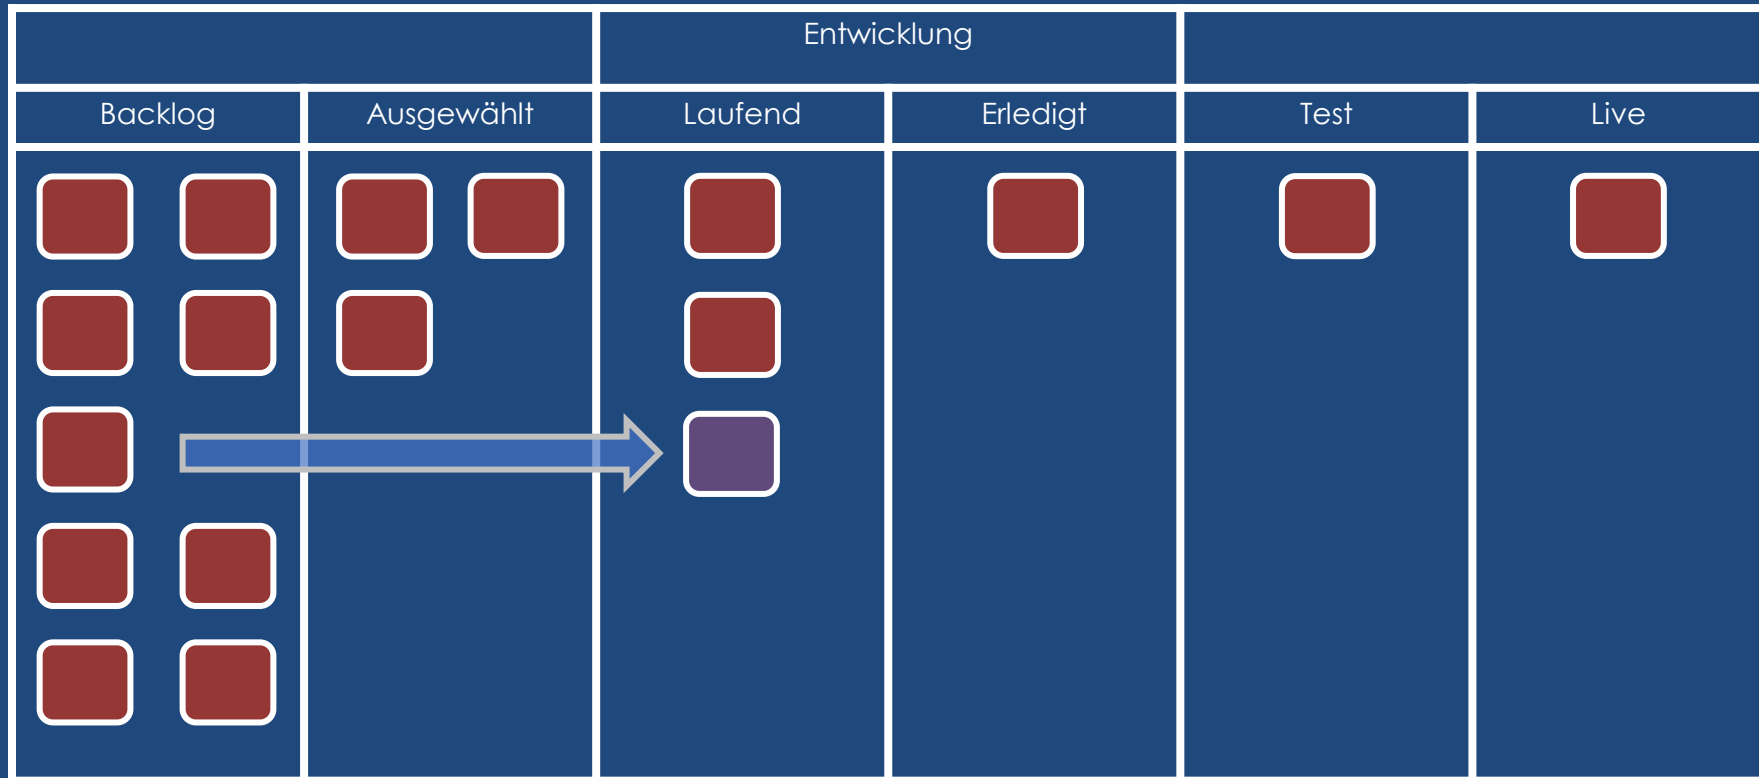


KANBAN BOARD

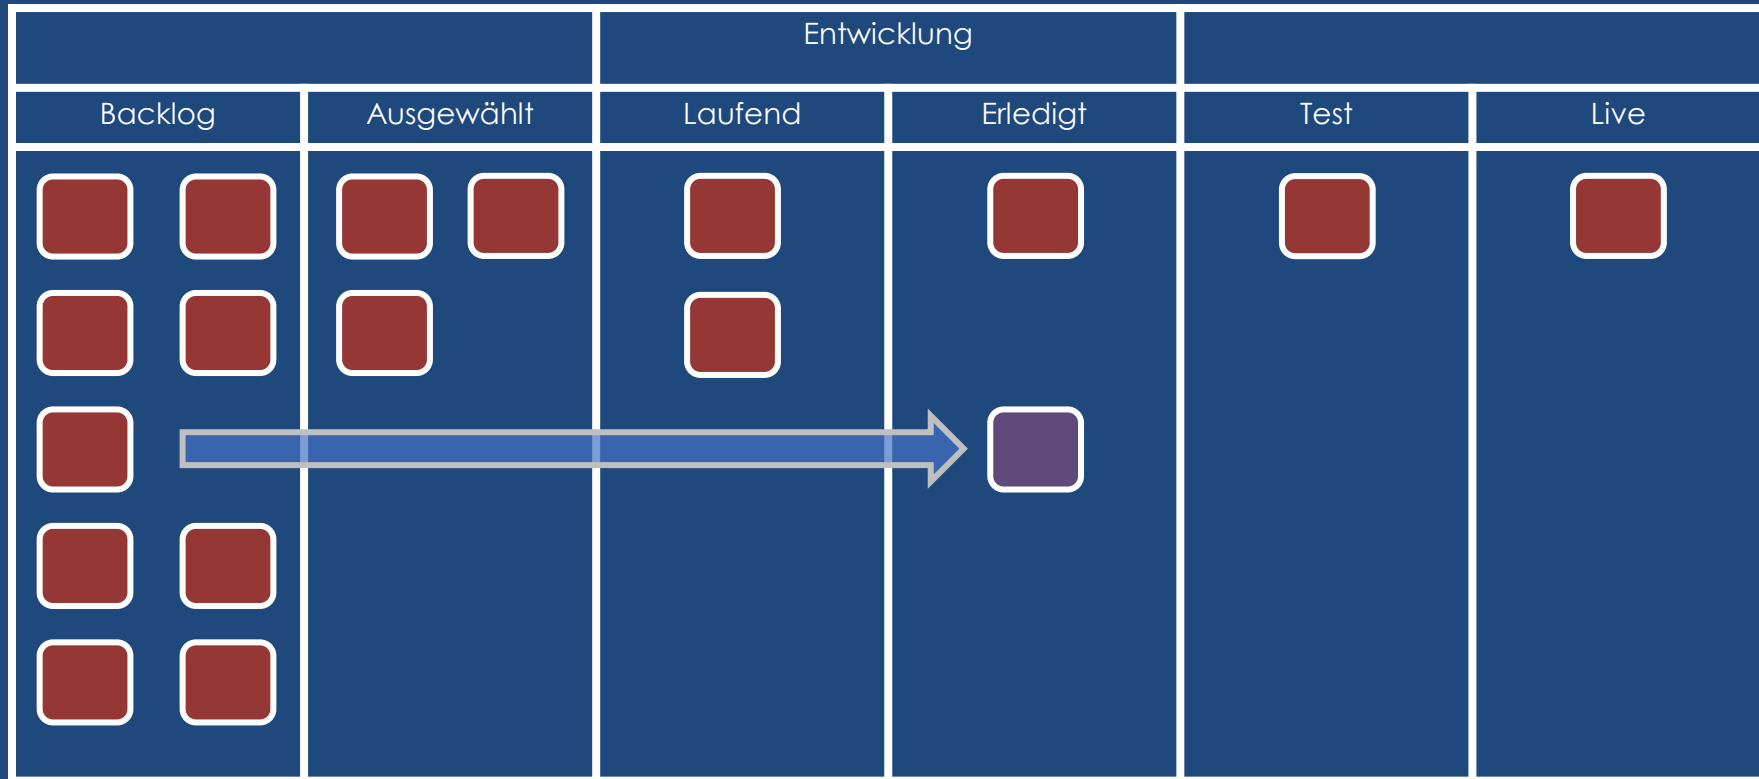

KANBAN BOARD

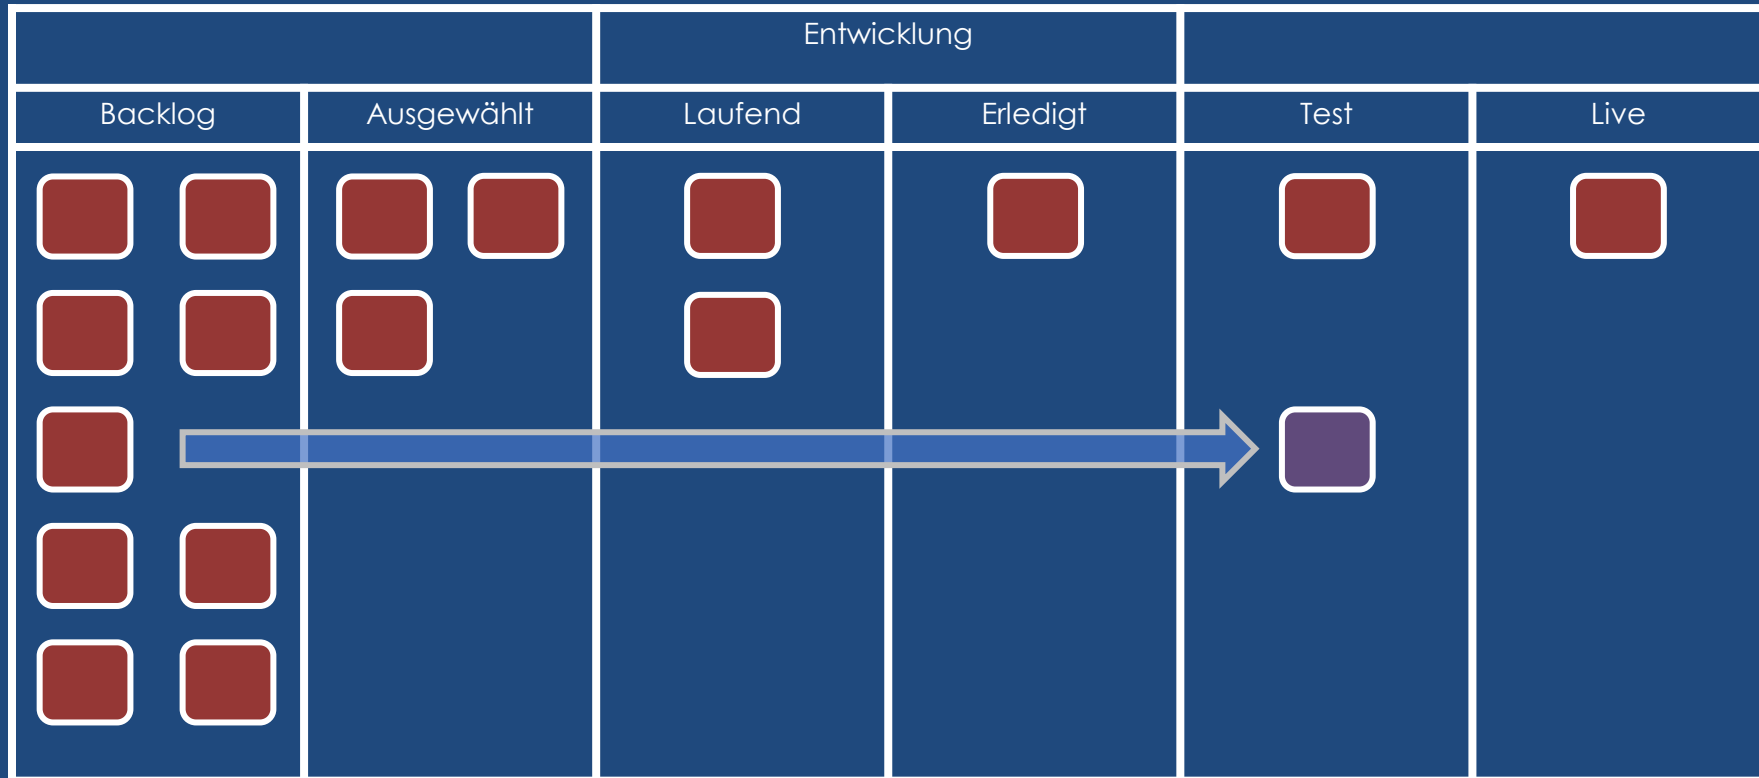

KANBAN BOARD

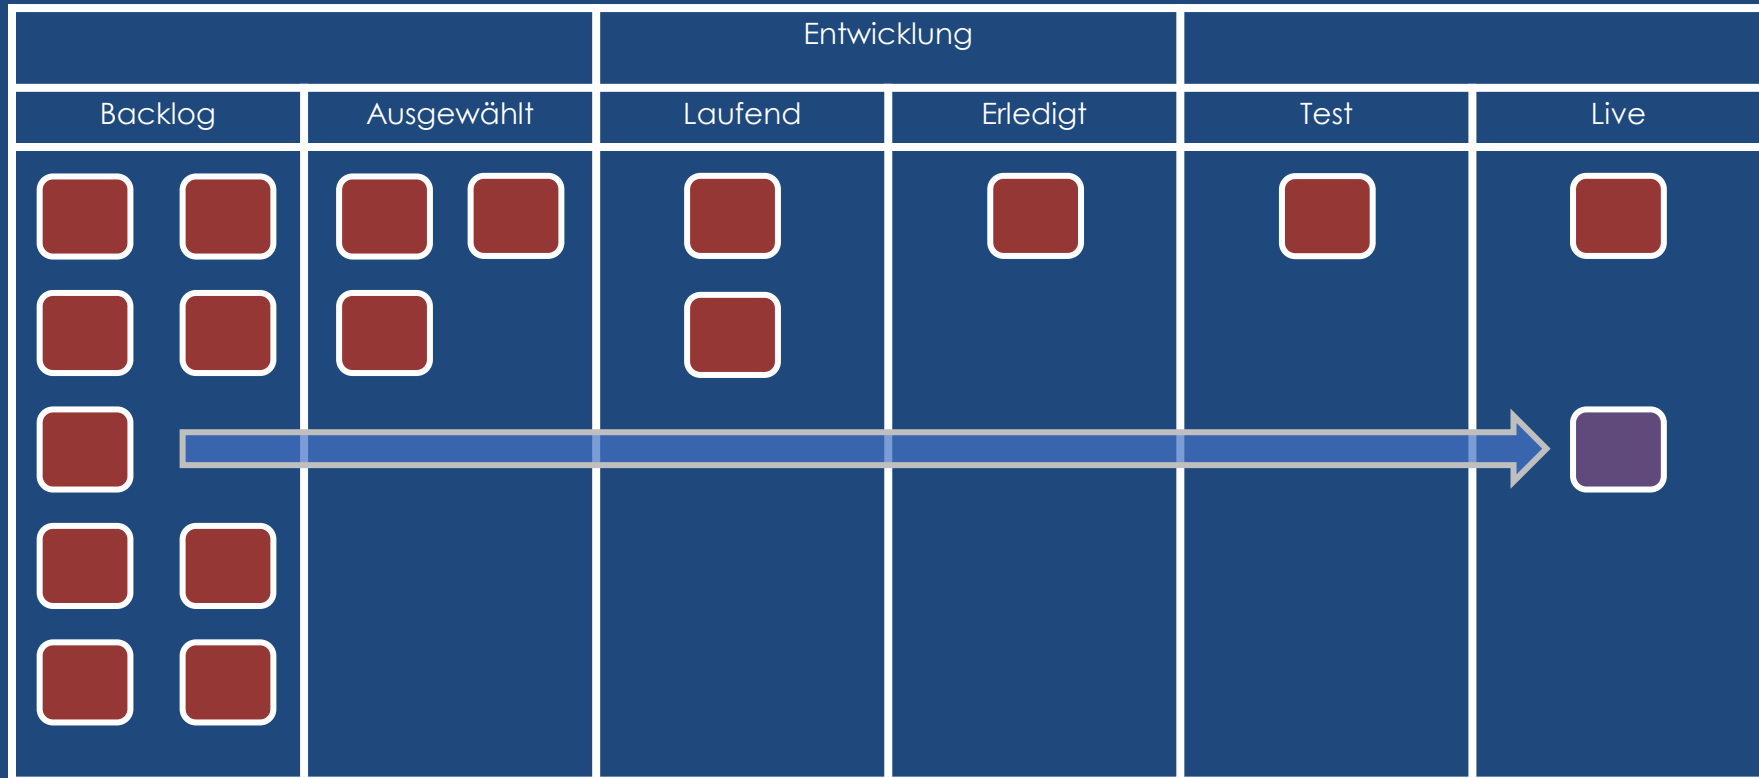

KANBAN BOARD

		Entwicklung			
Backlog	Ausgewählt	Laufend	Erledigt	Test	Live
 	 				
 					
					
 					
 					

SCRUMBAN

- FLEXIBLERES SCRUM ODER STRUKTURIERTERES KANBAN

Merkmal	Beschreibung
Board & Visualisierung	Wie bei Kanban: Nutzung eines Boards mit Spalten wie "To Do", "In Progress", "Done"
WIP-Limits	Work-in-Progress-Begrenzungen helfen, Überlastung zu vermeiden
Pull-Prinzip	Aufgaben werden vom Team gezogen, sobald Kapazität frei ist – kein Zuweisen von außen
Planning on Demand	Statt fester Sprints: Neue Aufgaben werden geplant, wenn ein Schwellenwert (z. B. wenig offene Tasks) erreicht ist
Meetings optional	Scrum-Meetings (Daily, Retrospektive etc.) können übernommen, aber auch angepasst oder reduziert werden
Zyklische Verbesserungen	Retrospektiven und kontinuierliche Prozessanpassungen aus Scrum bleiben erhalten

TRENDS IN IT-PROJEKTEN

Traditionell

PMI

Wasserfall

V-Modell

IPMA

PRINCE2

Agil

Scrum

Kanban

XP

Crystal

DSDM

Scrumban

Andere

LPM

Six Sigma

TRENDS IN IT-PROJEKTEN

PRINCE2

Software
Implementierung

Traditionelle Kunden

Kleine Projekte

Scrum

Softwareentwicklung

Software
Implementierung

Kanban

Softwareentwicklung

Software
Implementierung

Umsetzung in
Teilprojekten

TRENDS IN IT-PROJEKTEN

SAFe

Skalierung von
agilen Methoden

Arbeit an
Inkrementen

Große
unternehmen

DevOps

Entwicklung und
Betrieb näher
zusammen

Continuous
integration and
deployment

OKR

Arbeitsweise

Zielbasiert

Messbare
Ergebnisse
