


CONTROLLING, BERICHTE UND RISIKOMANAGEMENT

VL5

RECAP

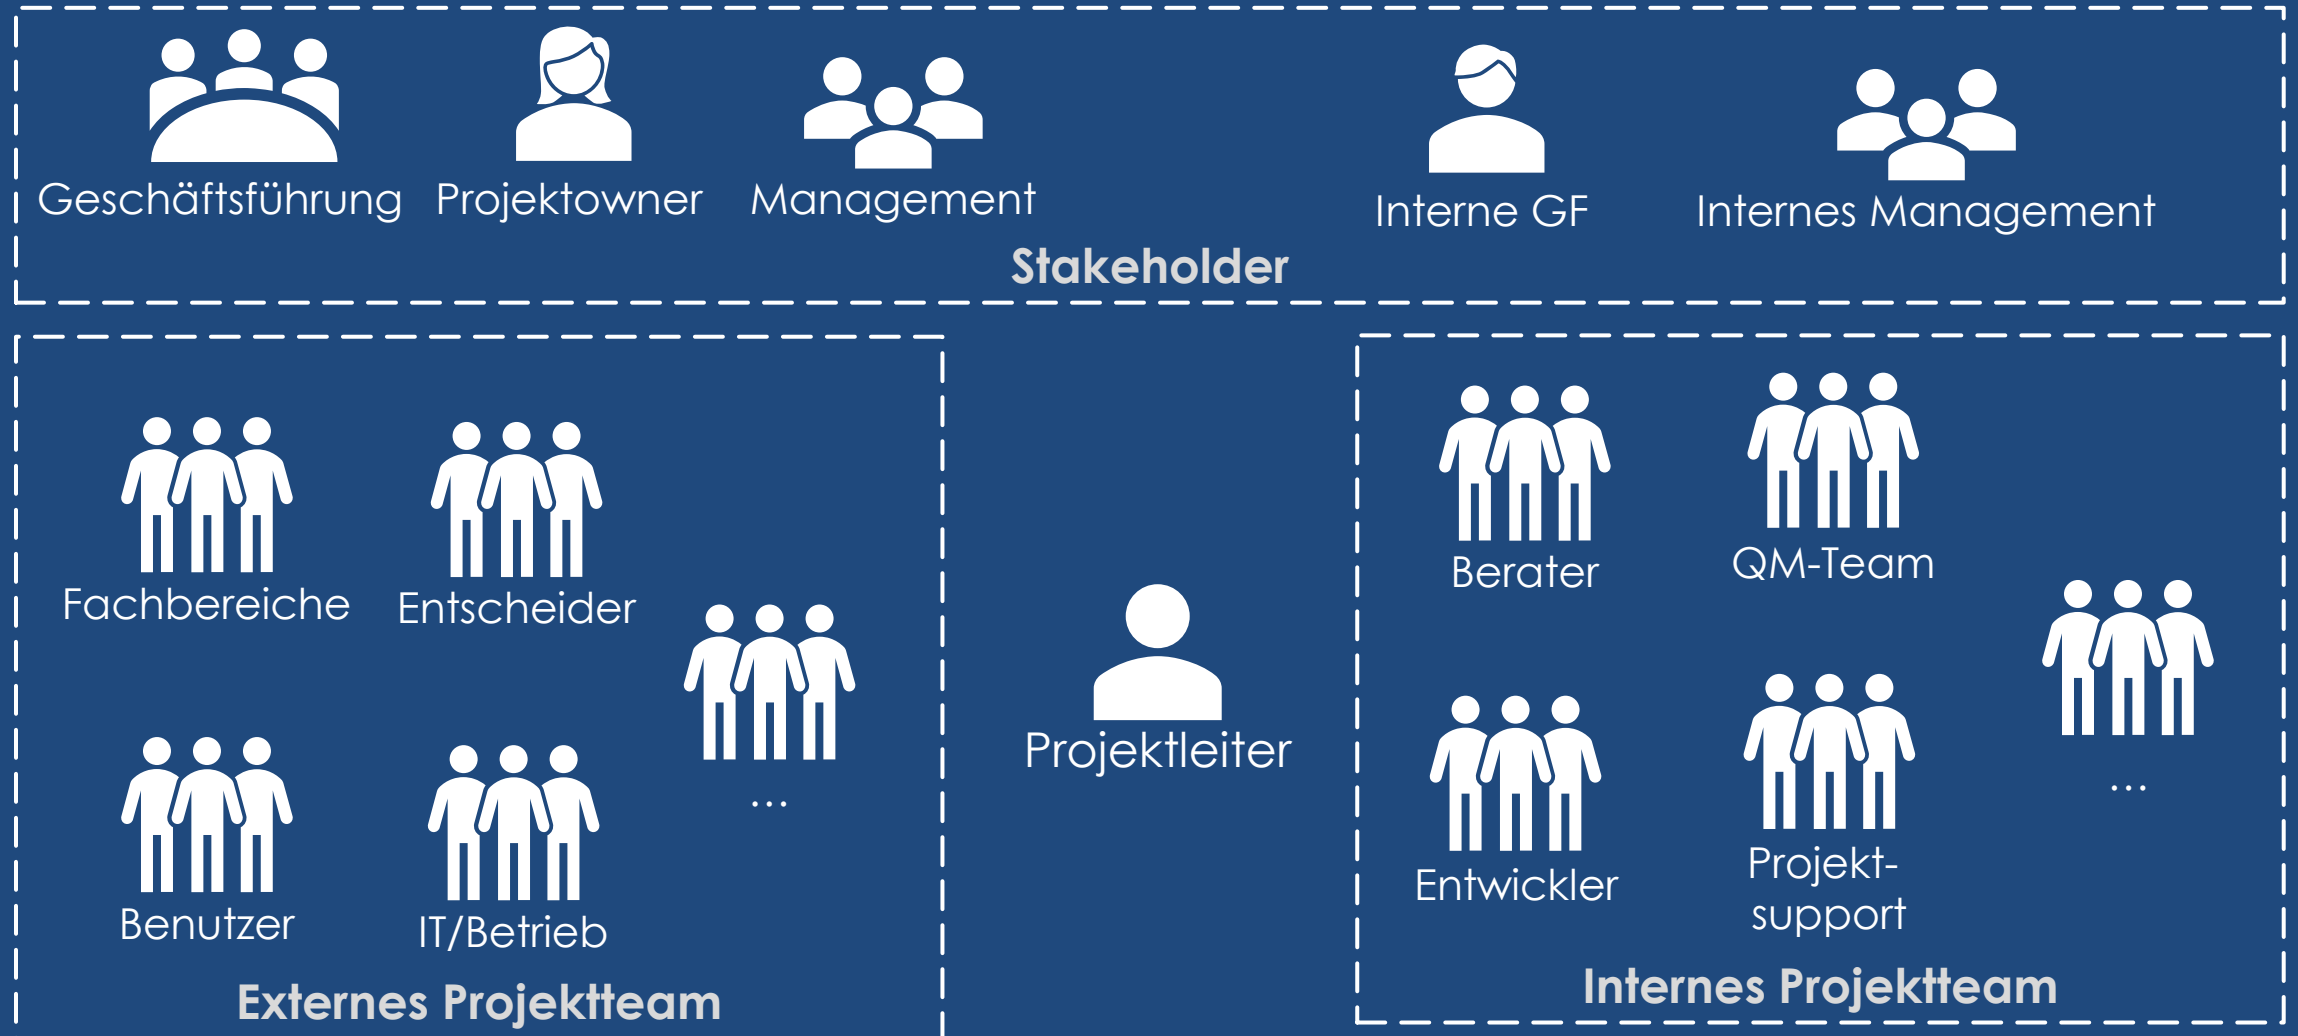

RECAP

Project Tasks	Product Owner	Business Analyst	Financial Lead	Design Director	Design Lead	CRM Lead	Head of CRM	Senior Stakeholders	Senior Stakeholders	AGENCY
1. Research										
Econometric model	C	C	A	I	I	C	I	C	I	R
Strategic framework	A	C	C	I	I	C	I	C	I	R
2. Define										
Product concept	A	C	I	C	I	C	C	C	I	R
User testing	A	C	I	I	I	C	I	I	I	R
User journey	A	C	I	I	I	C	I	C	I	R
Design framework	C	C	I	R	A	I	I	C	I	R
Technology recommendations	C	A	I	I	I	I	I	C	I	R
Measurement framework	R	C	A	I	I	C	I	C	I	R
Product backlog	A	R	I	C	I	C	I	C	I	C
Delivery roadmap	A	R	I	R	C	C	I	C	C	R

RECAP

Handlungs-orientiert

Implementierter

Perfektionist

Macher

Kommunikations-orientiert

Koordinator

Teamarbeiter

Wegbereiter

Wissens-orientiert




Neuerer

Beobachter

Spezialist

RECAP

		Markt und Umfeld		Erneuerungsthema		Weg zum Projekt	
am Projekt	an das Projekt	Faktor	Bemerkung	Faktor	Bemerkung		
Planung, Umsetzung bei Kosten-erwartung	günstige Konditionen, optimale Platzverhältnisse	1	Präsident und Sportlehrer sehr motiviert, hohe Akzeptanz bei den Jugendlichen	3			
kein Unterschied bei Arbeitsbelastung	Aufwertung der Touristen, günstige Hygiene, Jugendarbeit	2	moderne, viele neuzeitliche, schoner Mittelstand	1			
sicheren und bei der Verfügung	vermeintliche Konditionen für sich und Familie	4	Rechtswegs, meistens unbeding gesprochen werden, somit kein Verbleib aus dem Veranstaltungsbereich	1	kein durch Engepässe Verlassen, sondern durch einen kleinen, dunklen Raum		
bei Wäldern	nicht nur weitere Flächen verpachten	3	Rechtswegs, meistens unbeding gesprochen werden, somit kein Verbleib aus dem Veranstaltungsbereich	1	Rechtswegs, meistens unbeding gesprochen werden, somit kein Verbleib aus dem Veranstaltungsbereich		
stehen bei der Nutzung	ist Gegen von Golfplätzen allgemein	3	politisch nicht über große Teile der Bevölkerung besser	2	politisch nicht über große Teile der Bevölkerung besser		
Übung bei sich und Werbung	Schaffung von Arbeitsplätzen	4	Bezugszeit ist mit Präsidenten-Golfplatz verwandt	2	Bezugszeit ist mit Präsidenten-Golfplatz verwandt		
ation, zusammenzuschauen	Vermeidung von Unfällen, Störungen und Feste des Umfeldes lassen im Saft stattfinden	2	Konkurrenzdruck zwischen den Firmen ist hoch	2	Überhöhte Rechnungen sind nicht selten		
7. Angebote, gute	Auflage, auch langfristig	2	Konkurrenzdruck zwischen den Firmen ist hoch	2	Überhöhte Rechnungen sind nicht selten		

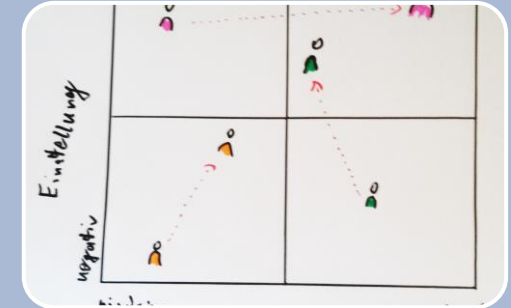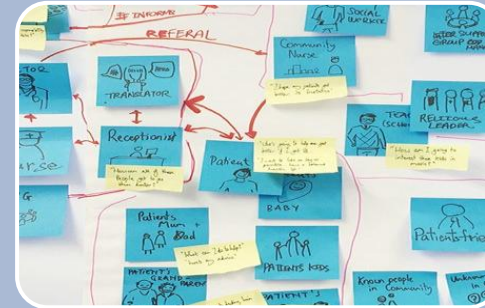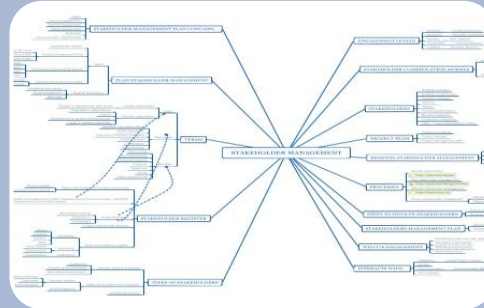

Excel

Mindmap

Postit

Blatt Papier

RECAP

Traditionell

PMI

Wasserfall

V-Modell

IPMA

PRINCE2

Agil

Scrum

Kanban

XP

Crystal

DSDM

Scrumban


Andere

LPM

Six Sigma

RISIKOMANAGEMENT

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

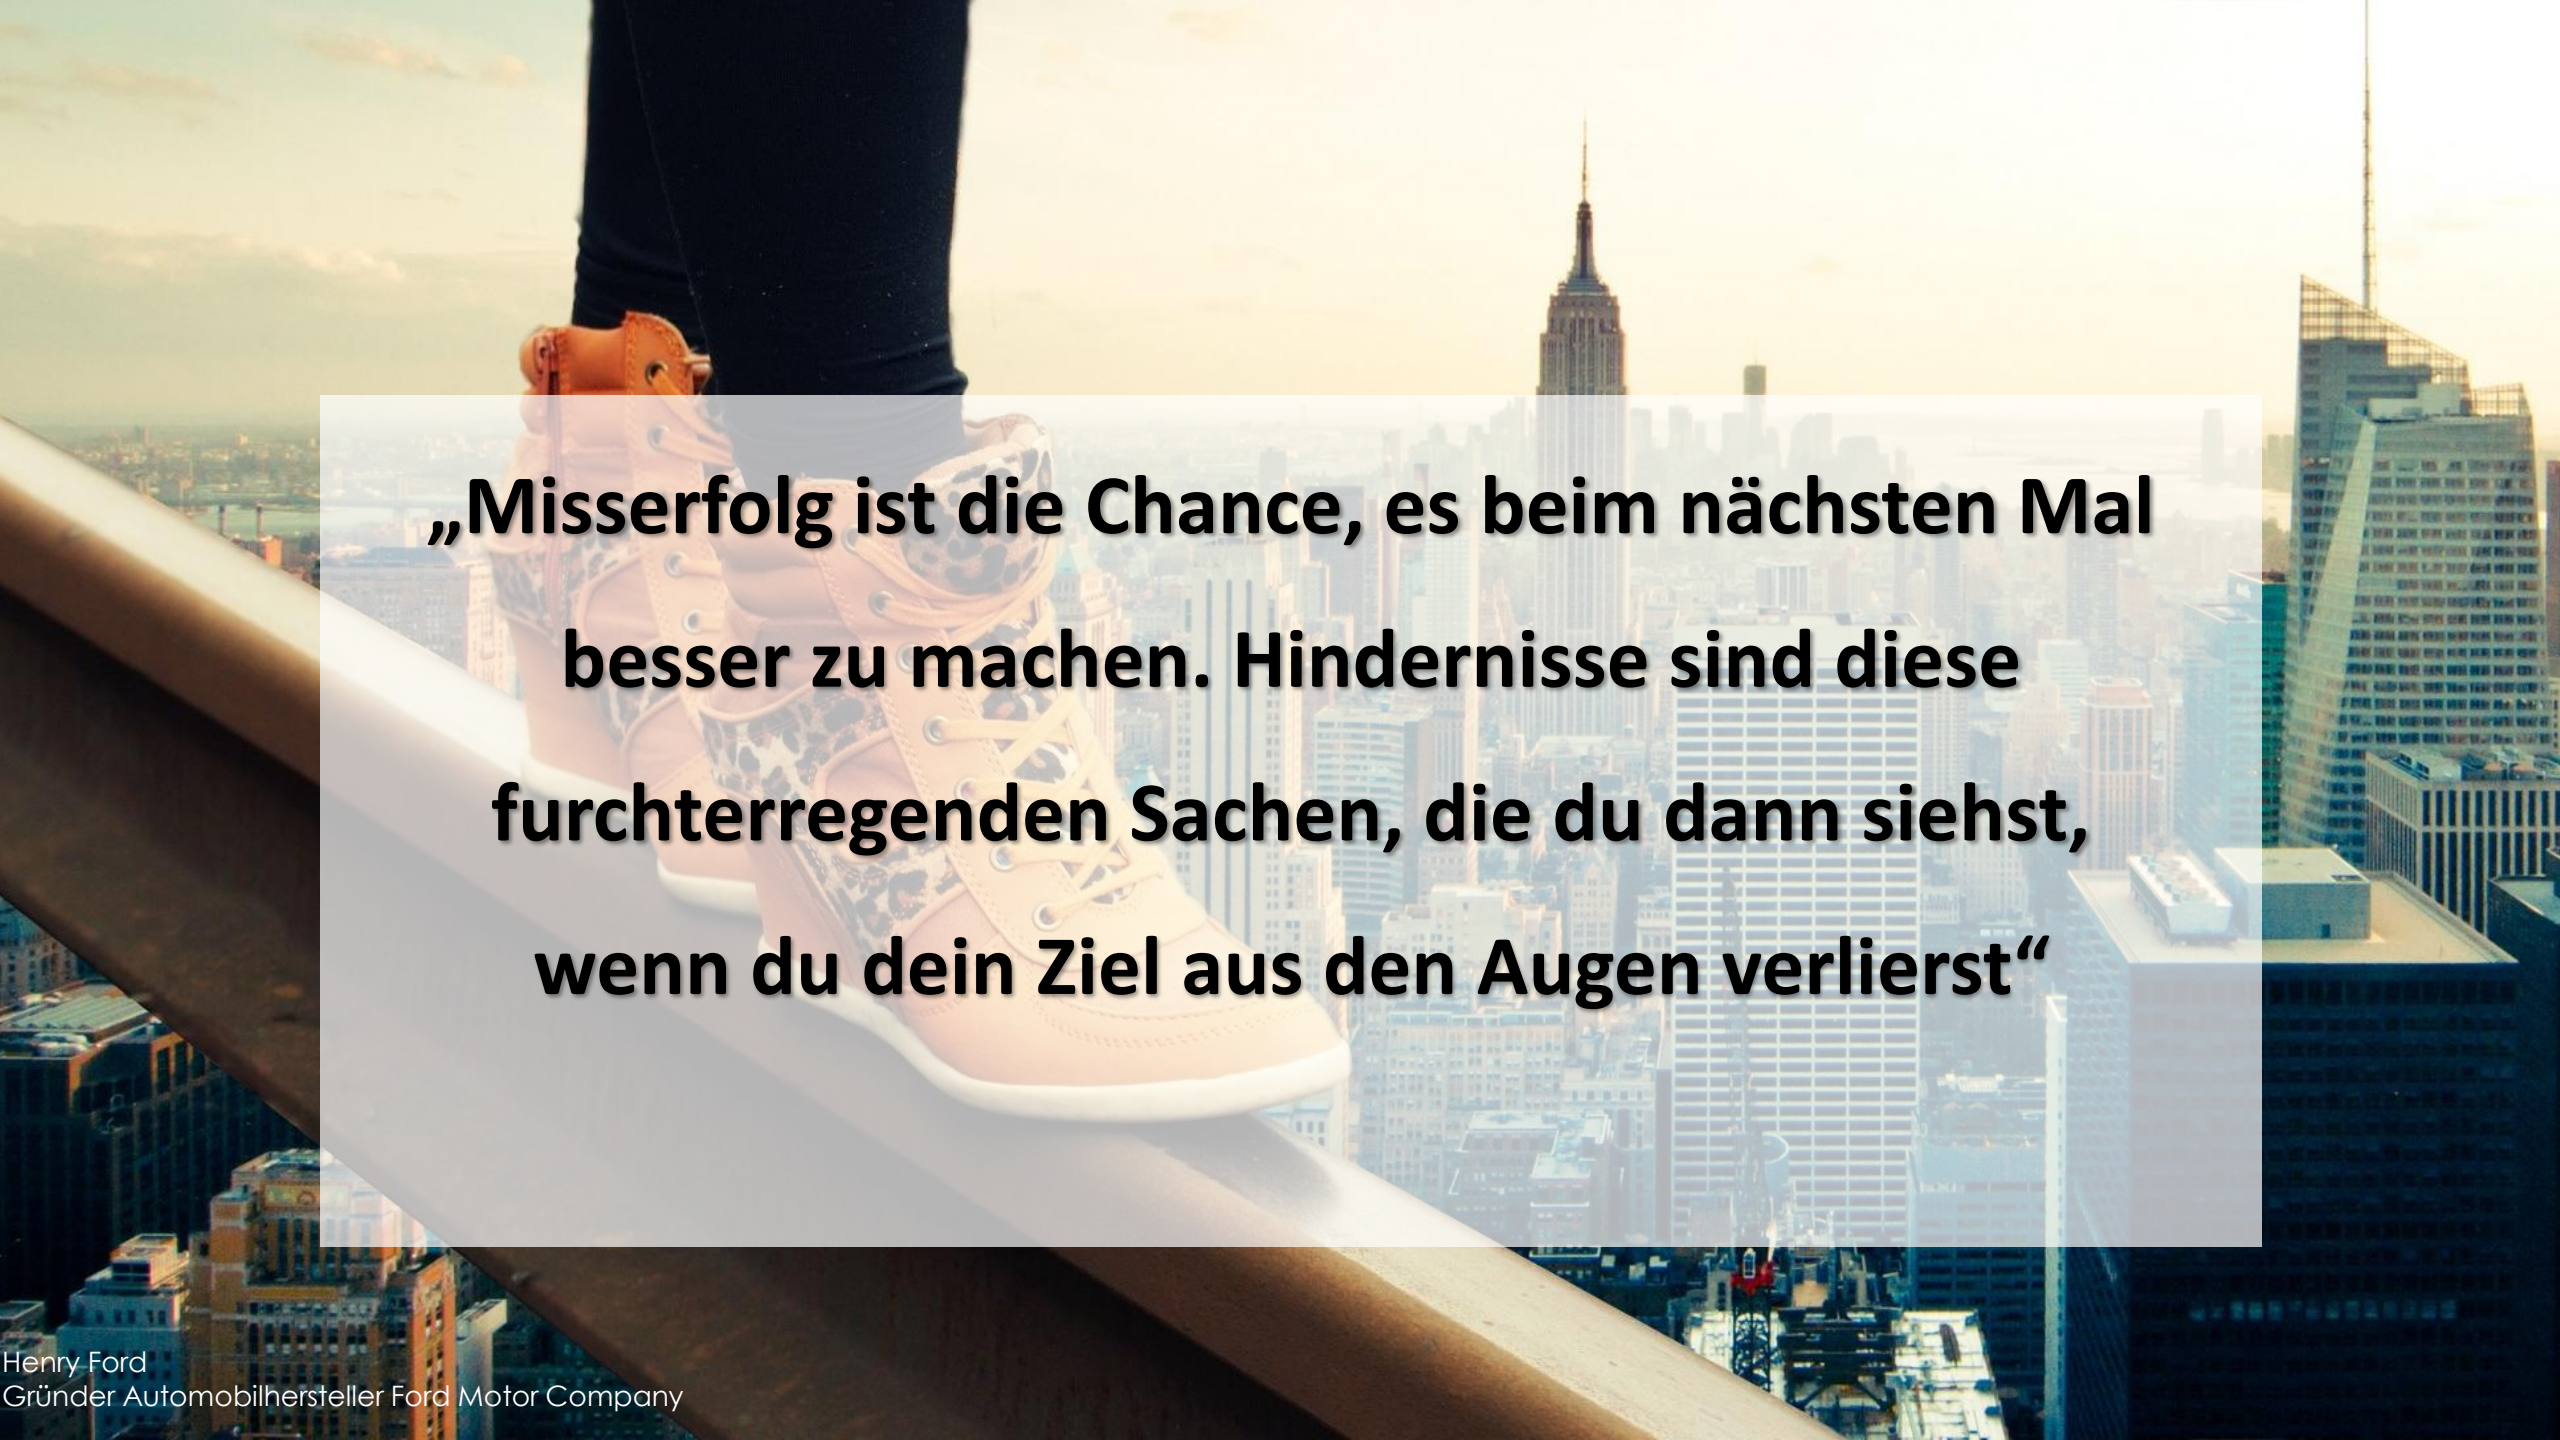

„Misserfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Hindernisse sind diese furchterregenden Sachen, die du dann siehst, wenn du dein Ziel aus den Augen verlierst“




Risiken



Chancen

RISIKOMANAGEMENT

RISIKOANALYSE

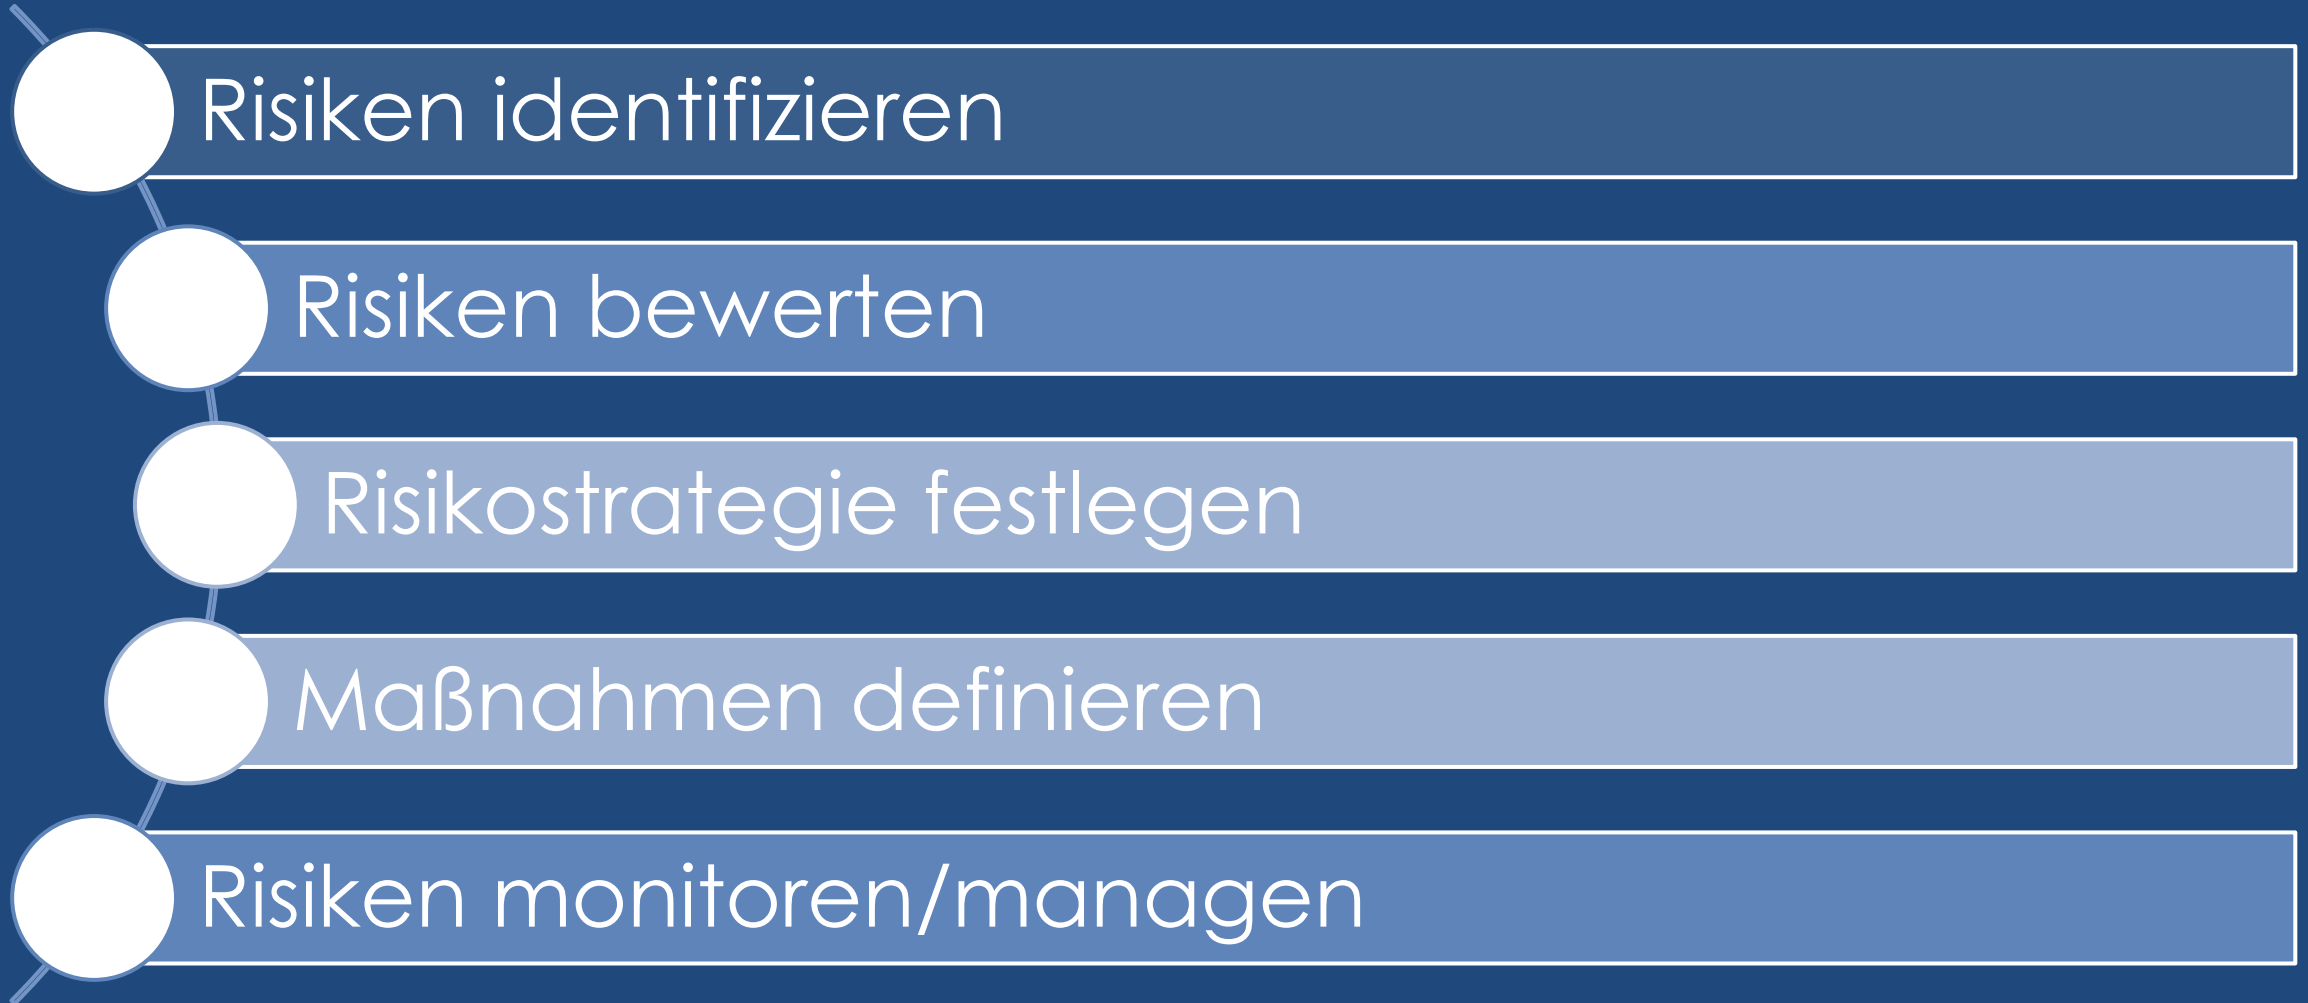


RISIKOANALYSE IN 7 SCHRITTEN




RISIKOANALYSE IN 7 SCHRITTEN




RISIKEN IDENTIFIZIEREN



Was? Wie gefährlich? Bekannt?




Wie gefährlich?



Bekannt?


TYPISCHE QUELLEN FÜR RISIKEN

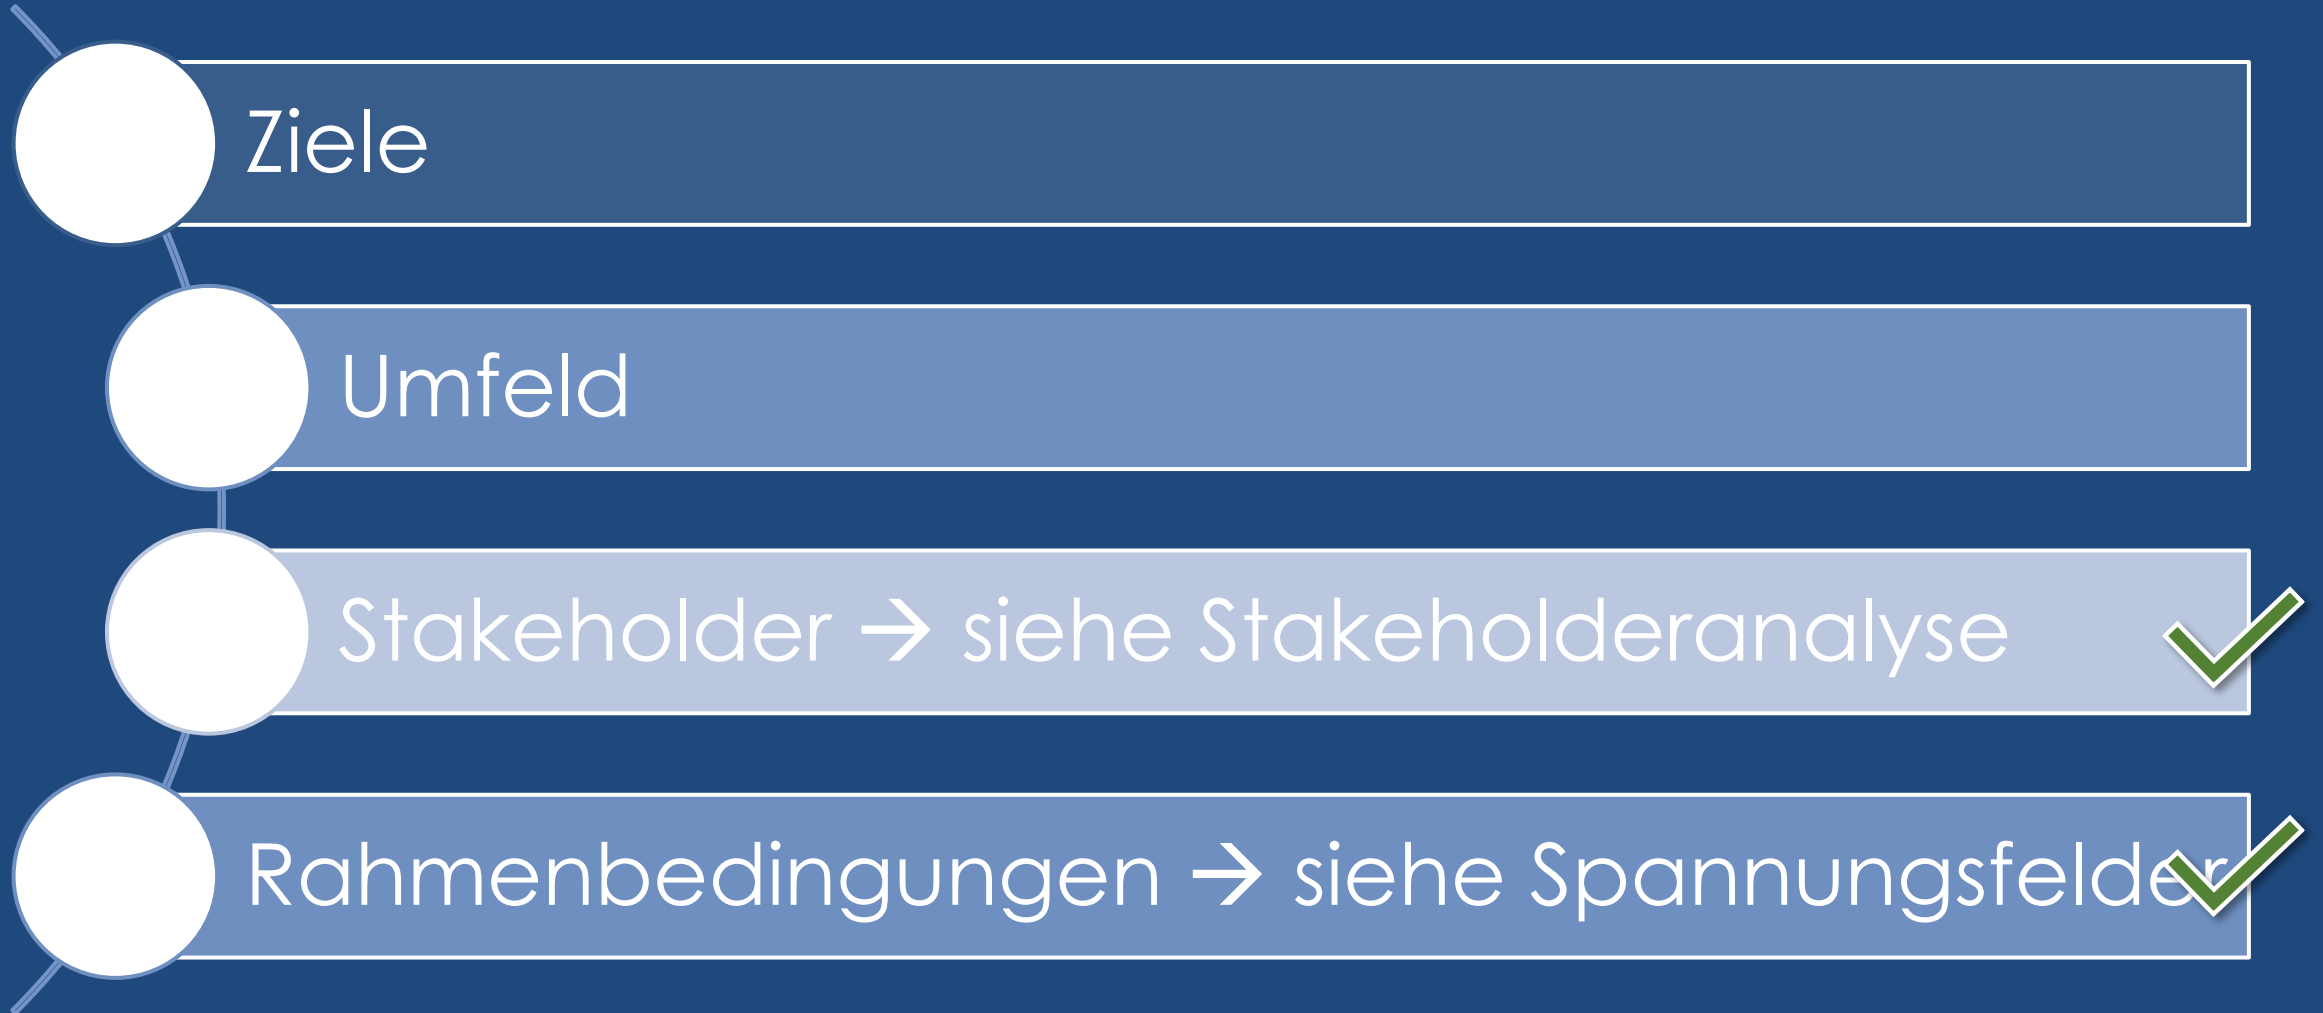

RISIKOQUELLE - ZIELE




RISIKOQUELLE - UMFELD

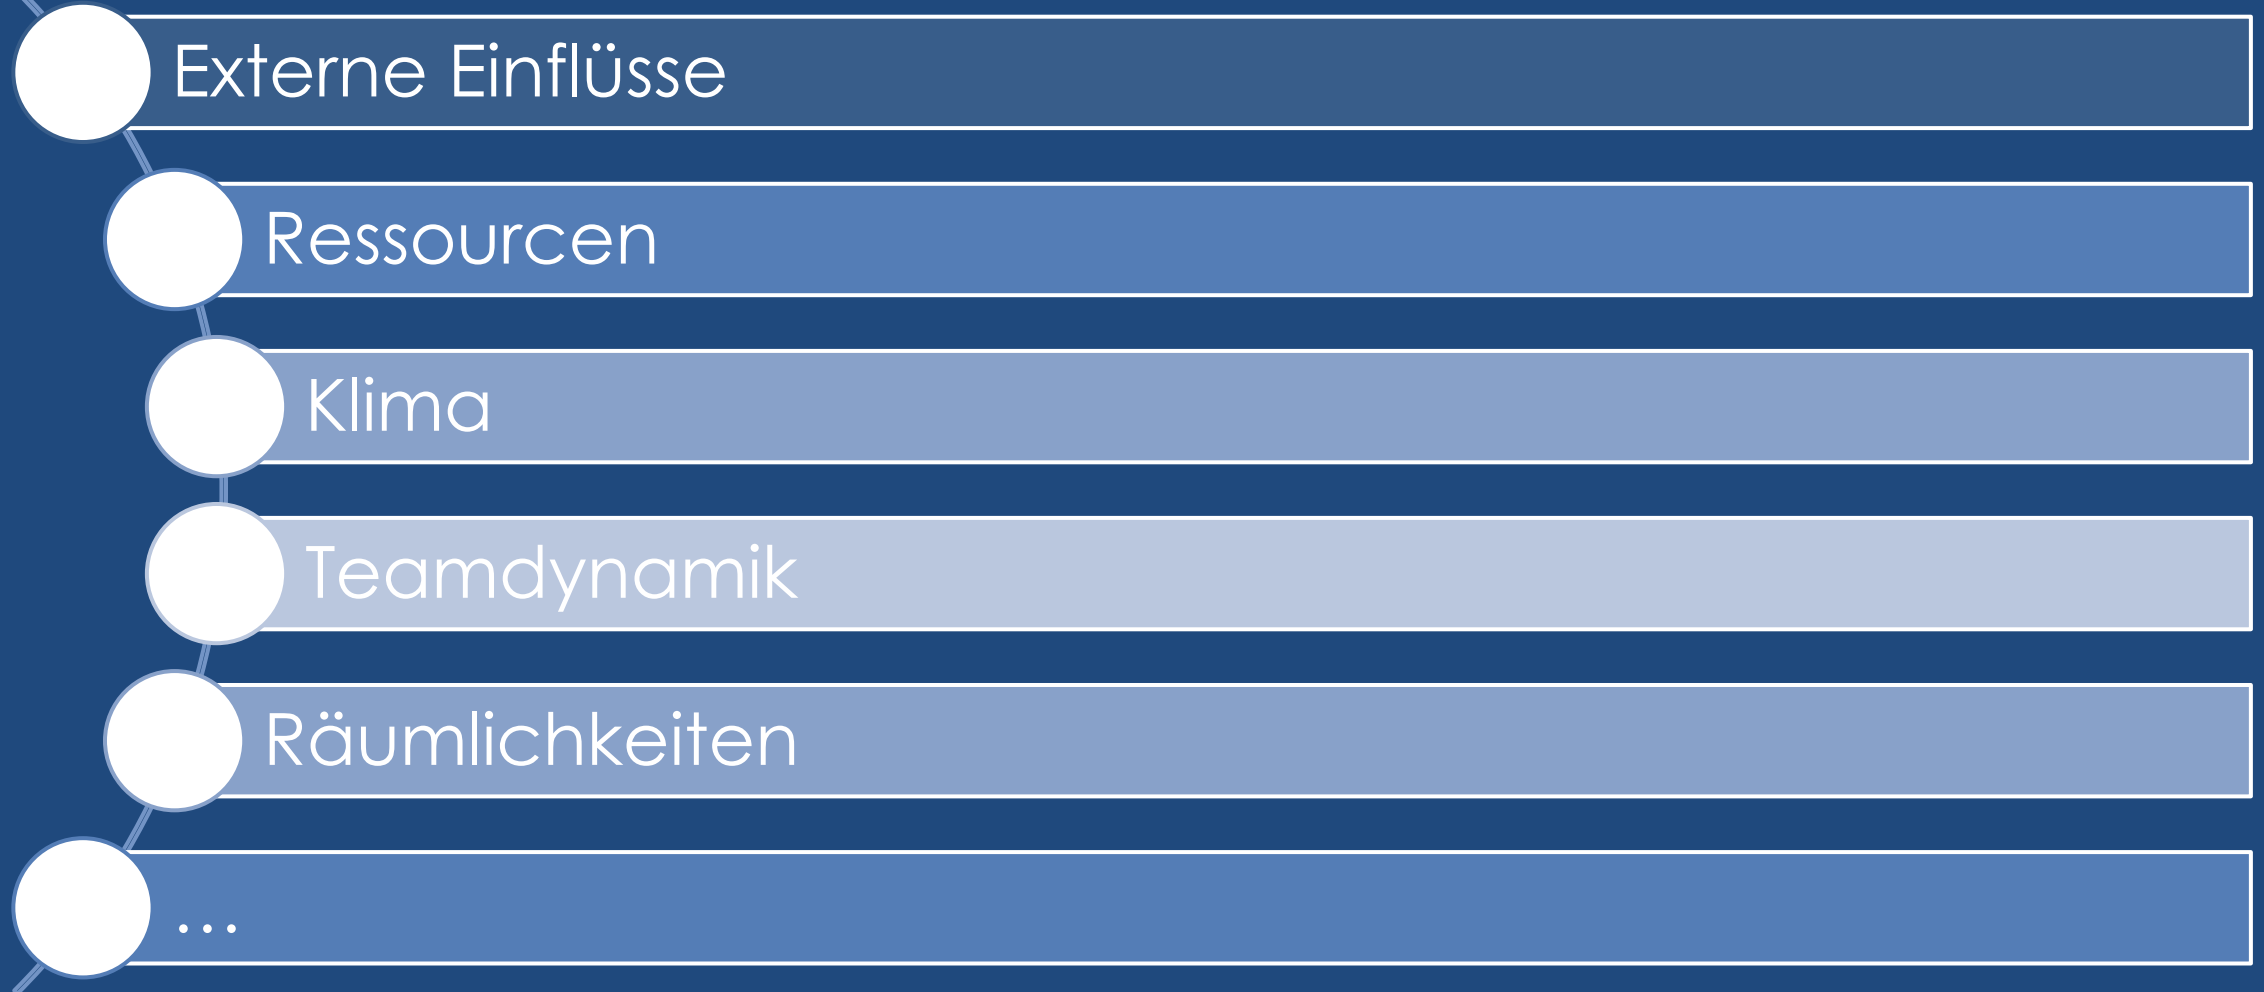


RISIKEN BEWERTEN

- PORTFOLIOANALYSE

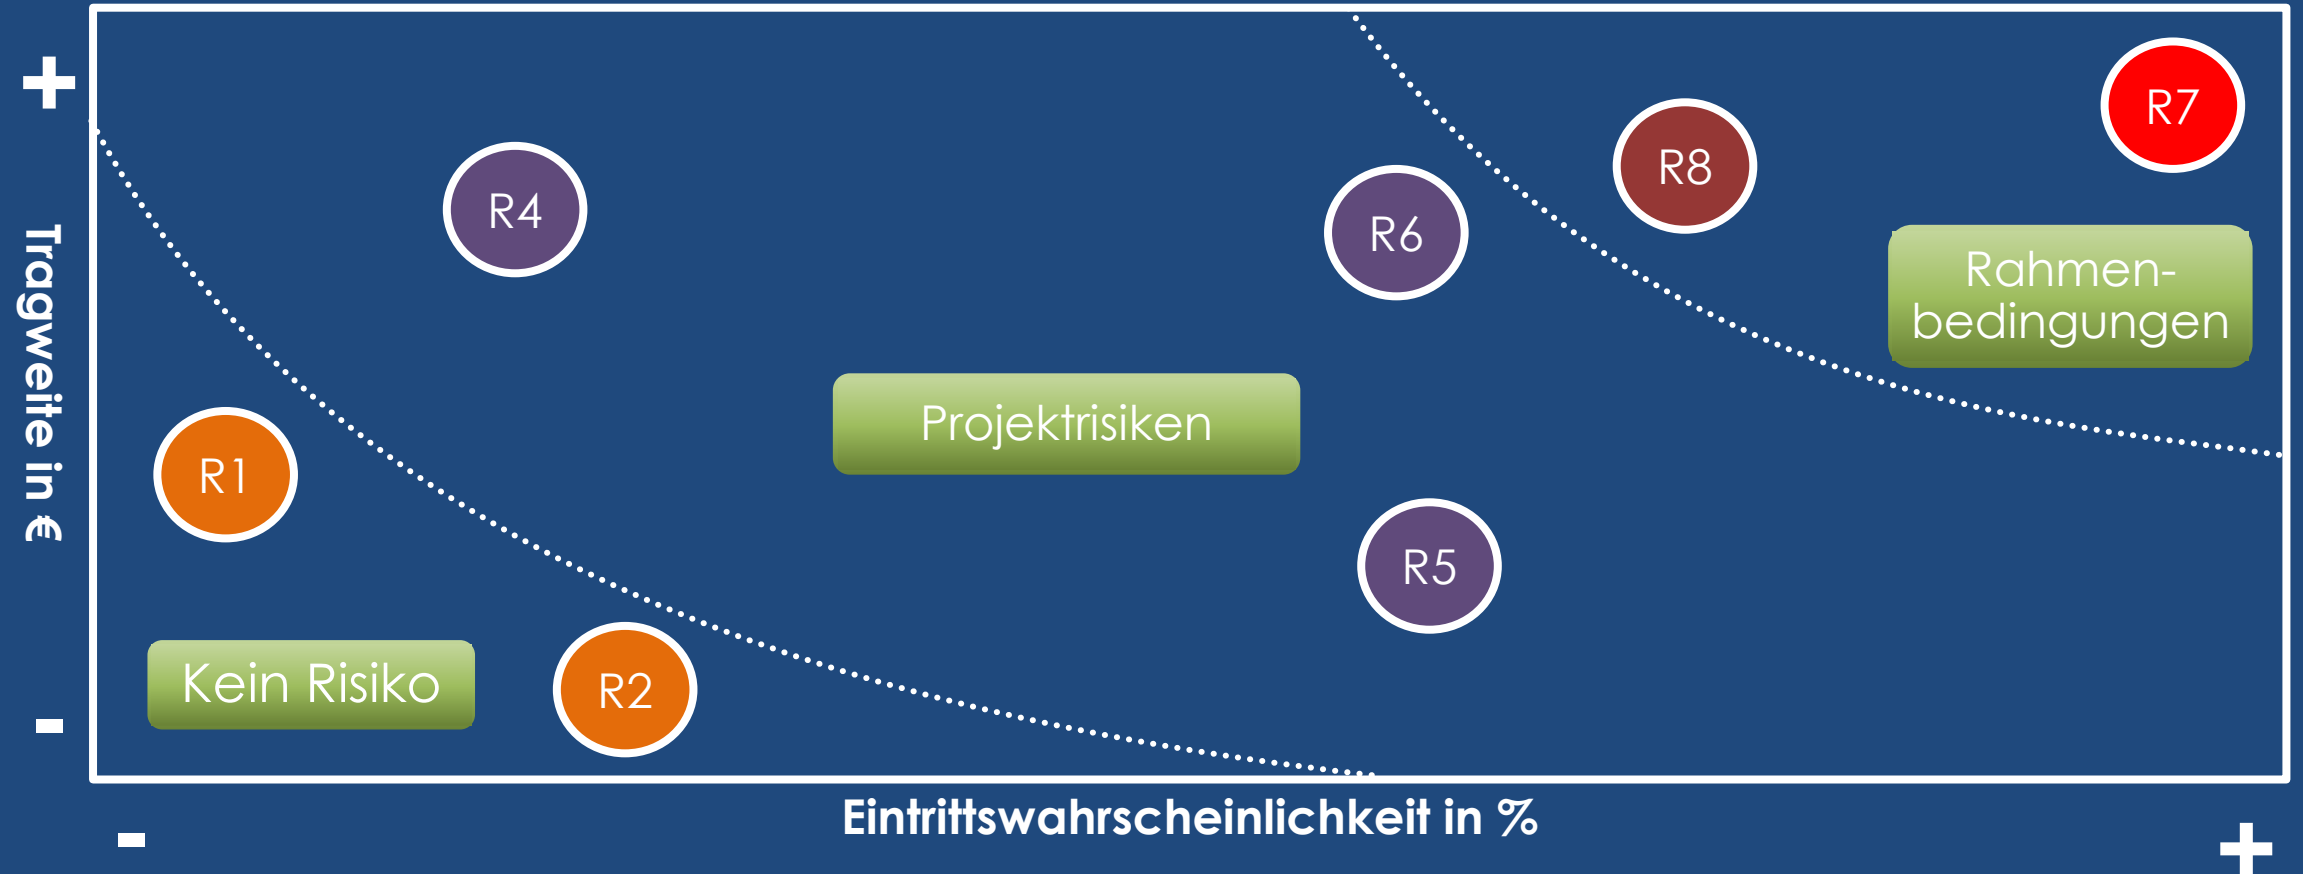


RISIKEN VERFOLGEN

- PORTFOLIOANALYSE

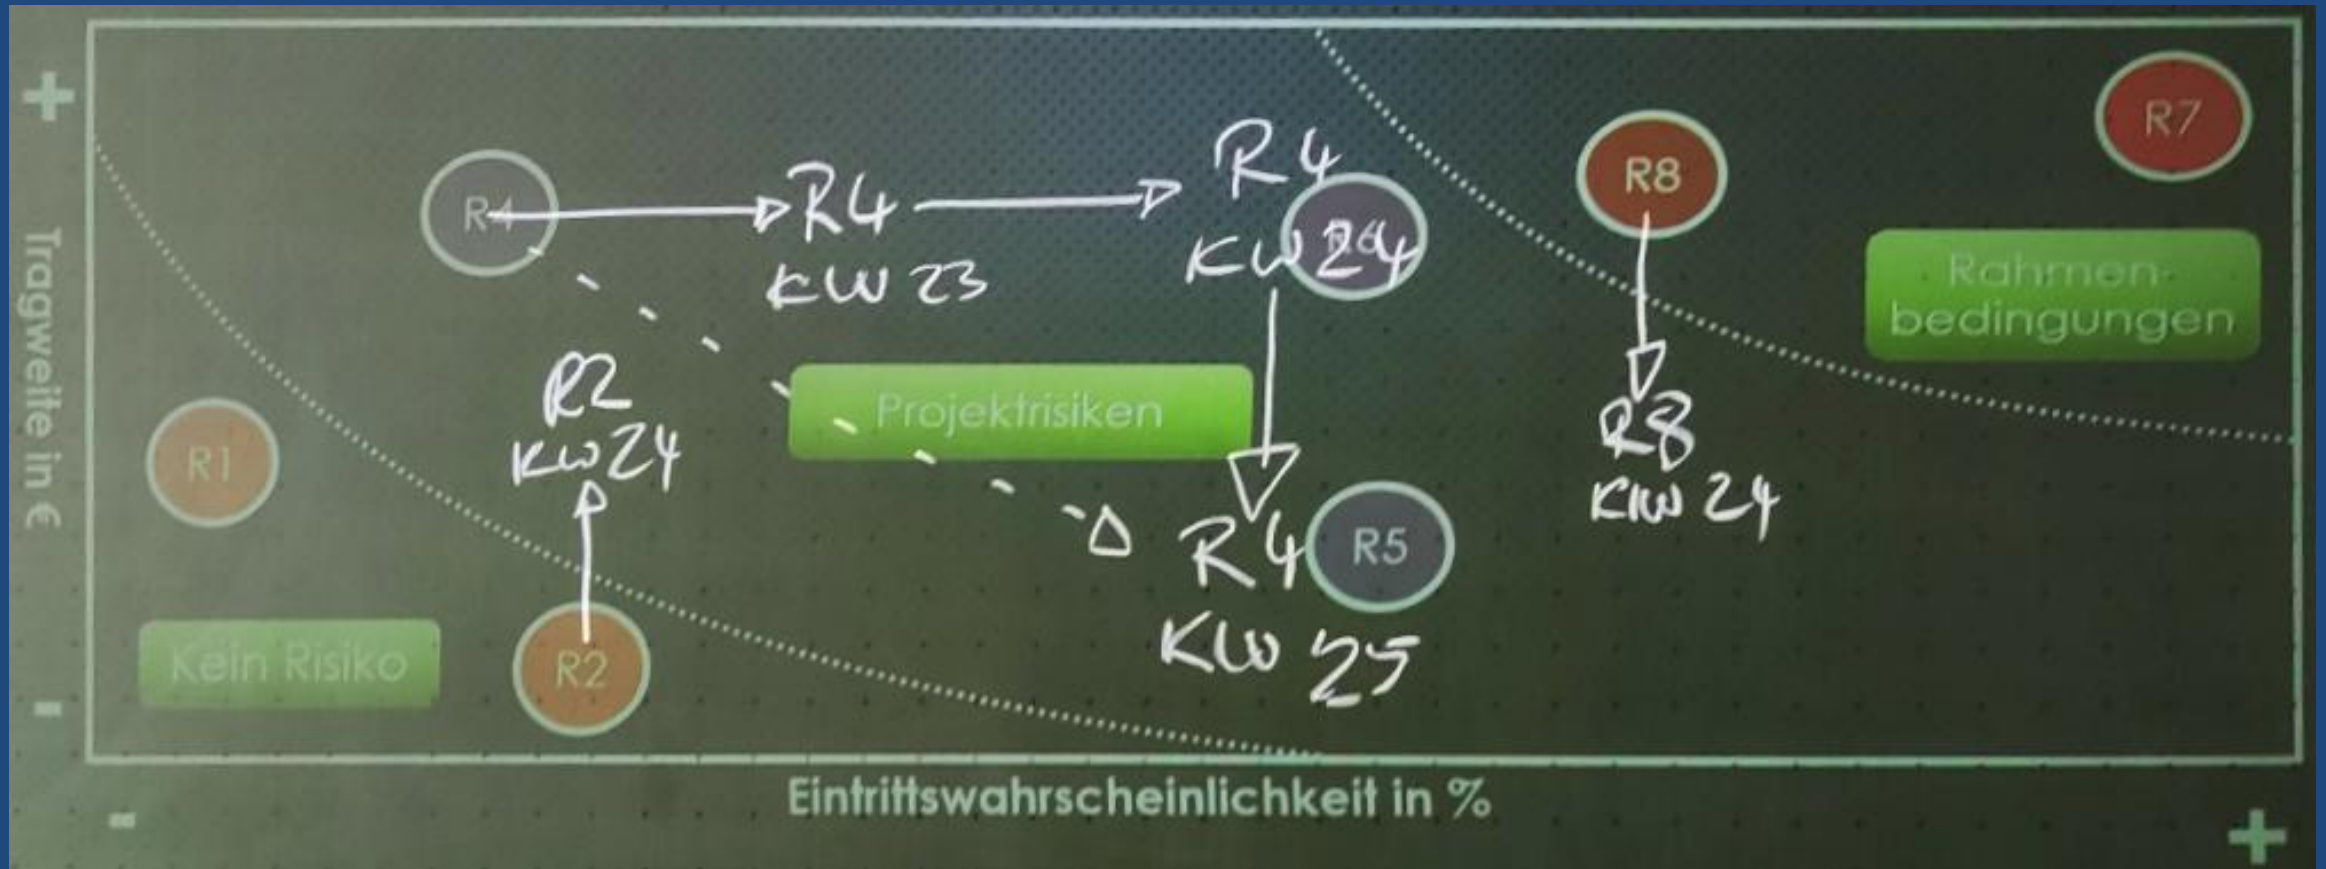


RISIKEN BEWERTEN

- PORTFOLIOANALYSE

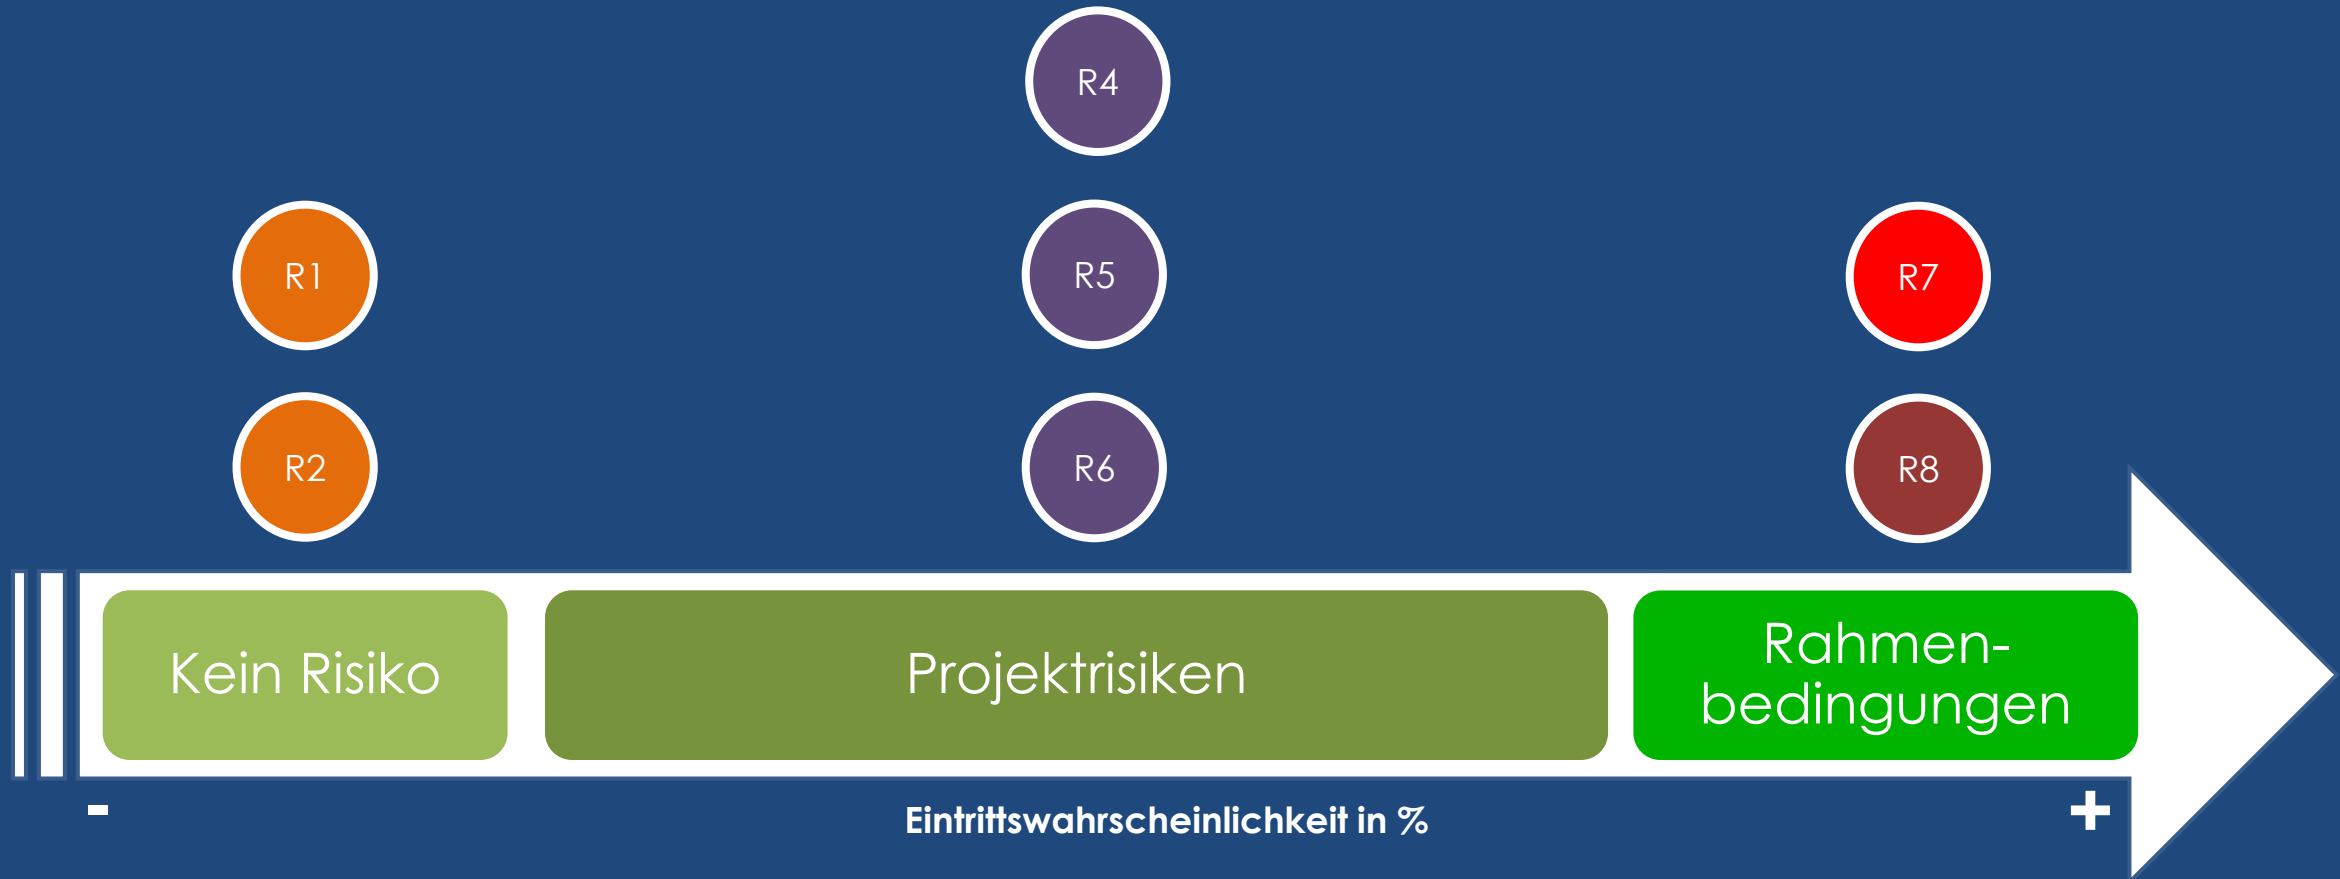

RISIKOANALYSE

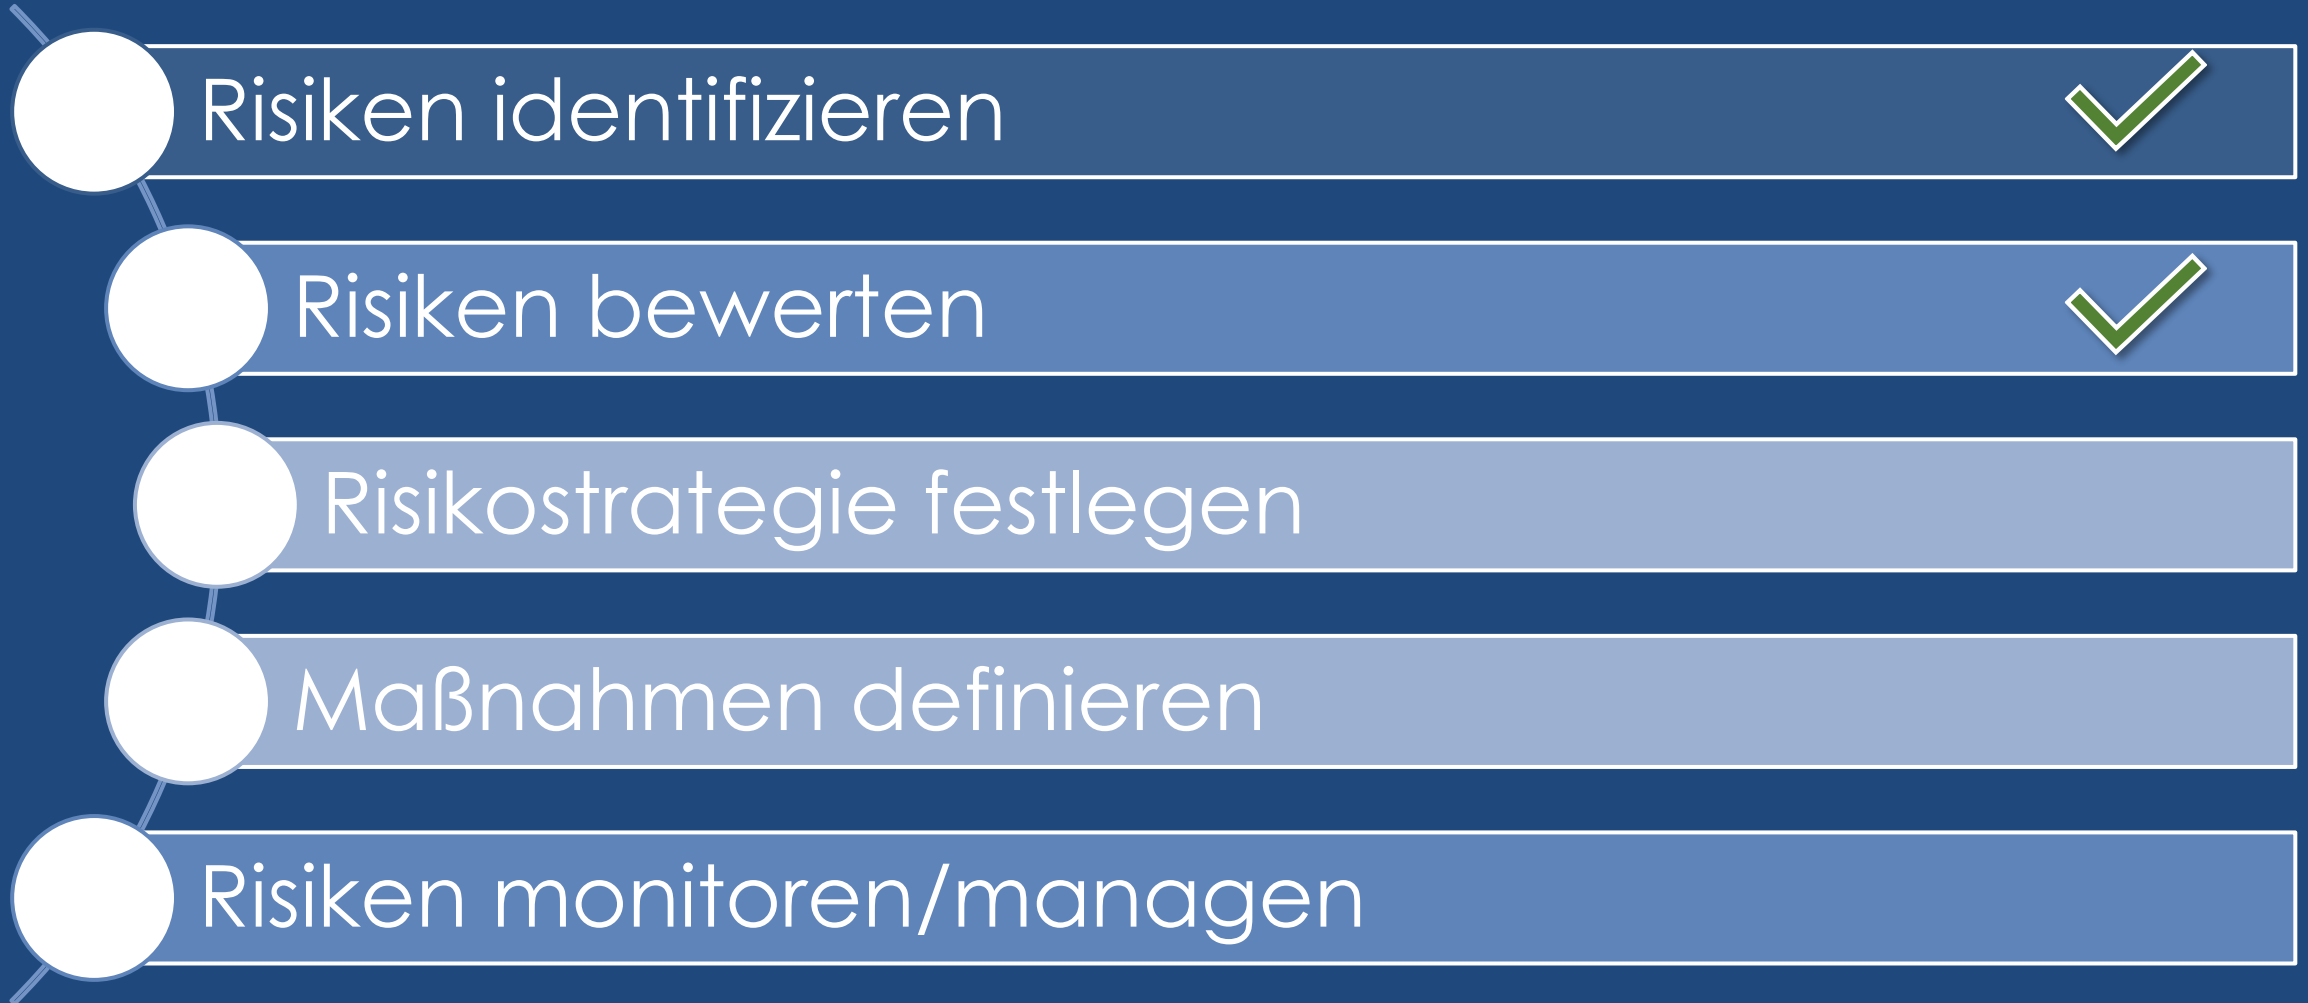

RISIKOSTRATEGIE FESTLEGEN


Vermeiden

Reduzieren


Verlagern

Akzeptieren

RISIKOANALYSE

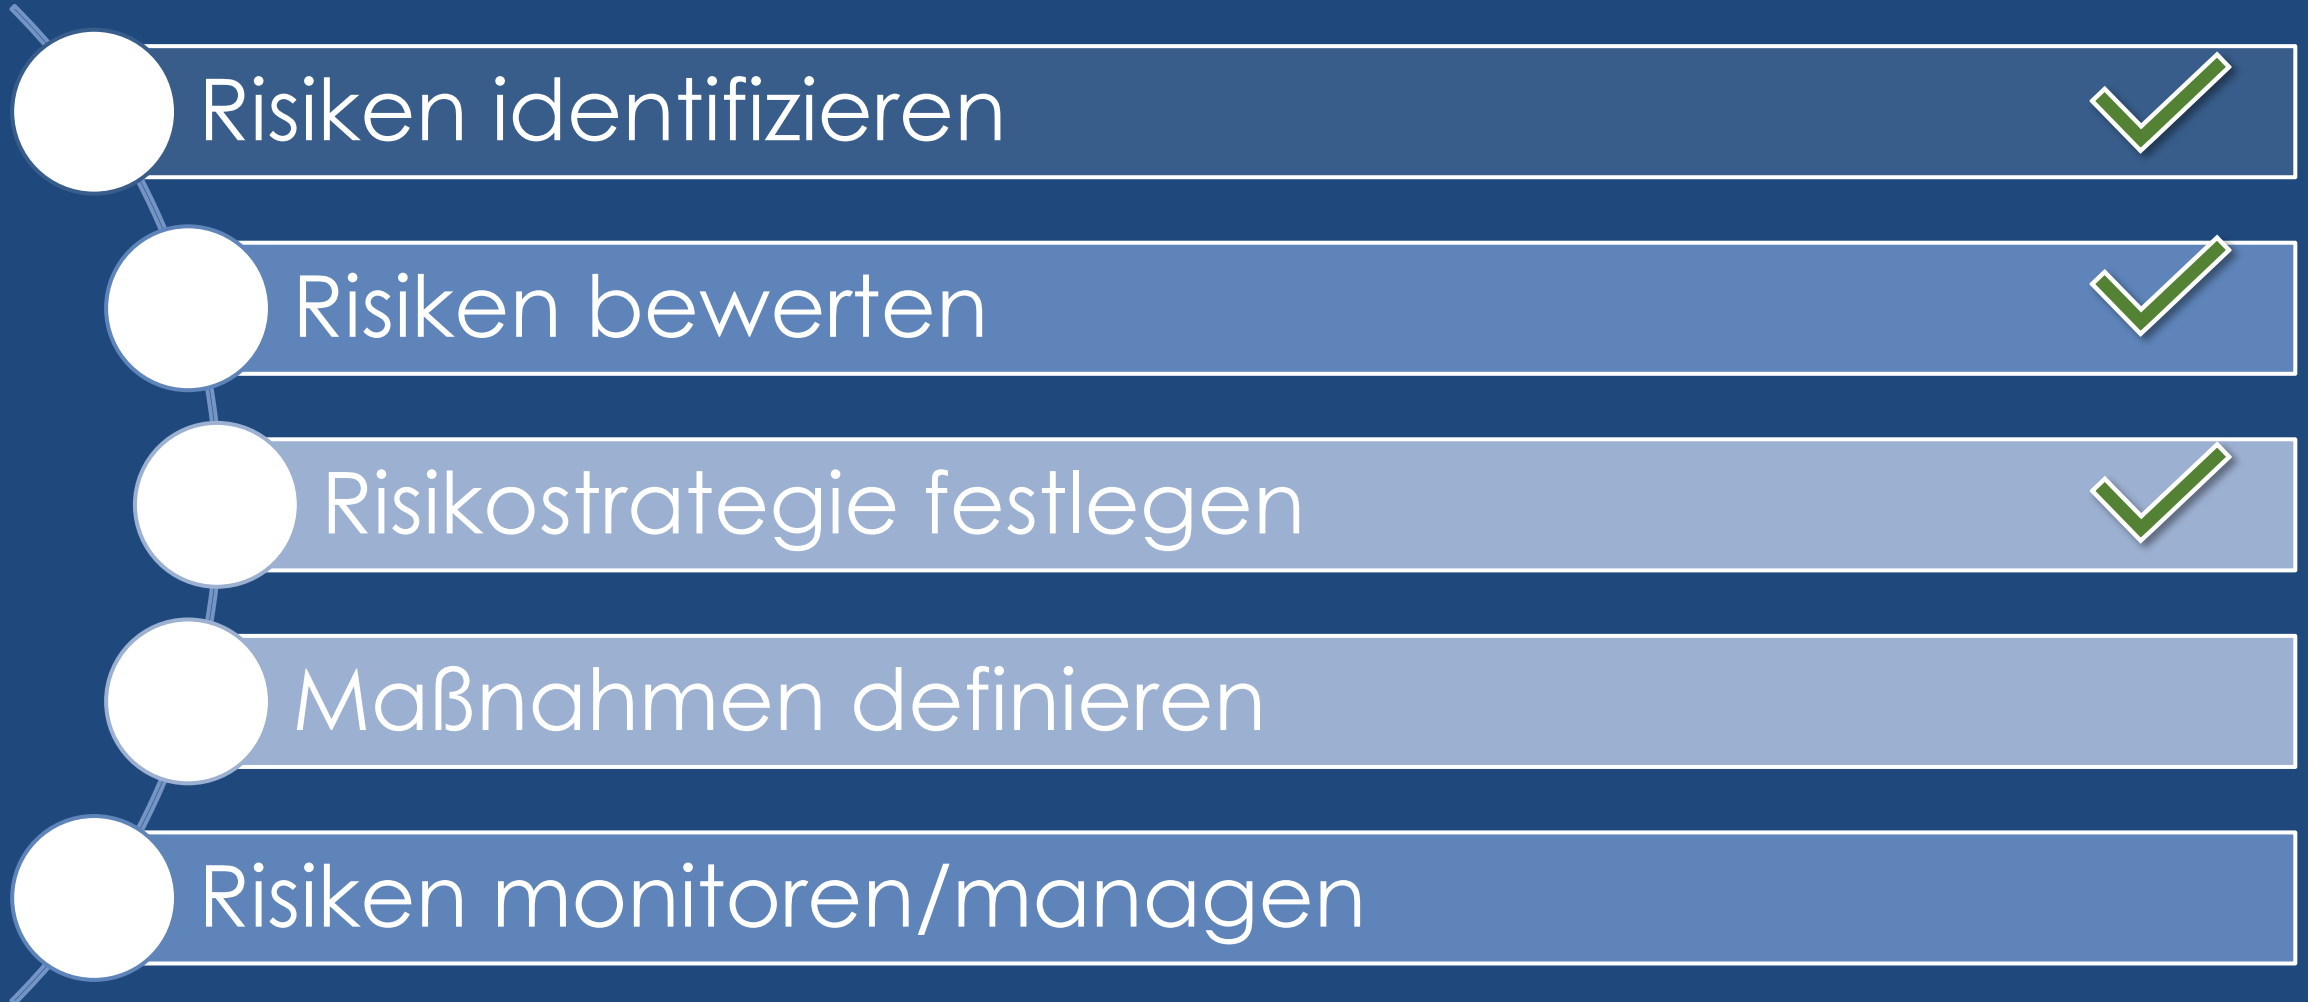

MAßNAHMEN DEFINIEREN

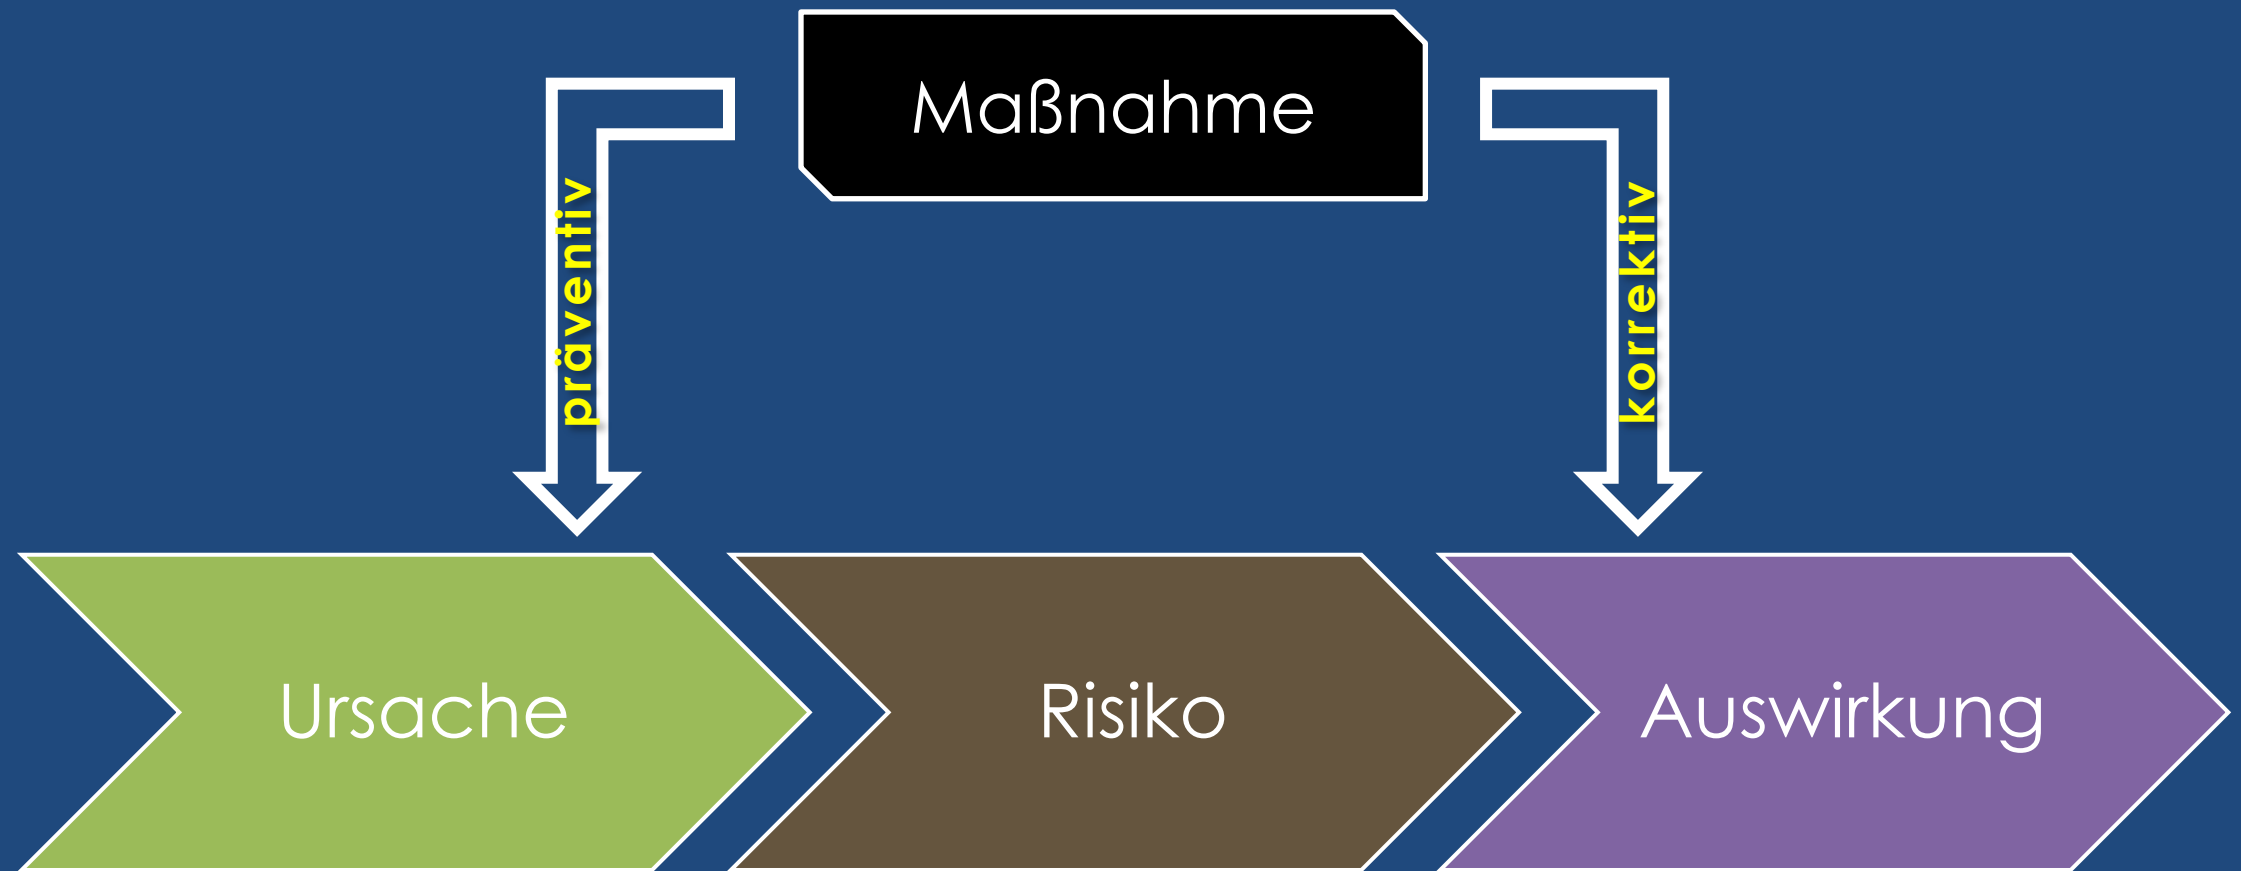

MAßNAHMEN AUSWÄHLEN


präventiv

Maßnahme

- Aufwand
- Kosten
- Wahrscheinlichkeit
- Wirksamkeit
- Muss sich lohnen

korrektiv

RISIKOANALYSE

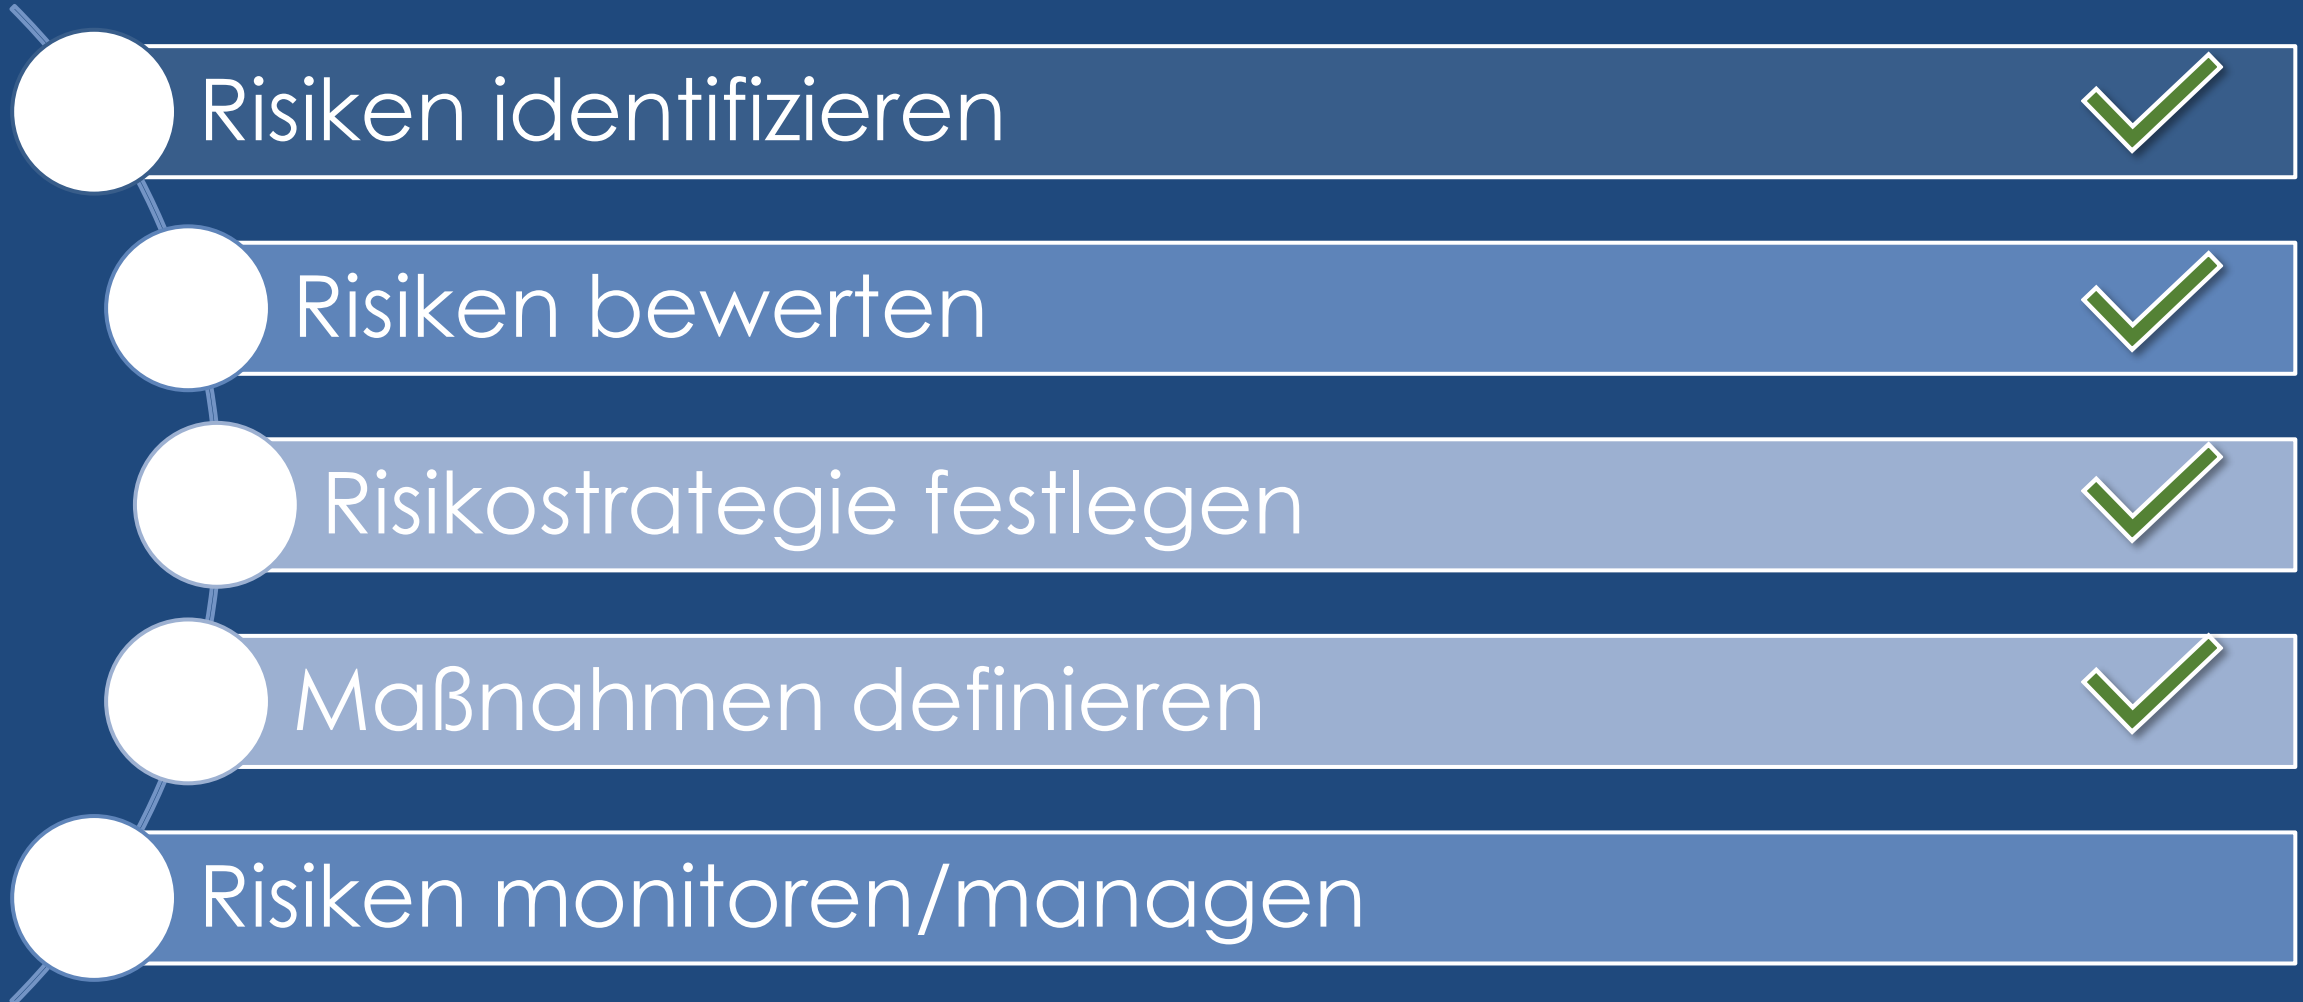

RISIKEN MONITOREN/MANAGEN



- RAHMENBEDINGUNGEN ÄNDERN SICH STETIG
- EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN ÄNDERN SICH
- MAßNAHMEN MÜSSEN ÜBERWACHT UND JUSTIERT WERDEN
- AUSWIRKUNGEN MÜSSEN ÜBERWACHT WERDEN

Ü03 – ÜBUNG – RISIKOMATRIX

RAHMENBEDINGUNGEN

- DU BIST PAUL PLANER UND BEREITEST DAS CRM PROJEKT VOR
- FOLGENDE RAHMENBEDINGUNGEN HABEN SICH AUS DEN ANGEBOTEN UND VERTRAGSVERHANDLUNGEN ERGEBEN:
 - DIE KOSTEN JE PROJEKSTUNDE FÜR DIE PARTNER BELAUFEN SICH AUF 1.500,-- EUR / TAG (8 STUNDEN)
 - DIE REISEKOSTEN JE PERSON BELAUFEN SICH IM INLAND AUF 800 EUR JE REISE UND FÜR DAS AUSLAND AUF 2.000 EUR JE REISE.
 - DAS INITIALE TEILPROJEKT WIRD NACH 9 MONATEN IN BETRIEB GENOMMEN, JEDES WEITERE LAND SOLL NACH WEITEREN 6 MONATEN PRODUKTIV GEHEN.
 - DER GESAMTAUFWAND FÜR DIE ZENTRALE BETRÄGT VORAUSSICHTLICH 750 TAGE, JE WEITERES LAND ETWA 450 TAGE.

AUFGABE

- ERSTELLE EINE RISIKOANALYSE FÜR DAS PROJEKT UND DIE STAKEHOLDER – 3 RISIKEN BASIEREND DARAUF
- DEFINIERE MAßNAHMEN FÜR DAS MANAGEMENT DER RISIKEN
- SCHÄTZE AUSWIRKUNGEN UND KOSTEN UND TREFFE EINE ENTSCHEIDUNG
- ERSTELLE EINE ENTSPRECHENDE RISIKOMATRIX

Ü03 - ÜBUNG – RISIKOMATRIX

Nr	Risiko	Beschreibung	Verantwo	Stakeholder	Kosten	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahmen
1	Wetter	Schlechtes Wetter, Sturm und Regen	Ich selbst		50.000,00 €	Verzögerungen und Mehraufwände durch entsprechende	60%	Kleidung bereitstellen, Plane spannen, Zeit verschieben,
2	Verzögerungen	Verzögerungen auf Grund von sich änderen Anforderungen	Ich selbst	Ich selbst und Geschäftsführer	500.000,00 €	Mehraufwände durch entsprechende Verschiebungen	40%	Auswahlverfahren, gute Verpackung, Präventive Abstimmung
3	Moving Target	Änderungen an der Zielsetzung	Fachabteilungen	Abteilungsleiter	250.000,00 €	Mehraufwände durch neue Anforderungen	30%	Die Abteilungsleiter müssen auf die Key-User einwirken und Entscheidungen treffen. Regelmäßige Meetings zur Abstimmung.
4	Inflation	Gesamtaufwand und Kosten können sich erhöhen	Einkauf	CFO	1.023.750,00 €	7% Inflation bedeuten erhebliche Mehrkosten	60%	Der Einkauf soll in den Verträgen eine Kostenbremse einbauen und Inflationserhöhungen

CHANCEN WIE RISIKEN



Chancen analysieren

Chancen bewerten

Wünsche, Träume, Fantasien

Chancen realistisch kommunizieren

Auf Chancen vorbereiten sein




Chancen



Risiken

CHANCEN

WICHTIGES IM RISIKOMANAGEMENT

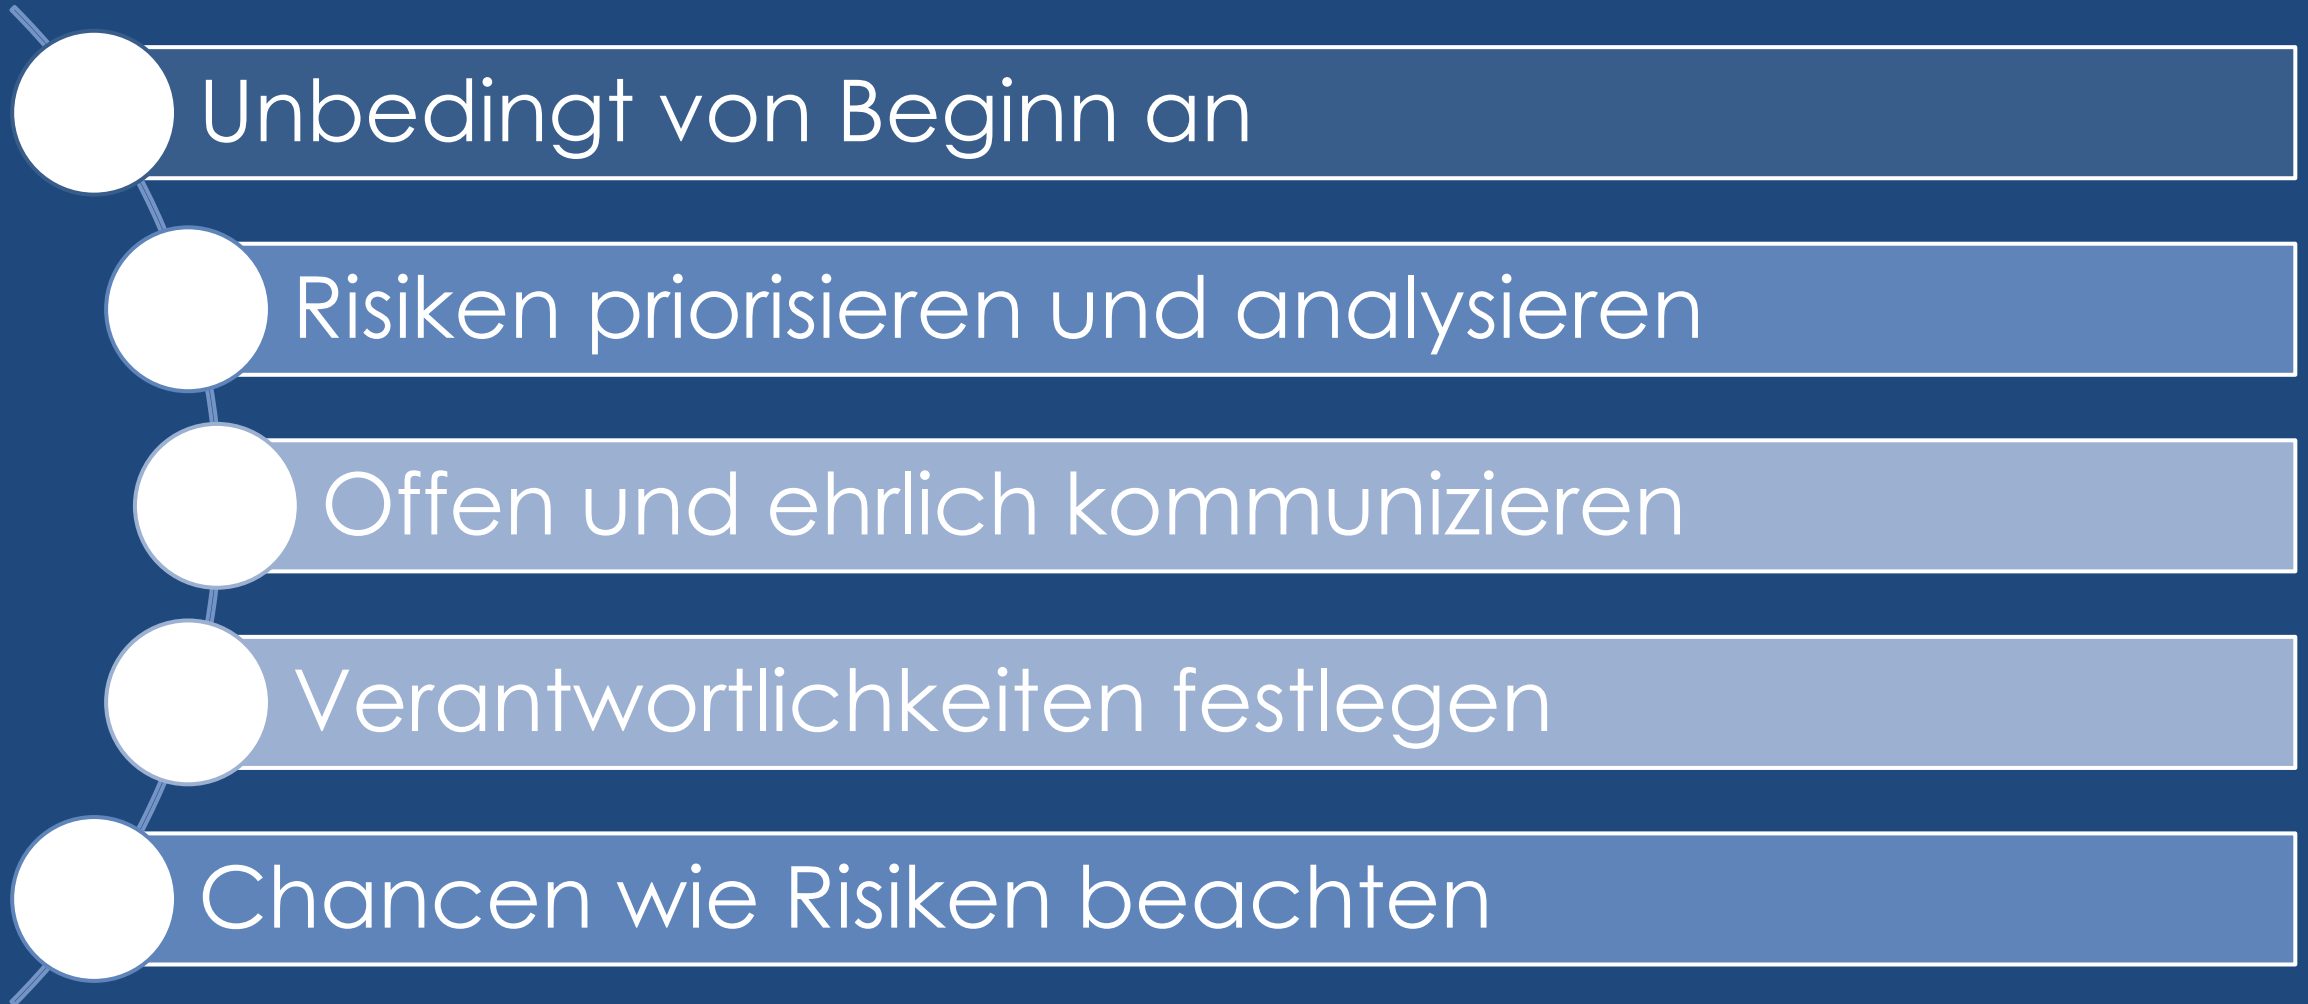

RISIKOMANAGEMENT IN DER PRAXIS

- EINFACHE EXCELLISTE
- IMMER AUF DEM AKTUELLEN STAND HALTEN
- RISIKEN REGELMÄßIG NEU BEWERTEN

Automatisches Speichern 202001-Vorlage Risikomanagement.xlsx - Gespeichert Suchen Jörg Klumpp

Datei **Start** Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe

Einfügen Ausschneiden Kopieren Format übertragen Zwischenablage

Schriftart Calibri 11 A A F K U Textumbruch Ausrichtung Verbinden und zentrieren

Zahl Standard Bedingte Formatierung Als Tabelle formatieren Standard Gut Neutral Schlecht

Zellen Einfügen Löschen Format AutoSumme Ausfüllen Löschen Sortieren und Filtern Suchen und Auswählen Ideen

I22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Risiko Management								
2										
3	Ni	Risiko	Beschreibung	Verantwortlich	Stakeholder	Kosten	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahmen	Protokoll
4	1	Personal	Personalausfall durch Krankheit, Belastung,...	Projektleiter	Geschäftsleitung	-	Verzögerung der Arbeitspakete	10%	Überlastung verhindern, Teammotivation steigern	
5	2	Hardware Arbeitsplatz	Ausfall der Arbeitsplatzcomputer	IT Mitarbeiter	IT Leiter	2.000,00 €	Verzögerung von Arbeitspaketen und Verlust von Arbeitsergebnissen	10%	Gerätestrategie festlegen, Ersatzgeräte vorhalten, Backup einrichten und testen	- Geräte auswahl festgelegt (01.01.2020) - Backupsoftware eingerichtet und getestet - Ersatzgeräte bestellt
6	3									
7	4									
8	5									

CONTROLLING


VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

„Worin liegt die eigentliche Rolle des
Managements? Im intelligenten
Reagieren auf Veränderungen.“




CONTROLLING DER SPANNUNGSFELDER

TEUFELSQUADRAT

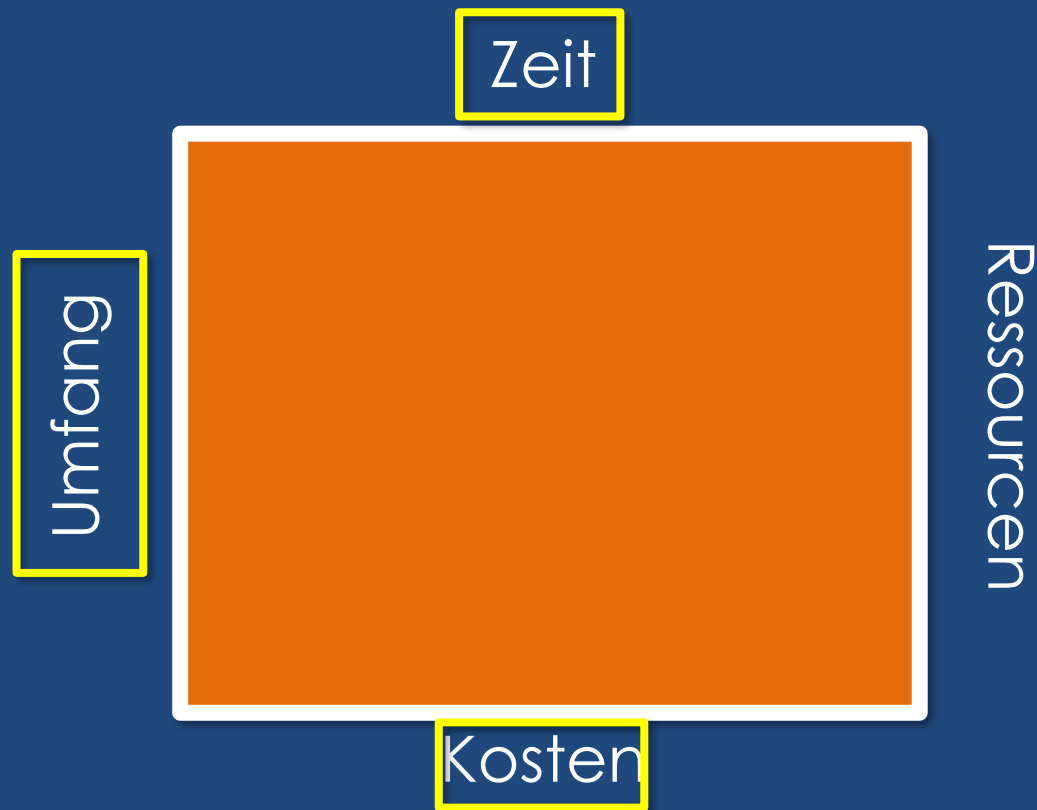


SPANNUNGSFELDER

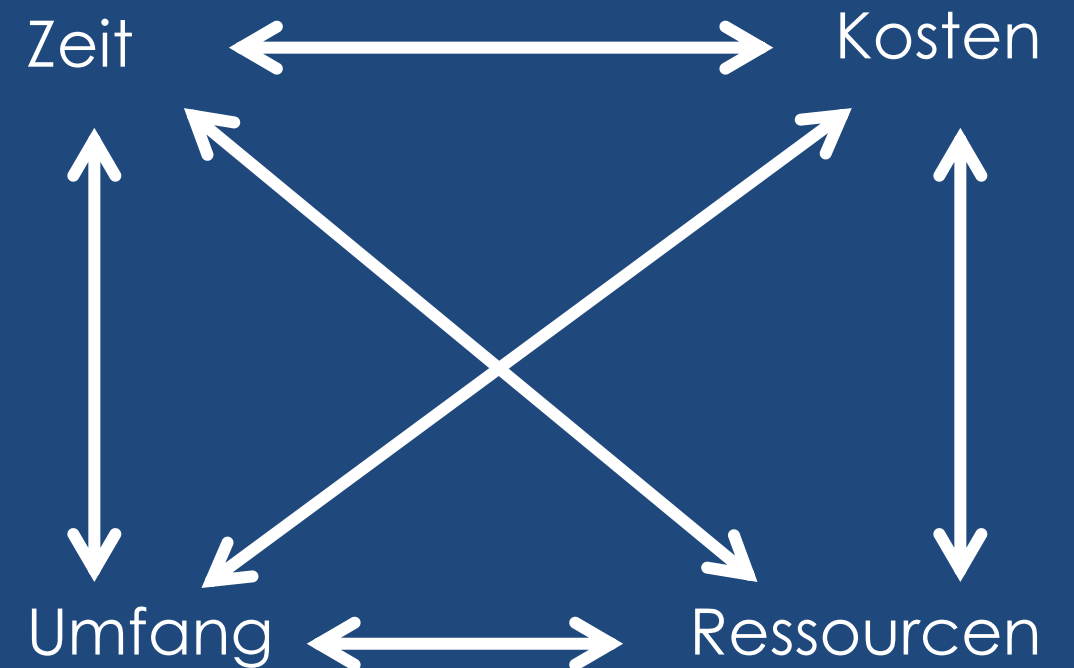

CONTROLLING DER SPANNUNGSFELDER


TEUFELSQUADRAT

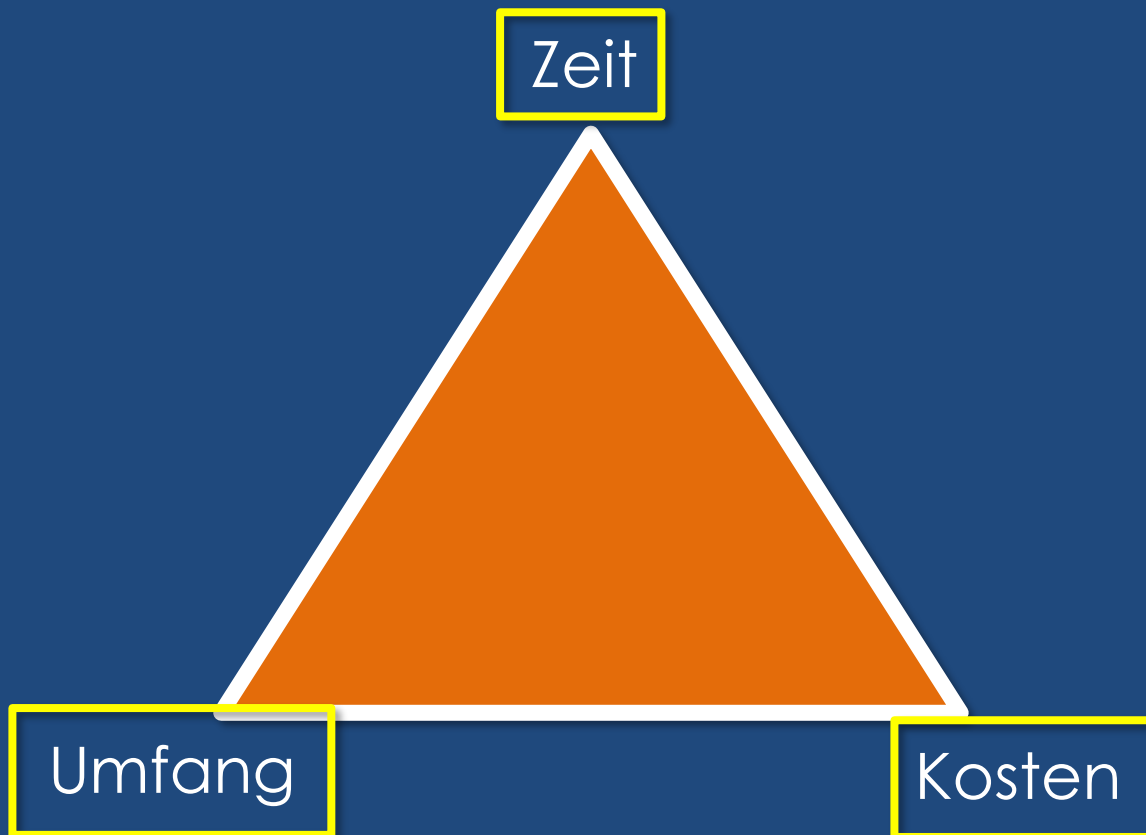

CONTROLLING

- UMFANG ↔ ZEIT
- ZEIT ↔ KOSTEN
- UMFANG ↔ KOSTEN


CONTROLLING-REGELKREIS

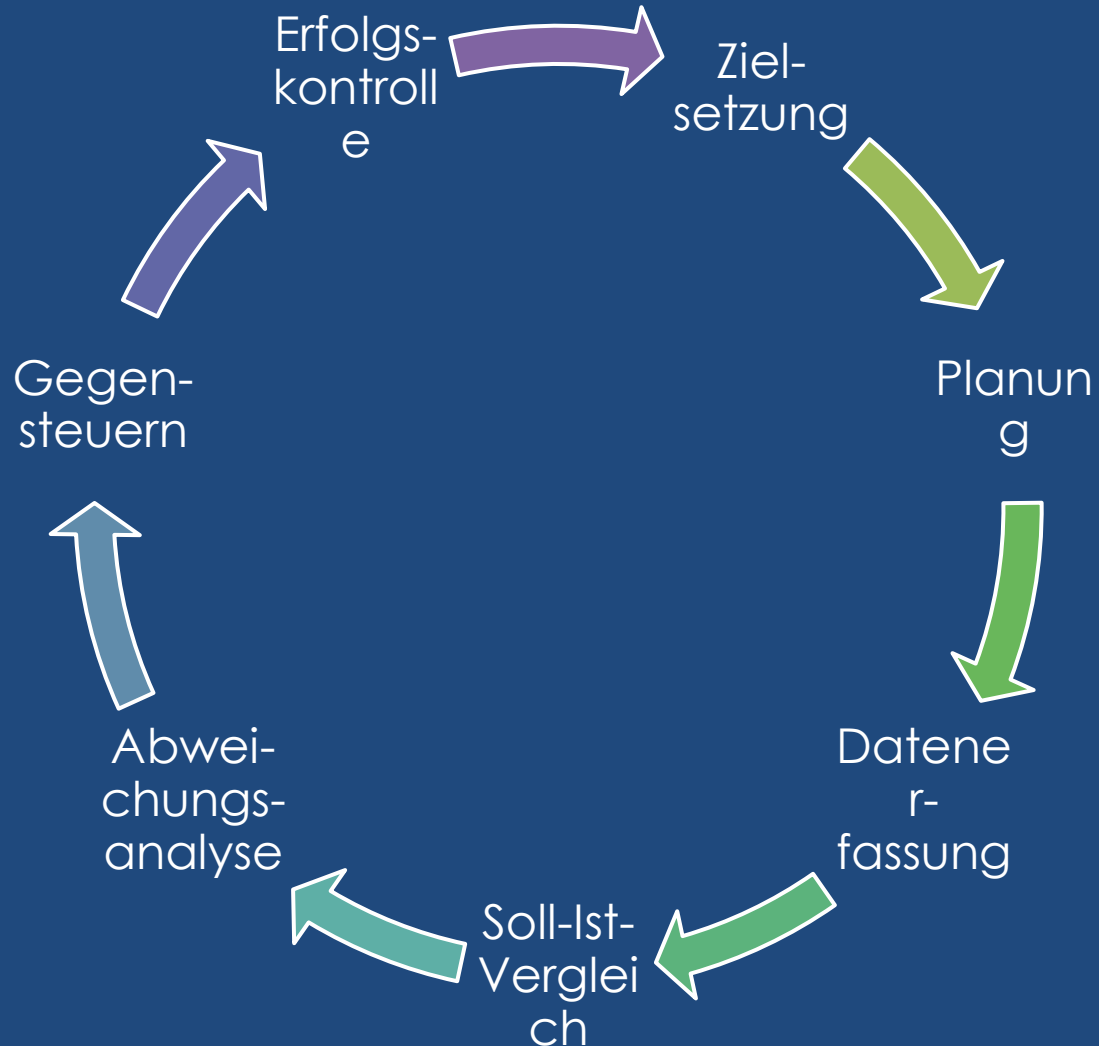

WICHTIGE FRAGEN:

- HAT SICH DAS ZIEL VERÄNDERT?
- STIMMT DIE PLANUNG?
- BESITZE ICH ALLE DATEN UND WANN WURDEN DIESE ERFASST?
- BIN ICH NOCH IM SOLL?
- WO WEICHT DER PLAN AB?
- WIE / MUSS ICH GEGENSTEUERN?
- SIND MEINE MAßNAHMEN ERFOLGREICH?


ERMITTLUNG PROJEKTKOSTEN

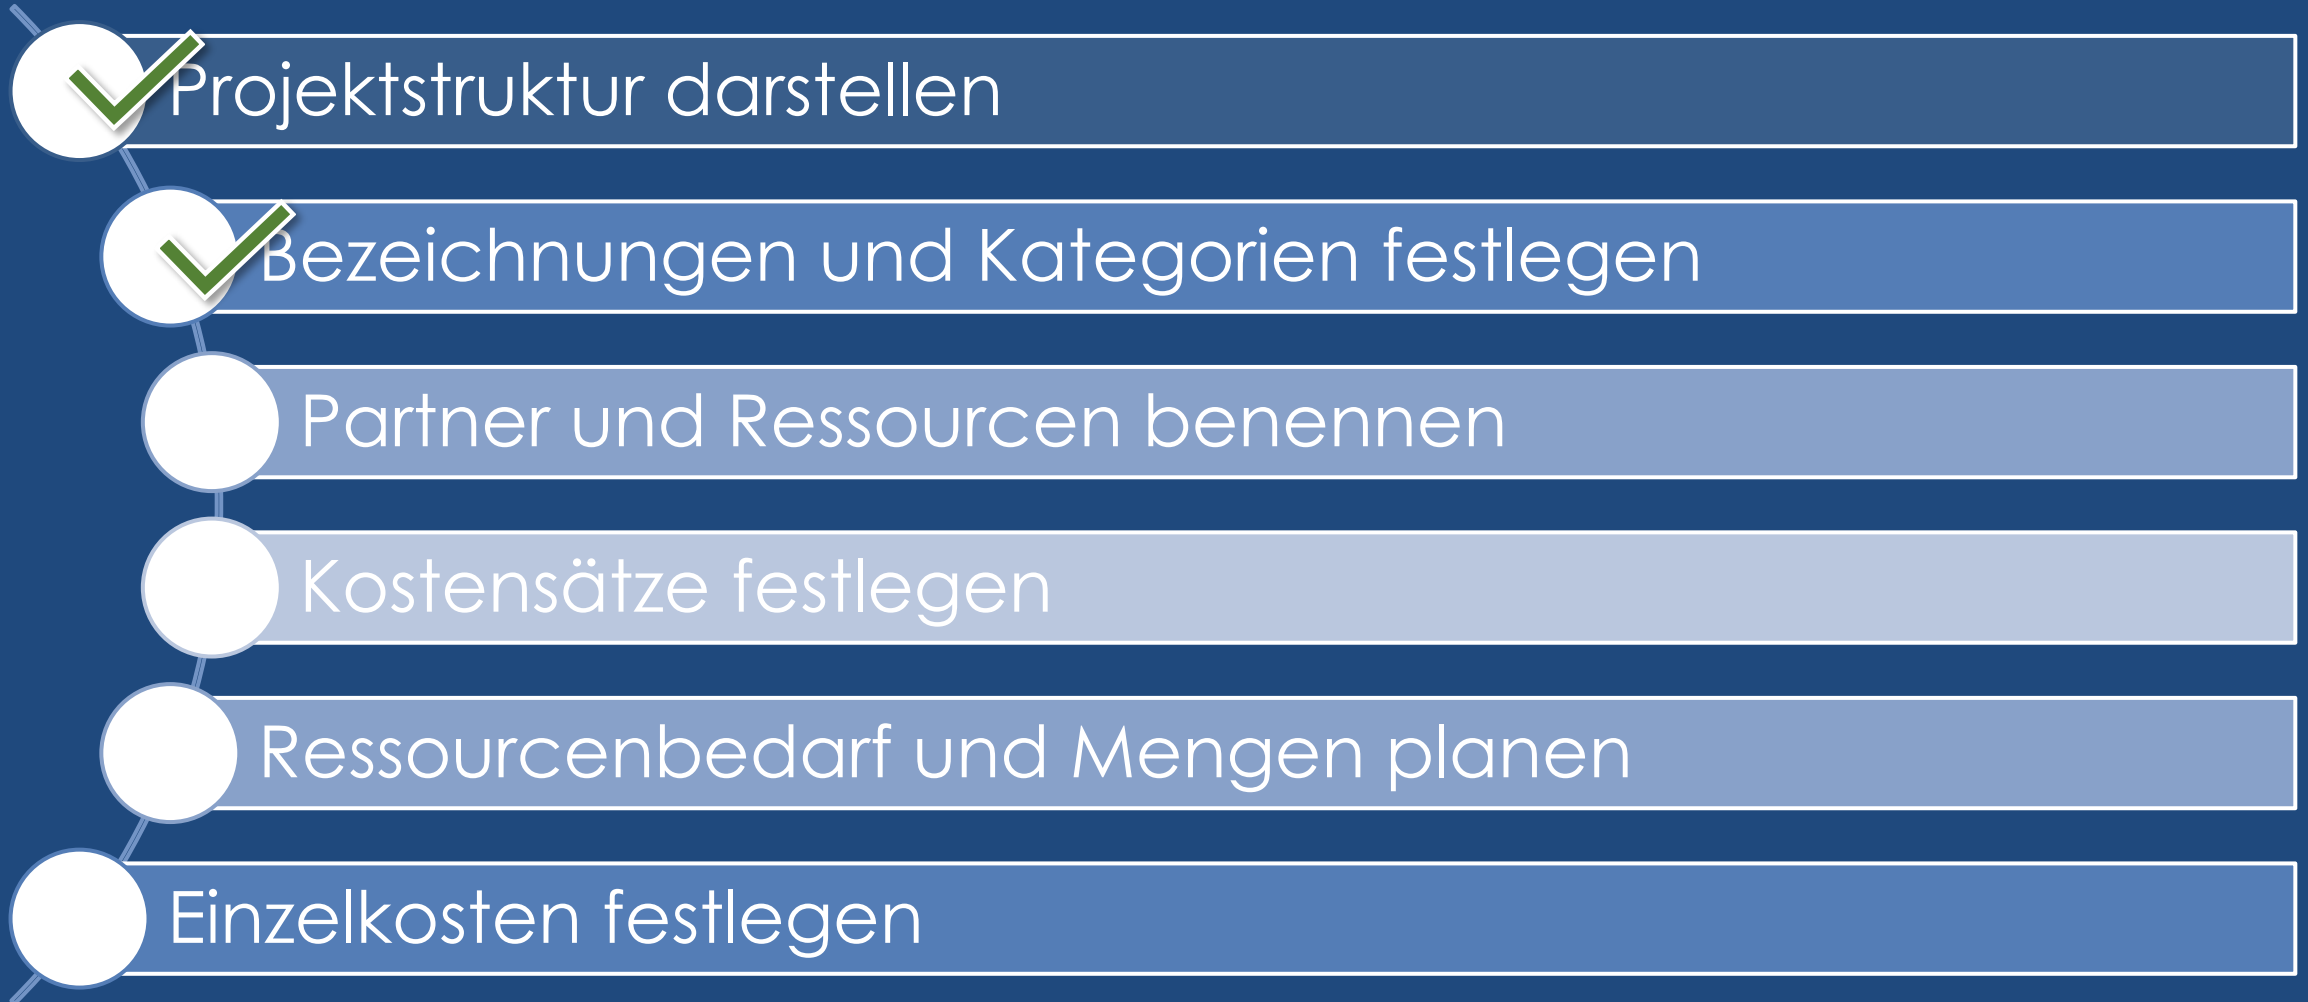

BEISPIEL BERECHNUNG PROJEKTBUDET

Übersicht Projektbudget		Marge	212.064,00 €	41%
Kostenkalkulation		Umsatzkalkulation		
Position	Kosten	Position	Umsatz	
Personalkosten	245.060,00 €	Interner Umsatz	485.424,00 €	
Partnerkosten	22.500,00 €	Partner Umsatz	30.000,00 €	
Investitionen	21.500,00 €			
Gemeinkosten	14.300,00 €			
Summe	303.360,00 €	Summe	515.424,00 €	

Aufwände Projekt				
Zusammenfassung				
Nr.	Name	Beschreibung	Kategorie	Aufwand
A	Planung	Planung des Projektes, sowie Aufgleisen der Projektmitglieder.		23,00 PT
B	Vorbereitung	Vorbereitung des Projektes mit Workshops, Meetings, ...		39,00 PT
C	Umsetzung	Umsetzung des Projektes im Rahmen der festgelegten Umfänge		47,50 PT
D	Schnittstellen	Umsetzen der Schnittstellen des Projektes		45,00 PT
E	Testing	Testen der Umsetzung und Schnittstellen		30,00 PT
F	Datenmigration	Migration von Daten für den Projektstart		15,00 PT
G	Training	Training und Schulung der entsprechenden Benutzergruppen		44,00 PT
Z	Nebenaufwände	Betreuung des Projektes durch den Auftragnehmer		160,40 PT
SUMME				403,90 PT

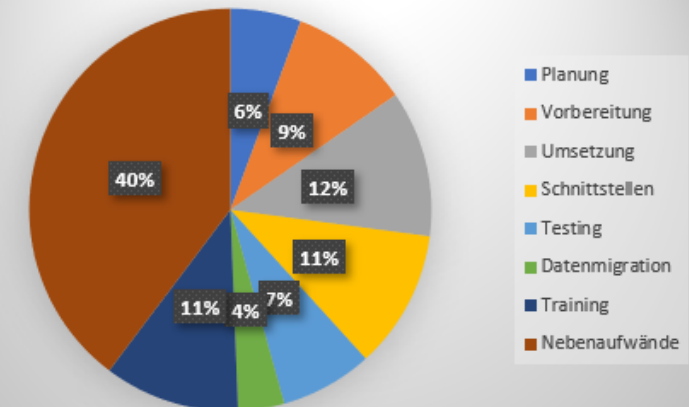

METHODEN ZUM PROJEKTCONTROLLING




MEILENSTEINTRENDANALYSE

Meilensteine

Berichtszeiträume

Abweichungen

Trends erkennen

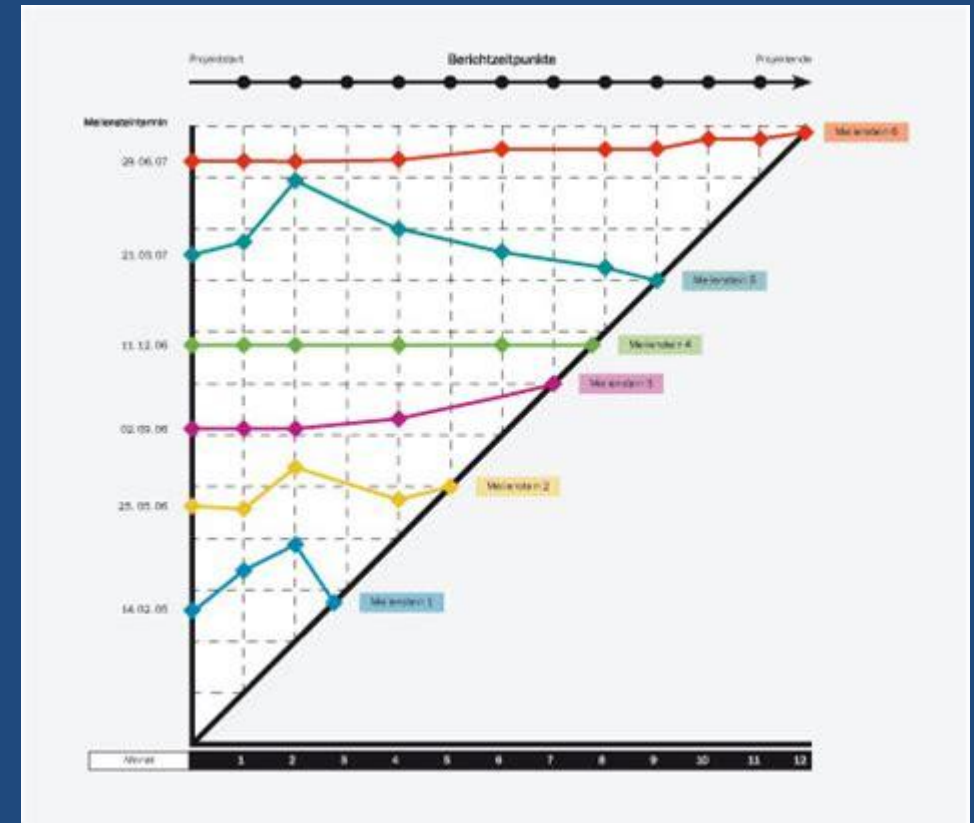

Quelle: https://projektmanagementhandbuch.de/wp-content/uploads/2017/09/PMH_Meilensteintrendanalyse_.jpg

ÜBUNG – MEILENSTEINTREND ANALYSE

RAHMENBEDINGUNGEN


- DU BIST GESCHÄFTSFÜHRER EINES KLEINEN UNTERNEHMENS. ALLE MITARBEITER SIND IN DIESEM KURS.
- DAS PROJEKT BEGINNT AM 15.09.
- ZU PROJEKTSTART VERTEILEN SICH DIE MEILENSTEINE WIE FOLGT:

Projektstart	15.09.
Ende Projektvorbereitung	12.10.
Ende Durchführung	24.11.
Ende Schulungen	28.11.
Produktivsetzung	11.12.


AUFGABE

- FOLGENDE ÄNDERUNGEN ERGEBEN SICH WÄHREND DES PROJEKTES
 - DER PROJEKTSTART VERSCHIEBT SICH AUF 15.10.
 - NACH 3 WOCHEN VERSCHIEBT SICH DAS ENDE DER PROJEKTVORBEREITUNG AUF 15.11.
 - EINE WOCHE SPÄTER VERSCHIEBT SICH DAS ENDE DER PROJEKTVORBEREITUNG AUF DEN 17.11.
 - WIEDER EINE WOCHE SPÄTER GIBT ES EINE ERNEUTE VERSCHIEBUNG AUF DEN 22.11.. DAS ENDE DER DURCHFÜHRUNG VERSCHIEBT SICH AUF DEN 30.12. DAS ENDE DER SCHULUNGEN ENDET NUN AM 08.01.
 - EINE WOCHE SPÄTER VERSCHIEBT SICH DAS ENDE DER PROJEKTVORBEREITUNG AUF 26.11.
 - MITTE DEZEMBER VERSCHIEBT SICH DAS PROJEKTENDE AUF DEN 15.01. UND SPÄTER AUF DEN 16.01.
- ERSTELLEN SIE AUS DEN ANGABEN EIN MEILENSTEINTREND DIAGRAMM

LÖSUNG – MEILENSTEINTREND ANALYSE

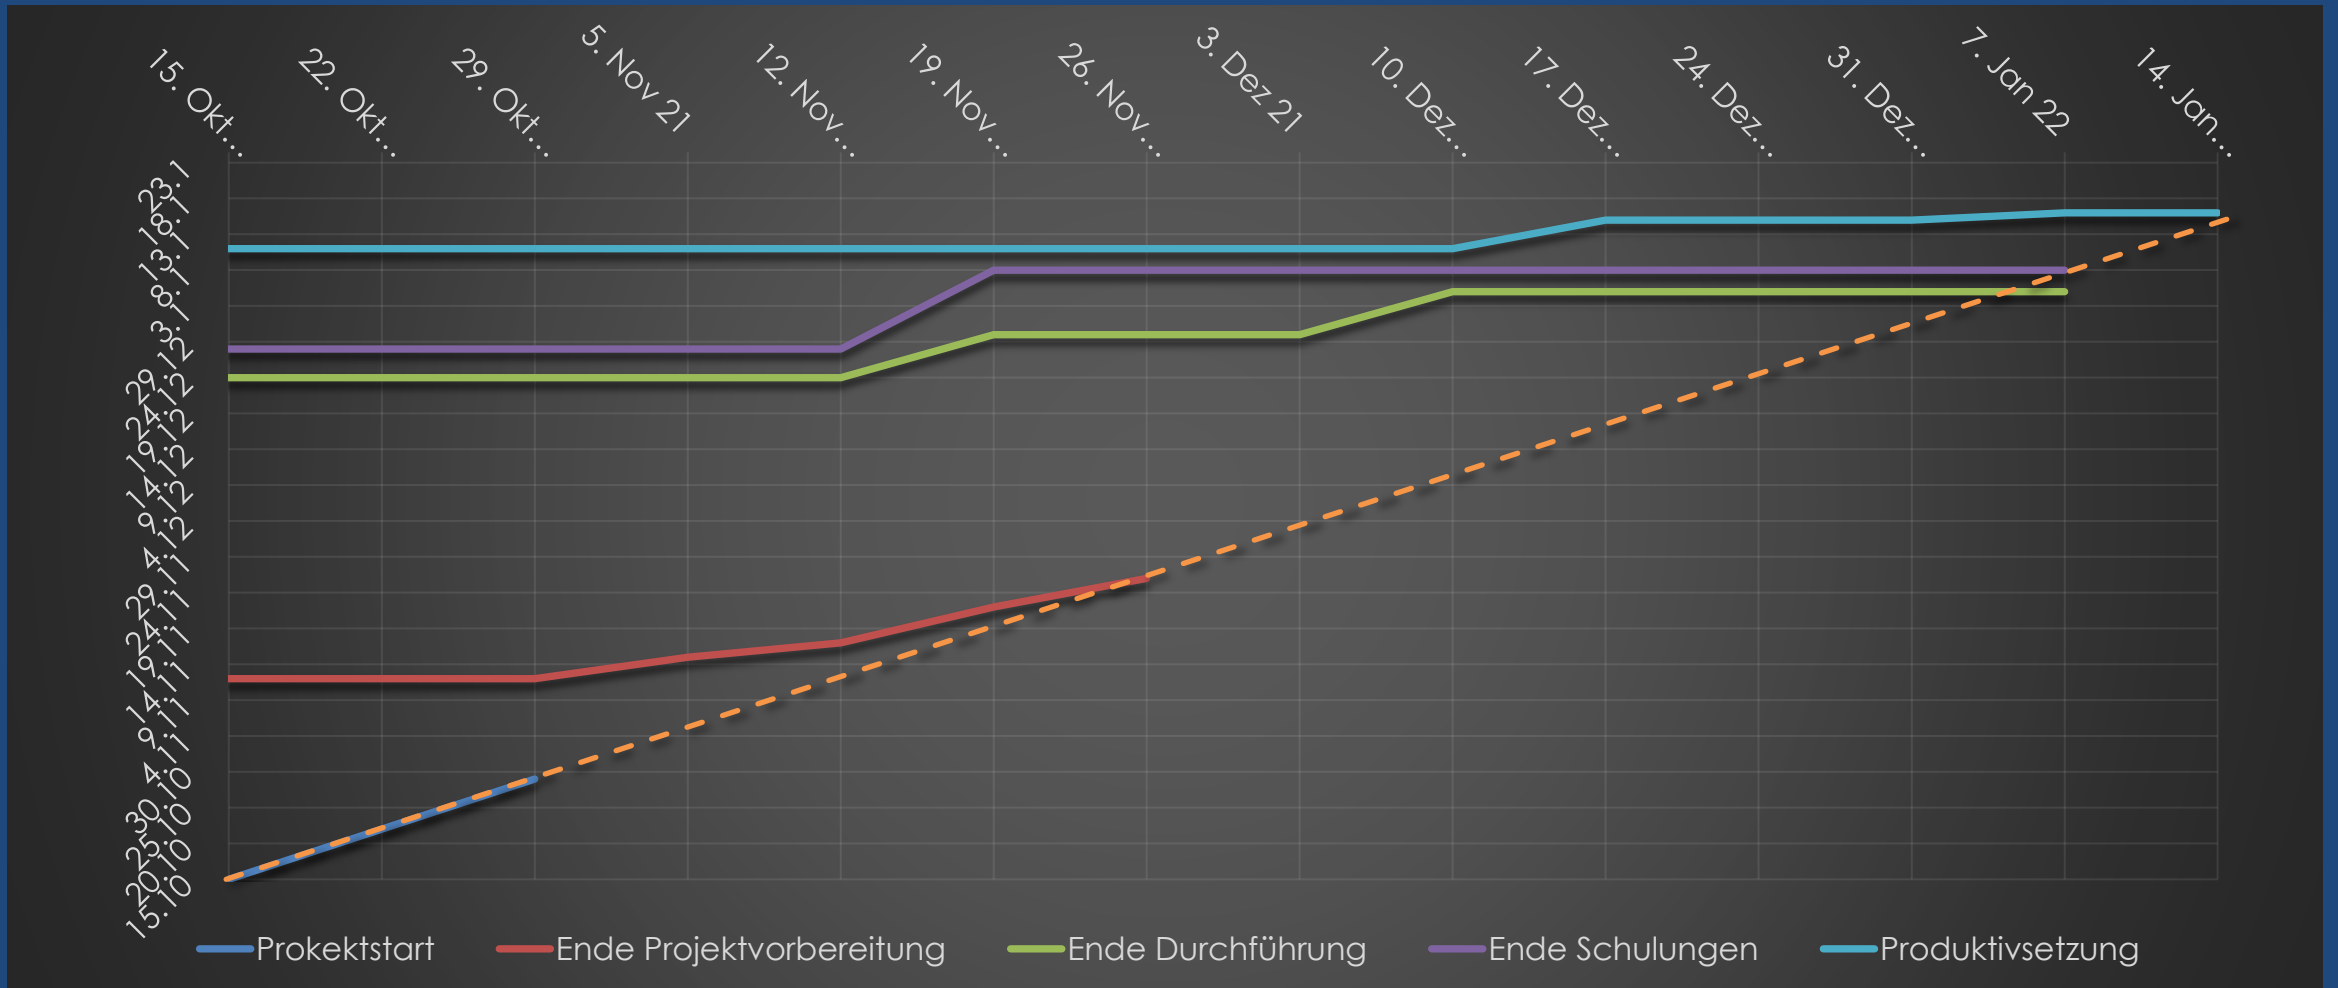

METHODEN ZUM PROJEKTCONTROLLING

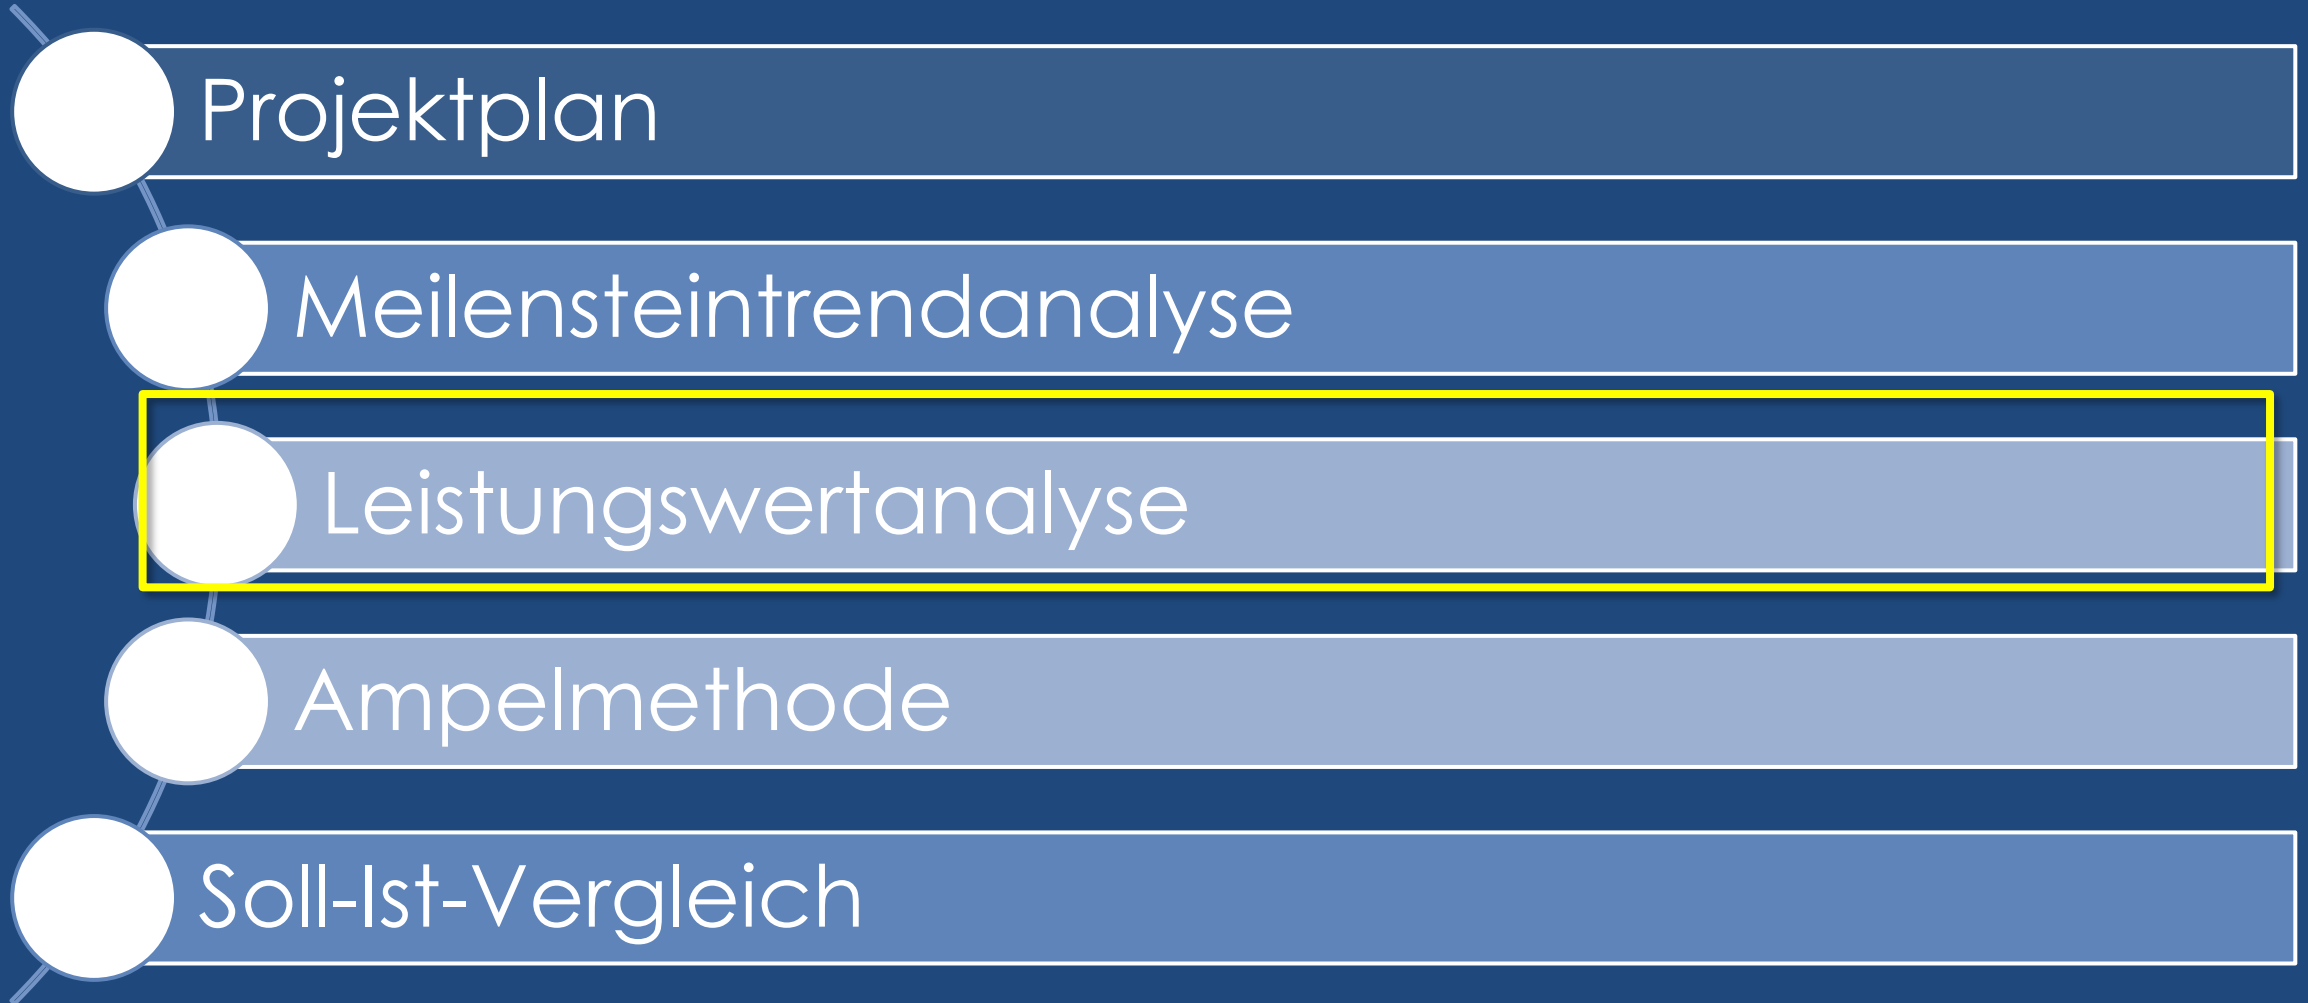

LEISTUNGSWERTANALYSE (EARNED VALUE ANALYSIS)

BESCHREIBUNG DER AKTUELLEN TERMIN- UND KOSTENSITUATION DURCH KENNZAHLEN

SCHLÜSSELWERTE:

Planwert
(*planned value*)

Istkosten
(*actual costs*)

Fertigstellungswert
(*earned value*)

ERMITTLUNG FERTIGSTELLUNGSWERT (EV)

Ermittlung
des Projektstrukturplan




Kostenkalkulation



Projektfortschritt

GRAFISCHE DARSTELLUNG

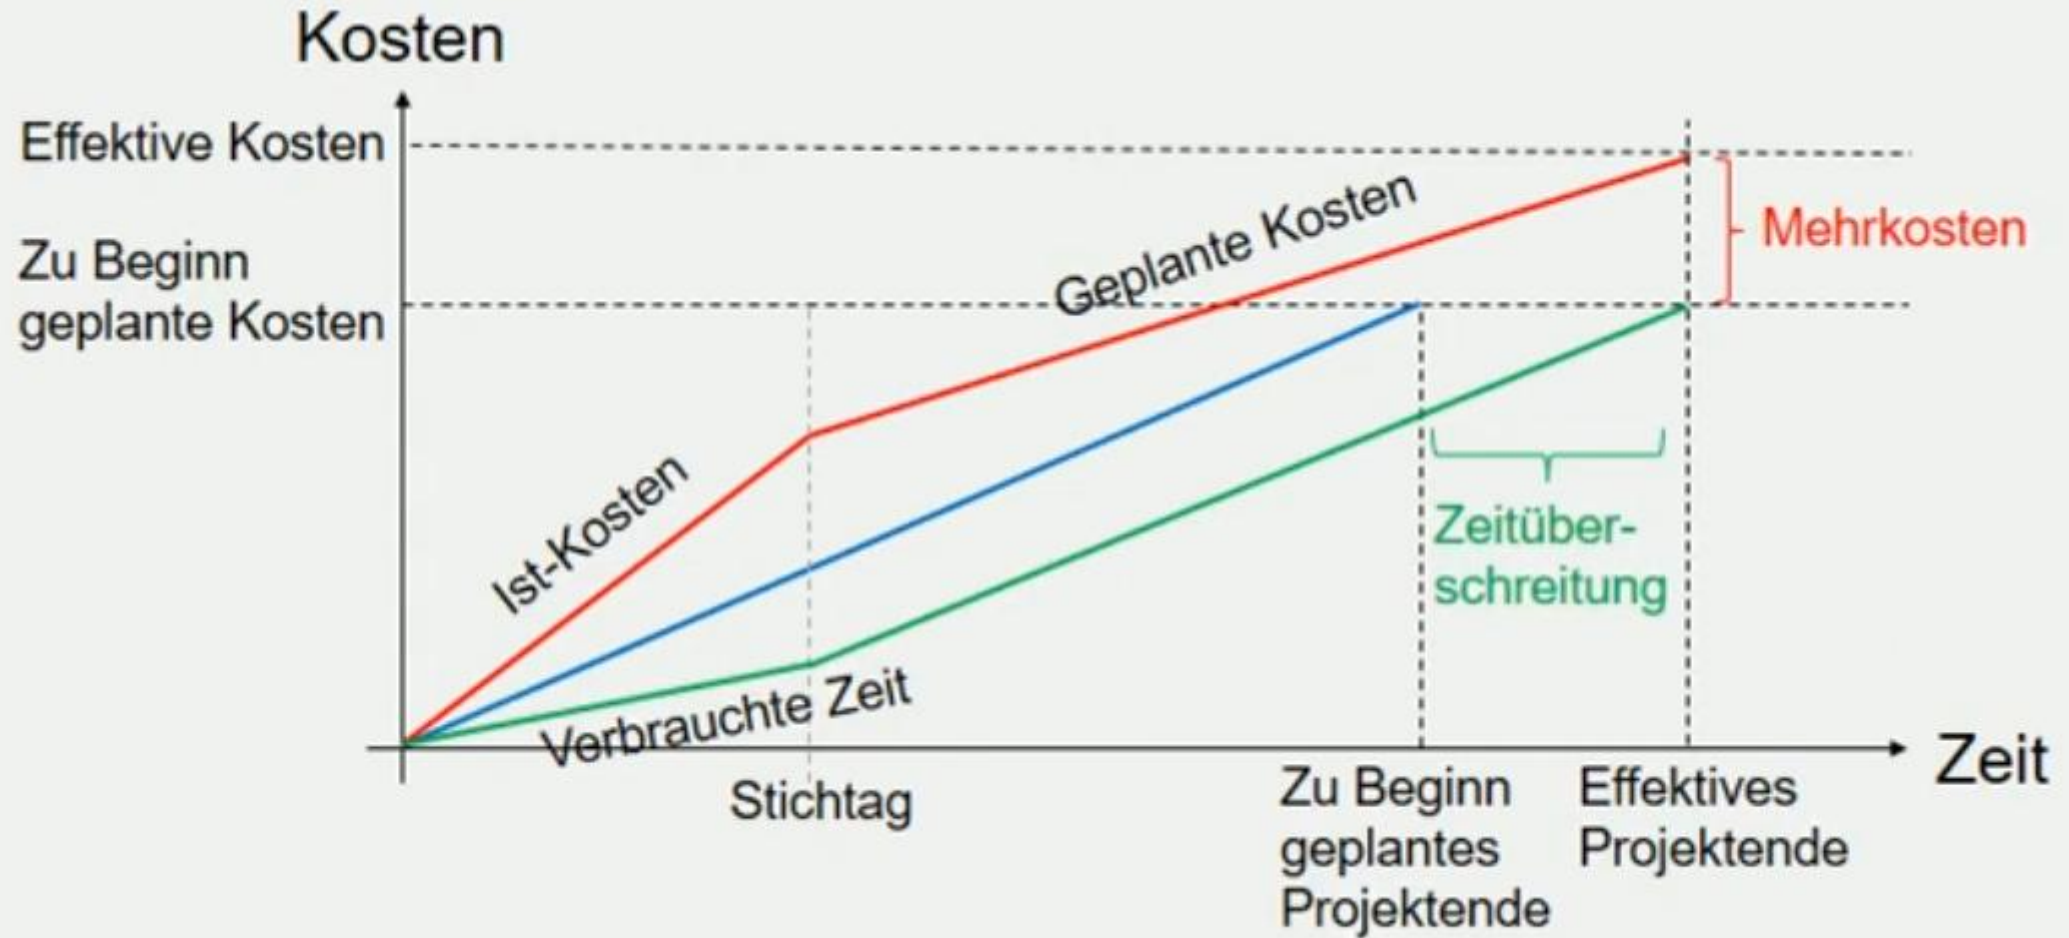

Plankosten (PC)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

Die Plankosten werden zu Beginn des Projektes in den Arbeitspaketen definiert und über die Projektdauer verteilt. Somit ergibt sich zu jedem Zeitpunkt im Projekt ein geplantes Budget, das bis dahin verbraucht sein darf.

BESPIEL PLANKOSTEN

Plankosten																		
			Planung															
Personalkosten			Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August	
Arbeitspaket	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten	Aufwand	Kosten
Planung	23	30.080,00 €	20,00 PT	26.156,52 €	3,00 PT	3.923,48 €												
Vorbereitung	39	54.600,00 €			21,00 PT	29.400,00 €	18,00 PT	25.200,00 €										
Umsetzung	47,5	53.900,00 €					15,00 PT	17.021,05 €	12,00 PT	13.616,84 €	10,50 PT	11.914,74 €	10,00 PT	11.347,37 €				
Schnittstellen	45	46.500,00 €							15,00 PT	15.500,00 €	15,00 PT	15.500,00 €	10,00 PT	10.333,33 €	5,00 PT	5.166,67 €		
Testing	30	36.000,00 €							5,00 PT	6.000,00 €	5,00 PT	6.000,00 €	5,00 PT	6.000,00 €	5,00 PT	6.000,00 €	10,00 PT	12.000,00 €
Datenmigration	15	18.000,00 €													15,00 PT	18.000,00 €		
Training	44	46.000,00 €													20,00 PT	20.909,09 €	24,00 PT	25.090,91 €
Nebenaufwände	160,4	222.844,00 €	10,40 PT	14.448,74 €	25,00 PT	34.732,54 €	25,00 PT	34.732,54 €	20,00 PT	27.786,03 €	15,00 PT	20.839,53 €	15,00 PT	20.839,53 €	25,00 PT	34.732,54 €	25,00 PT	34.732,54 €
Investitionen																		
Material	Kosten			Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten
Software Paket Entwicklung	20.000,00 €			20.000,00 €														
Büromaterial	1.500,00 €			300,00 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €
Gemeinkosten																		
Name	Kosten			Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten		Kosten
Büroräume	6.000,00 €					857,14 €		857,14 €		857,14 €		857,14 €		857,14 €		857,14 €		857,14 €
Verpflegung 1	1.000,00 €			125,00 €		125,00 €		125,00 €		125,00 €		125,00 €		125,00 €		125,00 €		125,00 €
Hotelkosten	7.300,00 €			4.000,00 €		2.000,00 €		216,67 €		216,67 €		216,67 €		216,67 €		216,67 €		216,67 €
			Summe	65.030,26 €	Summe	71.209,59 €	Summe	78.323,83 €	Summe	64.273,12 €	Summe	55.624,50 €	Summe	49.890,47 €	Summe	86.178,54 €	Summe	73.193,69 €

Istkosten (AC)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

Die Istkosten (actual cost) werden über die Variable AC erfasst. Alle bis zu einem Zeitpunkt angefallenen Kosten summiert.

BEISPIEL IST-KOSTEN

Istkosten																
		Planung														
Personalkosten		Januar			Februar			März			April			Mai		
Arbeitspaket	Kostensatz	Aufwand	Ist	Soll	Aufwand	Ist	Soll	Aufwand	Ist	Soll	Aufwand	Ist	Soll	Aufwand	Ist	Soll
Planung	1.307,83 €	22,00 PT	28.772,17 €	26.156,52 €	3,50 PT	4.577,39 €	3.923,48 €									
Vorbereitung	1.400,00 €				20,00 PT	28.000,00 €	29.400,00 €	18,00 PT	25.200,00 €	25.200,00 €						
Umsetzung	1.134,74 €							10,00 PT	11.347,37 €	17.021,05 €	15,00 PT	17.021,05 €	13.616,84 €			
Schnittstellen	1.033,33 €										12,00 PT	12.400,00 €	15.500,00 €			
Testing	1.200,00 €										5,00 PT	6.000,00 €	6.000,00 €			
Datenmigration	1.200,00 €															
Training	1.045,45 €															
Nebenaufwände	1.389,30 €	10,40 PT	14.448,74 €	14.448,74 €	25,00 PT	34.732,54 €	34.732,54 €	25,00 PT	34.732,54 €	34.732,54 €	20,00 PT	27.786,03 €	27.786,03 €			
Investitionen																
Material				Kosten			Kosten			Kosten			Kosten			Kosten
Software Paket Entwicklung			19500,00 PT	20.000,00 €												
Büromaterial			250,00 PT	300,00 €		171,43 PT	171,43 €		171,43 PT	171,43 €		171,43 PT	171,43 €			
Gemeinkosten																
Name				Kosten			Kosten			Kosten			Kosten			
Büroräume						857,14 PT	857,14 €		857,14 PT	857,14 €		857,14 PT	857,14 €			
Verpflegung 1			130,00 PT	125,00 €		135,00 PT	125,00 €		120,00 PT	125,00 €		130,00 PT	125,00 €			
Hotelkosten			4200,00 PT	4.000,00 €		1800,00 PT	2.000,00 €		200,00 PT	216,67 €		250,00 PT	216,67 €			
SUMME		32,40 PT	67.300,91 €	65.030,26 €	48,50 PT	70.273,50 €	71.209,59 €	53,00 PT	72.628,48 €	78.323,83 €	52,00 PT	64.615,66 €	64.273,12 €	0,00 PT	- €	- €

FERTIGSTELLUNGSWERT (EV)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

FERTIGSTELLUNGSWERT (EV) = PROJEKTBUDGET X
PROZENTUALER ARBEITSFortschritt

DER FERTIGSTELLUNGSWERT ERGIBT SICH WÄHREND DER
PROJEKTARBEIT. ER IST DER BETRAG FÜR DIE BISHER
ERBRACHTEN LEISTUNGEN. DAS HEIßT, DER EV STELLT DEN
ARBEITSFortschritt / FERTIGSTELLUNGSGRAD ENT-
SPRECHENDEN GESAMTWERT DES GEWERKS DAR.

BEISPIEL FERTIGSTELLUNGSWERT

Feritgstellungswert			Arbeitsfortschritt	47%	
			Fertigstellungswert	257.432,40 €	
	Zusammenfassung				
Nr.	Name	Beschreibung	Katgorie	Aufwand	Fertigstellung
A	Planung	Planung des Projektes, sowie Aufgleisen der Projektmitglieder.		23,00 PT	100%
B	Vorbereitung	Vorbereitung des Projektes mit Workshops, Meetings, ...		39,00 PT	100%
C	Umsetzung	Umsetzung des Projektes im Rahmen der festgelegten Umfänge		47,50 PT	69%
D	Schnittstellen	Umsetzen der Schnittstellen des Projektes		45,00 PT	47%
E	Testing	Testen der Umsetzung und Schnittstellen		30,00 PT	13%
F	Datenmigration	Migration von Daten für den Projektstart		15,00 PT	0%
G	Training	Training und Schulung der entsprechenden Benutzergruppen		44,00 PT	0%
Z	Nebenaufwände	Betreuung des Projektes durch den Auftragnehmer		160,40 PT	50%
SUMME				403,90 PT	47%

PLANABWEICHUNG (SV)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

PLANABWEICHUNG (SV) = FERTIGSTELLUNGSWERT (EV) –
PLANKOSTEN (PC)

IM REALEN PROJEKT IST DIE ABSOLUTE PLANERFÜLLUNG SEHR SELTEN GEGEBEN. DABEI TRITT EINE ABWEICHUNG VOM GEPLANTEN ZIEL AUF, DIE ALS PLANABWEICHUNG (SV, SCHEDULE VARIANCE) BEZEICHNET WIRD. ES GEHT BEI DER SV ALSO NICHT IN ERSTER LINIE UM EINEN KOSTENUNTERSCHIED, SONDERN UM DEN ZEITVERZUG.

KOSTENABWEICHUNG (CV)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

KOSTENABWEICHUNG (CV) = FERTIGSTELLUNGSWERT (EV)
– ISTKOSTEN (AC)

DIE KOSTENABWEICHUNG (CV, COST VARIANCE) WIRD
GEMESSEN AN DEN TATSÄCHLICHEN ISTKOSTEN DES
PROJEKTES.

ZEITEFFIZIENZ (SPI)

$$\text{ZEITEFFIZIENZ (SPI)} = \frac{\text{FERTIGSTELLUNGSWERT (EV)}}{\text{PLANKOSTEN (PC)}}$$

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

MIT DER ZEITEFFIZIENZ (SPI, SCHEDULE PERFORMANCE INDEX) DEFINIERT SICH EIN MAß, WIE WEIT EIN PROJEKT SICH ZEITLICH GESEHEN AUS DEM PLANSOLL BEFINDET. EIN WERT GRÖßER 1 DEUTET AN, DASS DER PROJEKTVERLAUF SCHNELLER VONSTATTENGEHT, ALS URSPRÜNGLICH GEPLANT. UMGEKEHRT ERGIBT EIN WERT KLEINER 1 EINEN PROJEKTVERZUG.

KOSTENEFFIZIENZ (CPI)

LEISTUNGSWERTANALYSE DEFINITIONEN

KOSTENEFFIZIENZ (CPI) = FERTIGSTELLUNGSWERT (EV) /
ISTKOSTEN (AC)

DIE KOSTENEFFIZIENZ (CPI, COST PERFORMANCE INDEX) MISST DEN WERT DER GELEISTETEN ARBEIT GEGEN DIE ISTKOSTEN. EIN WERT GRÖßER ALS 1 DEUTET AUF EINE KOSTENERSPARNIS IM PROJEKT HIN, AUF DER ANDEREN SEITE WEIST EIN WERT KLEINER ALS 1 DARAUF, DASS SICH DAS PROJEKT TEURER ENTWICKELT ALS GEPLANT.

BEISPIEL BERECHNUNGEN


Planabweichung	-21.404,40 €		Kostenabweichung	-17.386,15 €
Fertigstellungswert	257.432,40 €		Fertigstellungswert	257.432,40 €
Plankosten	278.836,80 €		Istkosten	274.818,55 €
Zeiteffizienz	92%		Kosteneffizienz	94%
Fertigstellungswert	257.432,40 €		Fertigstellungswert	257.432,40 €
Plankosten	278.836,80 €		Istkosten	274.818,55 €

Deutung:

Das Projekt weicht aktuell sowohl von Plan als auch Kosten negativ ab. Die Kosten sind aktuell aber noch das kleinere Problem.



→ **Handlungsmaßnahmen: Zuerst die Zeit in den Griff bekommen und dabei auf die Kosten achten.**

METHODEN ZUM PROJEKTCONTROLLING

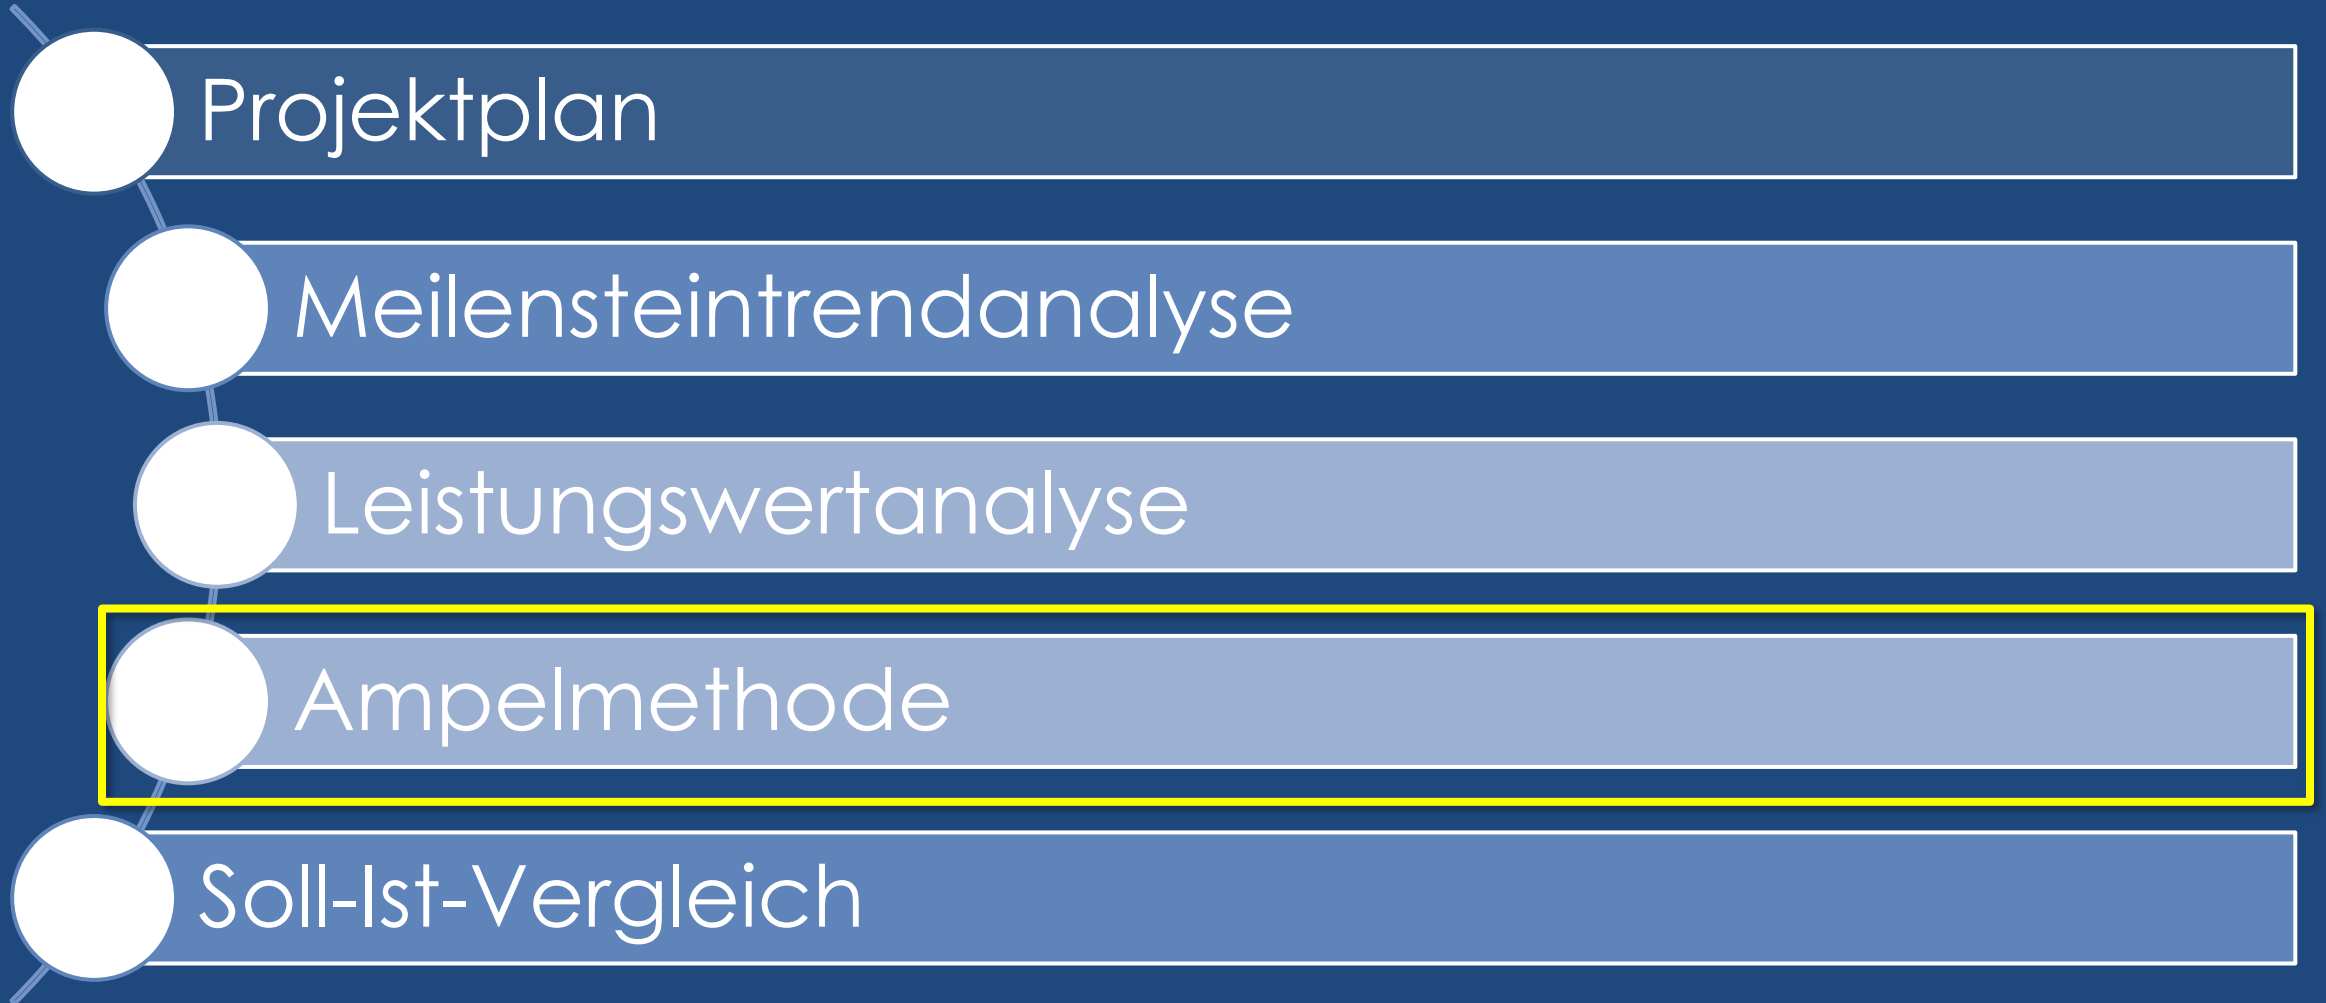


AMPEL METHODE

- REPORTING VON TEILPROJEKTEN / SELBSTREPORTING
- AGGREGATION UND SCHNELLER ÜBERBLICK – AUCH FÜR STAKEHOLDER
- ACHTUNG VOR ERWARTUNGSDRUCK UND CREEP!

	Bedeutung
Rot 	• Die überwachte Größe ist kritisch / weit außerhalb der erlaubten Toleranzgrenzen • Maßnahmen müssen (unmittelbar) ergriffen werden
Gelb 	• Die überwachte Größe ist teilweise kritisch / außerhalb der erlaubten Toleranzgrenzen • Maßnahmen sind notwendig
Grün 	• Die überwachte Größe ist unkritisch / innerhalb der Toleranzgrenzen • Maßnahmen sind nicht notwendig

METHODEN ZUM PROJEKTCONTROLLING

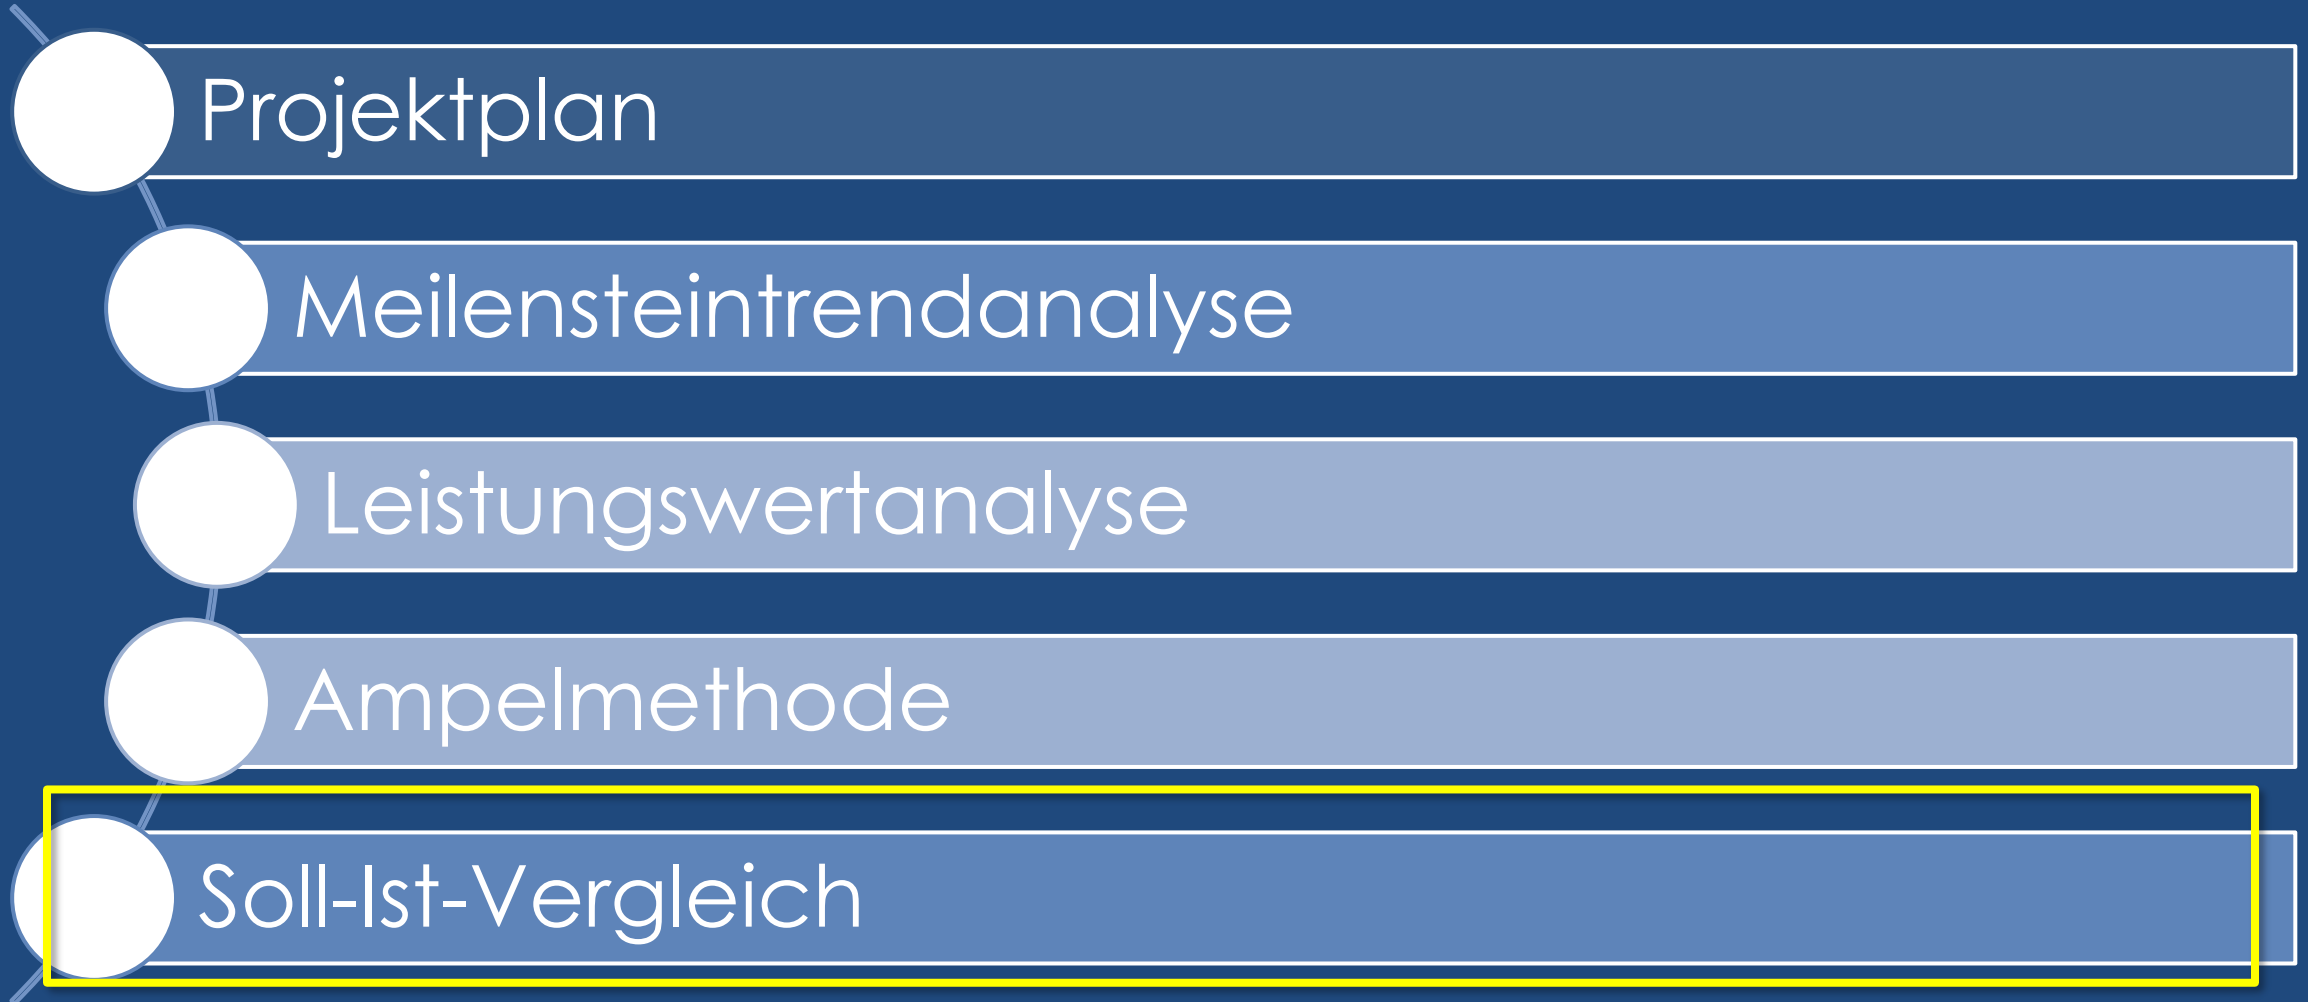

SOLL-IST- VERGLEICH

- GRUNDLEGENDE METHODE IM PROJEKTCONTROLLING
- VERGLICHEN WERDEN DABEI OFT FAKTOREN WIE AUFGEWENDETE ARBEITSZEITEN IM EIGENEN UNTERNEHMEN, REISEKOSTEN SOWIE FREMDLEISTUNGEN VON LIEFERANTEN
- DER SOLL-IST-VERGLEICH LIEGT OFT ALS PROJEKTBERICHT VOR.
- ÄHNLICH WIE BEIM AMPEL-CONTROLLING WERDEN SOLLZUSTAND UND ABWEICHUNGEN OFT MIT SIGNALFARBEN GEKENNZEICHNET.


SOLL-IST-VERGLEICH - BEISPIEL

Personalkosten	Gesamt		
Arbeitspaket	Ist Kosten	Soll Kosten	Abweichung
Planung	33.349,57 €	30.080,00 €	-3.269,57 €
Vorbereitung	53.200,00 €	54.600,00 €	1.400,00 €
Umsetzung	28.368,42 €	30.637,89 €	2.269,47 €
Schnittstellen	12.400,00 €	15.500,00 €	3.100,00 €
Testing	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Datenmigration	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Training	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nebenaufwände	111.699,86 €	111.699,86 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen			
Material	Ist Kosten	Soll Kosten	Abweichung
Software Paket Entwicklung	19.500,00 €	20.000,00 €	500,00 €
Büromaterial	764,29 €	814,29 €	50,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten			
Name	Ist Kosten	Soll Kosten	Abweichung
Büroräume	2.571,42 €	2.571,43 €	0,01 €
Verpflegung 1	515,00 €	500,00 €	-15,00 €
Hotelkosten	6.450,00 €	6.433,33 €	-16,67 €
SUMME	274.818,55 €	278.836,80 €	4.018,25 €


Soll-/Ist Vergleich



Abweichung

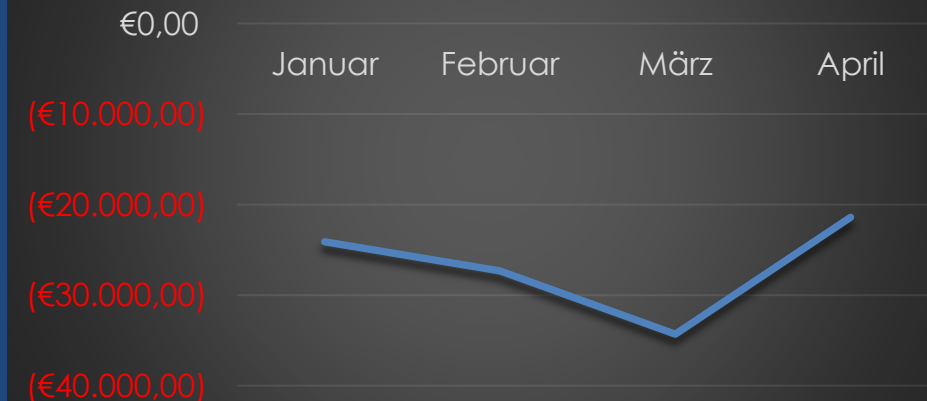

SOLL-IST-VERGLEICH - EINFACH

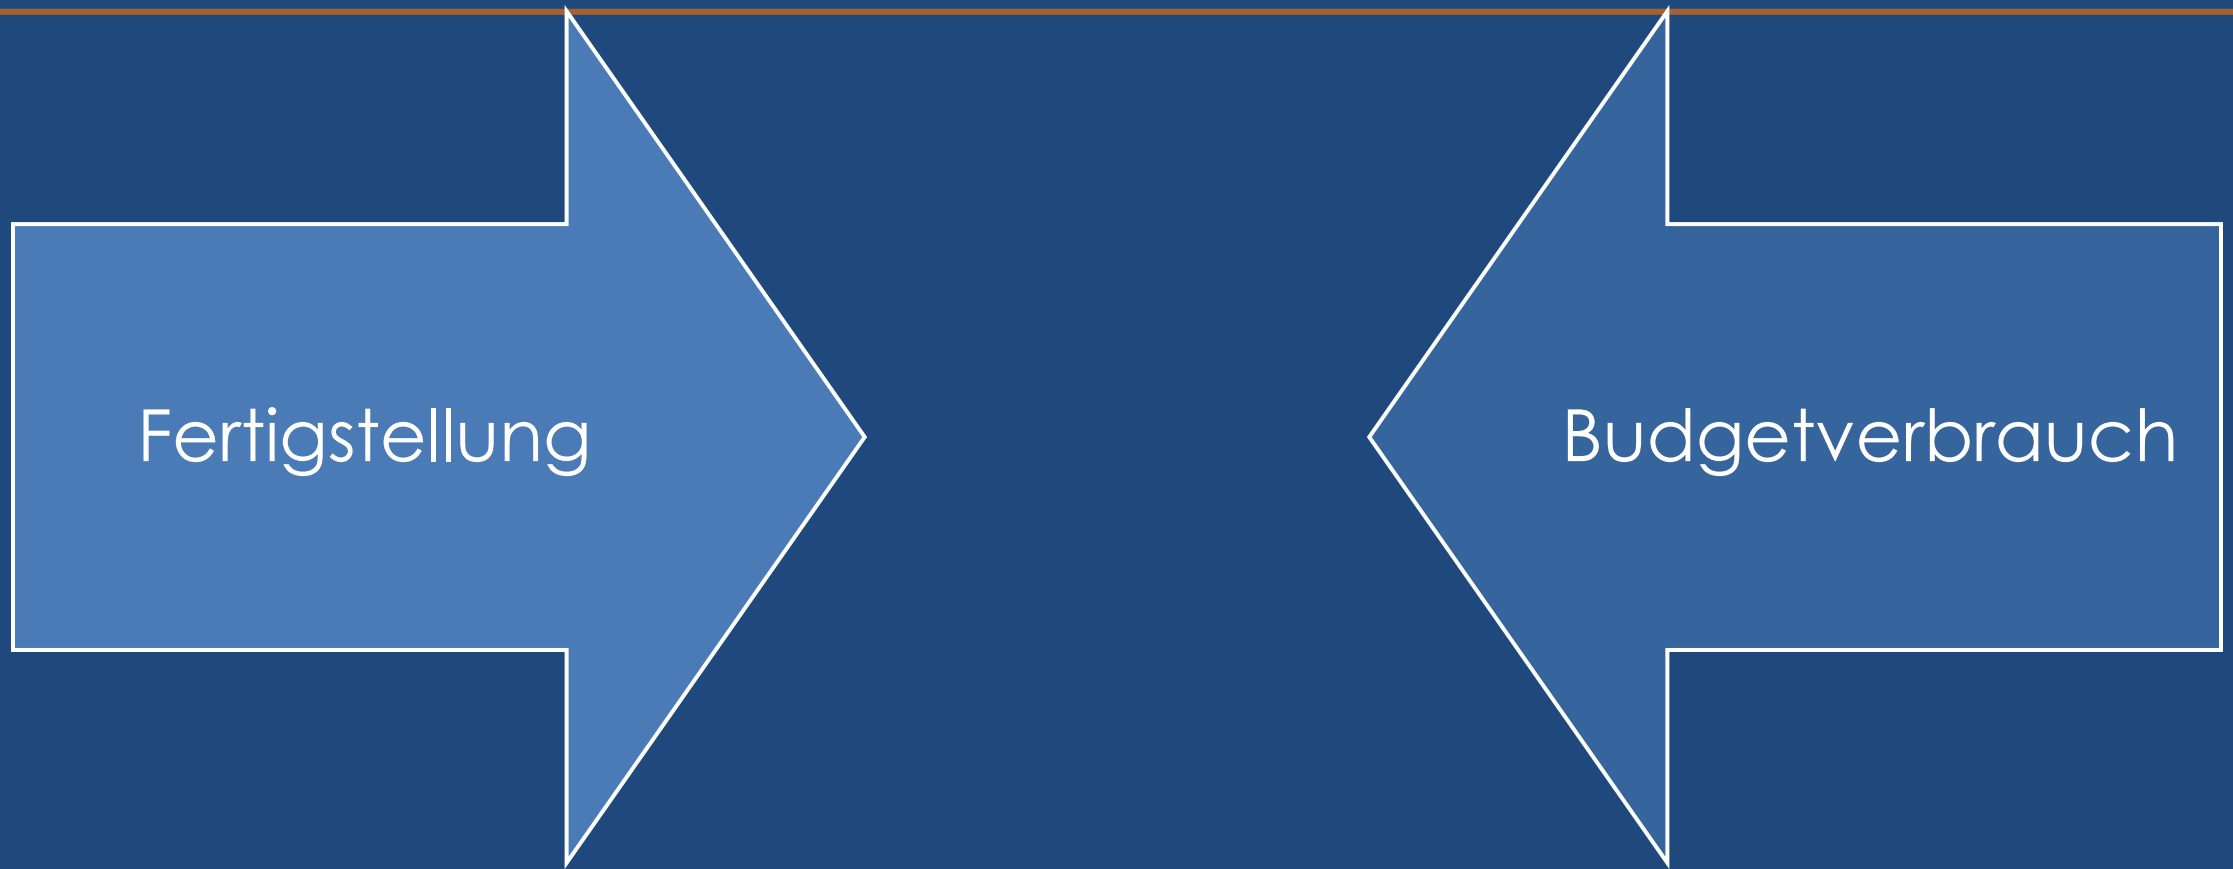


ACHTUNG – keine zeitliche Bewertung und keine Bewertung
Restbudget

SOLL-IST-VERGLEICH – EINFACHE ERWEITERUNG



Bewertung erweitert um das Restbudget

BERECHNUNG FERTIGSTELLUNGSGRAD

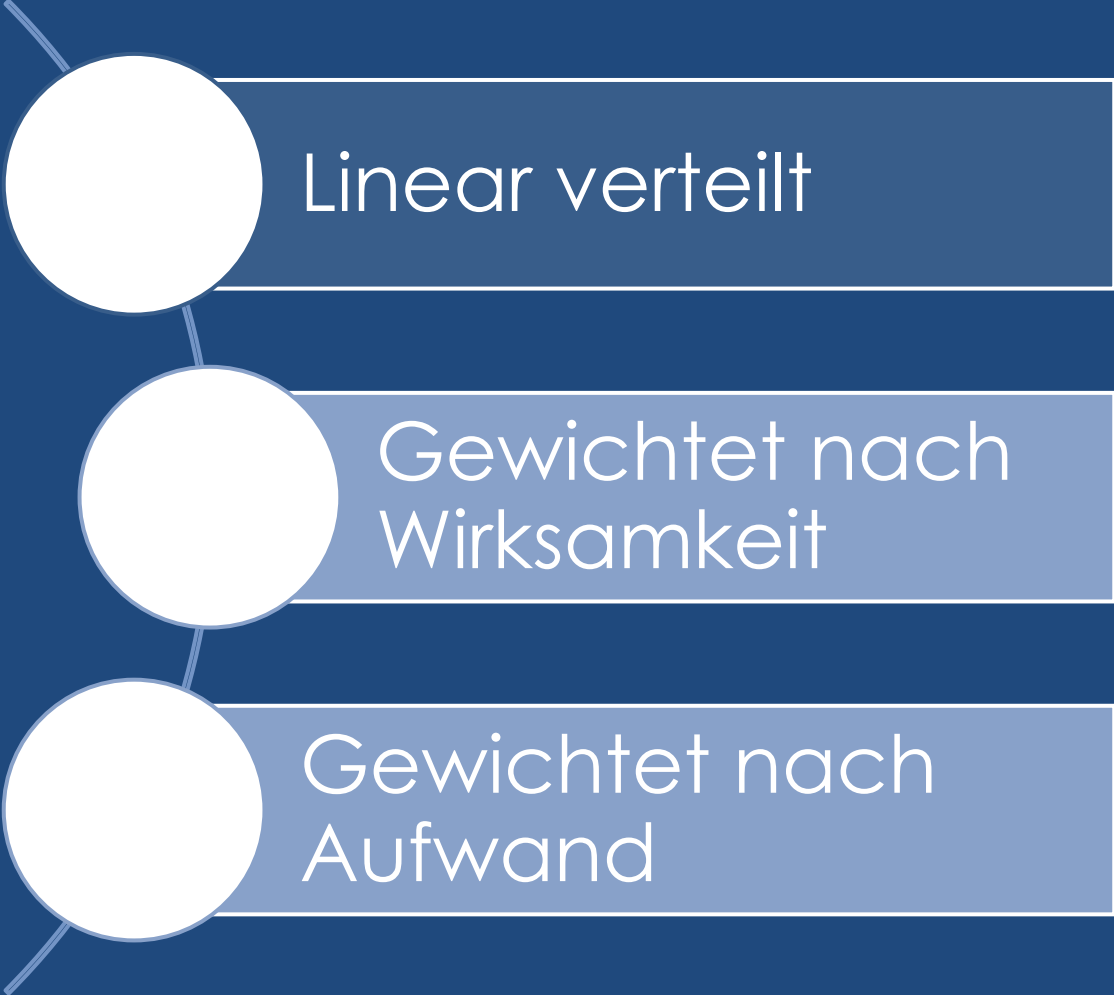

Linear verteilt

Arbeitspaket werden bewertet nach dem Bearbeitungsstand. Alle Arbeitspakete werden gleich gewichtet.

Gewichtet nach Wirksamkeit

Es wird eine Gewichtung nach dem Einfluss auf das zu liefernde Werk festgelegt. Die Berechnung erfolgt je nach dem Beitrag am Werk

Gewichtet nach Aufwand

Die Gewichtung der Arbeitspakete erfolgt anhand ihres individuellen Aufwandes. Gleich wie groß der Einfluss auf das Arbeitspaket ist.

BEISPIEL FERITGSTELLUNGSGRAD

Fertigstellungsgrad							
	Zusammenfassung						
Nr.	Name	Beschreibung	Aufwand	Bearbeitung	Beitrag	Fertigstellung 2	Fertigstellung 3
A	Planung	Planung des Projektes, sowie Aufgleisen der Projektmitglieder.	23,00 PT	100%	30%	30%	6%
B	Vorbereitung	Vorbereitung des Projektes mit Workshops, Meetings, ...	39,00 PT	100%	50%	50%	10%
C	Umsetzung	Umsetzung des Projektes im Rahmen der festgelegten Umfänge	47,50 PT	69%	200%	138%	8%
D	Schnittstellen	Umsetzen der Schnittstellen des Projektes	45,00 PT	47%	200%	93%	5%
E	Testing	Testen der Umsetzung und Schnittstellen	30,00 PT	13%	50%	7%	1%
F	Datenmigration	Migration von Daten für den Projektstart	15,00 PT	0%	200%	0%	0%
G	Training	Training und Schulung der entsprechenden Benutzergruppen	44,00 PT	0%	30%	0%	0%
Z	Nebenaufwände	Betreuung des Projektes durch den Auftragnehmer	160,40 PT	50%	40%	20%	20%
			403,90 PT	47%	100%	42%	49%


Linear
verteilt

Gewichtet
nach
Wirksamkeit

Gewichtet
nach
Aufwand

FERTIGSTELLUNGSGRAD VS. BUDGET

SOLL-IST-VERGLEICH

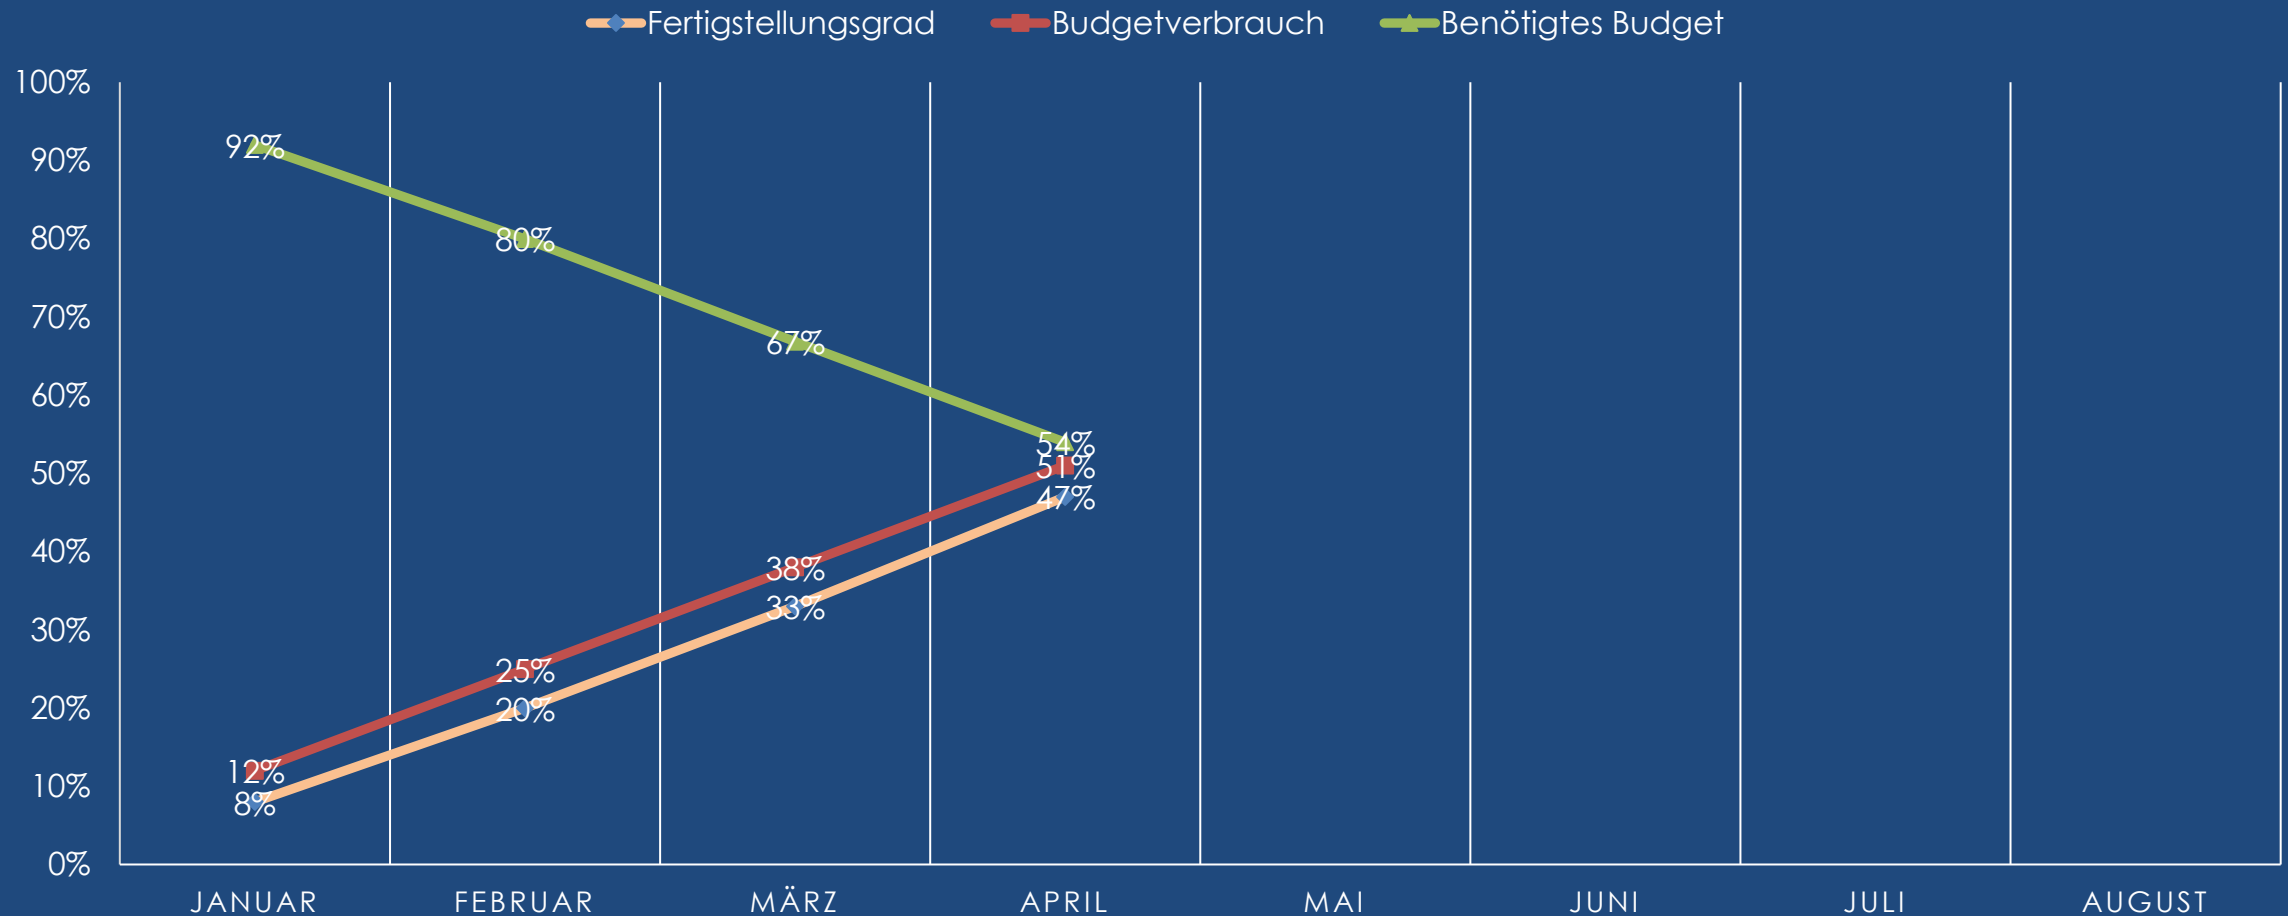

GESAMTBUDGETVERBRAUCH

BUDGETVERBRAUCH GESAMT

