

WERKZEUGE

VL 6



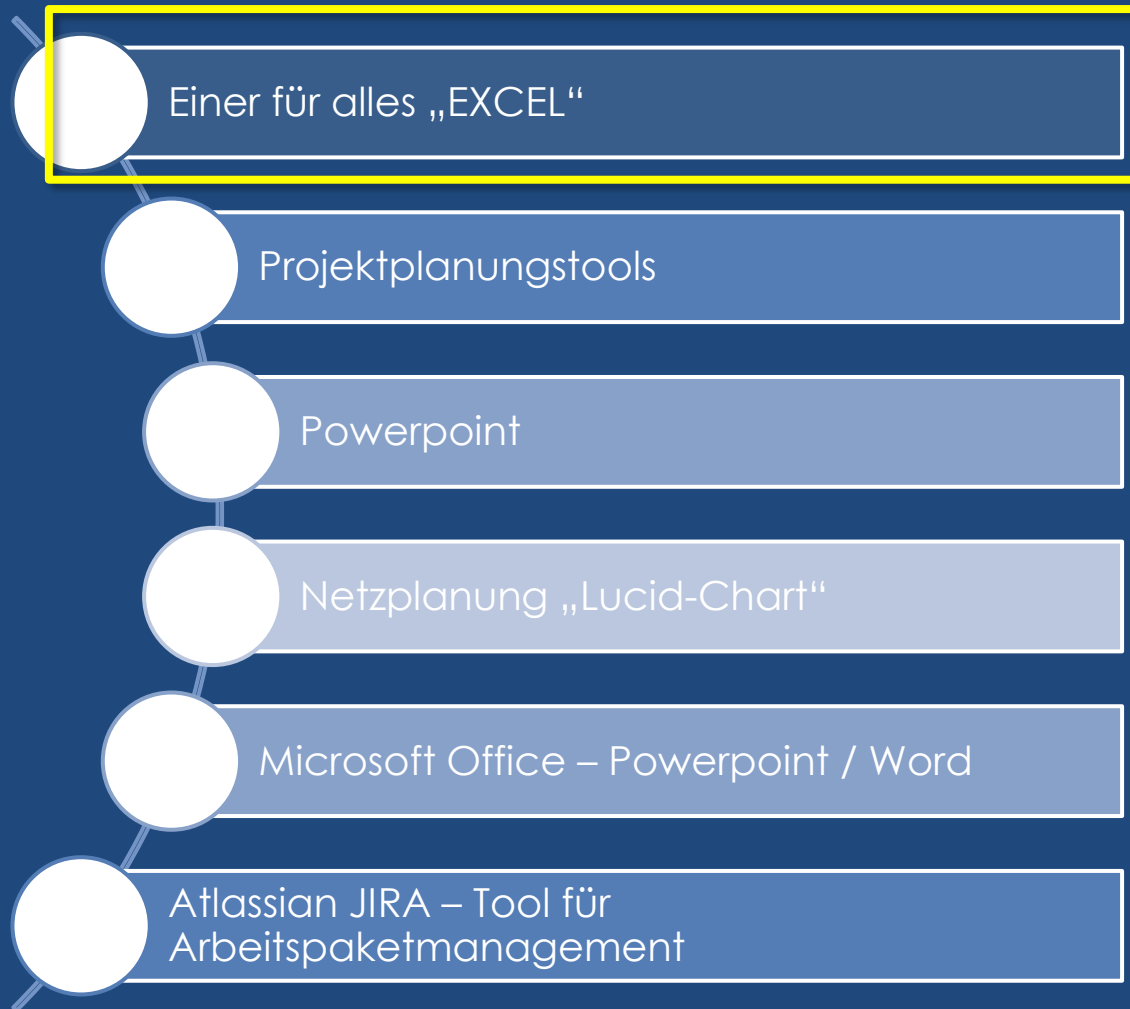
„Viele Menschen sind zum
Werkzeug ihrer Werkzeuge
geworden.“

Henry David Thoreau
amerikanischer Schriftsteller und Philosoph (12.07.1817 - 6.05.1862)

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

- Einer für alles - „EXCEL“
- Projektplanungstools
- PowerPoint
- Netzplanung „Lucid-Chart“
- Atlassian JIRA – Tool für Arbeitspaketmanagement

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT




NUTZUNG

- AUFWANDSCHÄTZUNGEN
- PROJEKTPLÄNE (EINFACH)
- TODO-LISTEN
- NETZPLANUNG
- ZEITPLANUNG
- RESSOURCENPLANUNG (EINFACH)

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

NUTZUNG

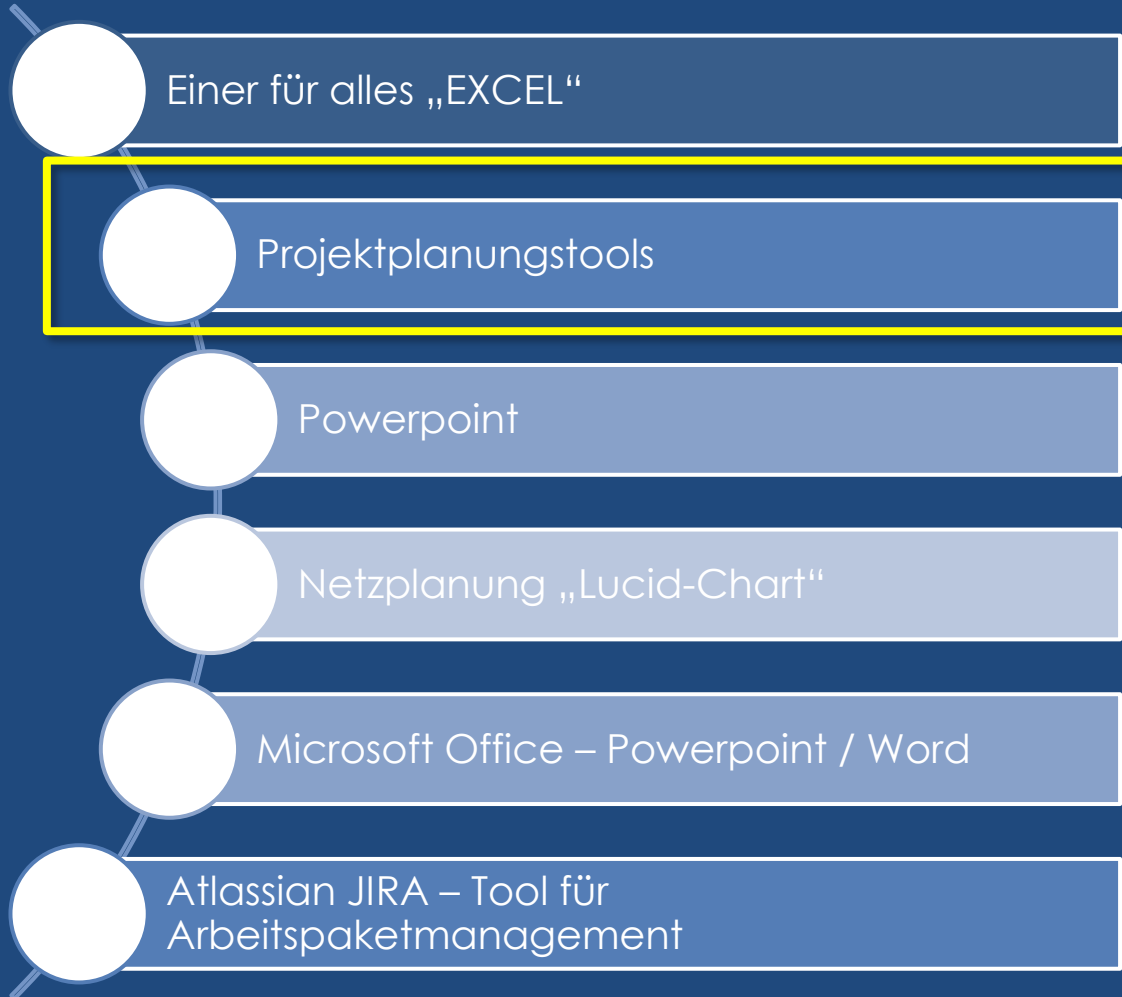- PROJEKTPLÄNE (UMFASSEND)
- TODO-LISTEN
- ZEITPLANUNG
- RESSOURCENPLANUNG (EINFACH)



WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

BEISPIELE

• KLASSISCHE WERKZEUGE

- MS PROJEKTS
- FX-PROJECT
- SMARTSHEET
- **PROJECT LIBRE**
- **GANTTPROJECT**

• MODERNE WERKZEUGE

- **OPENPROJECT**
- FREECAMP
- WRIKE
- BASECAMP
- MONDAY
- INLOOX
- JIRA
- ASANA

Einer für alles „EXCEL“

Projektplanungstools

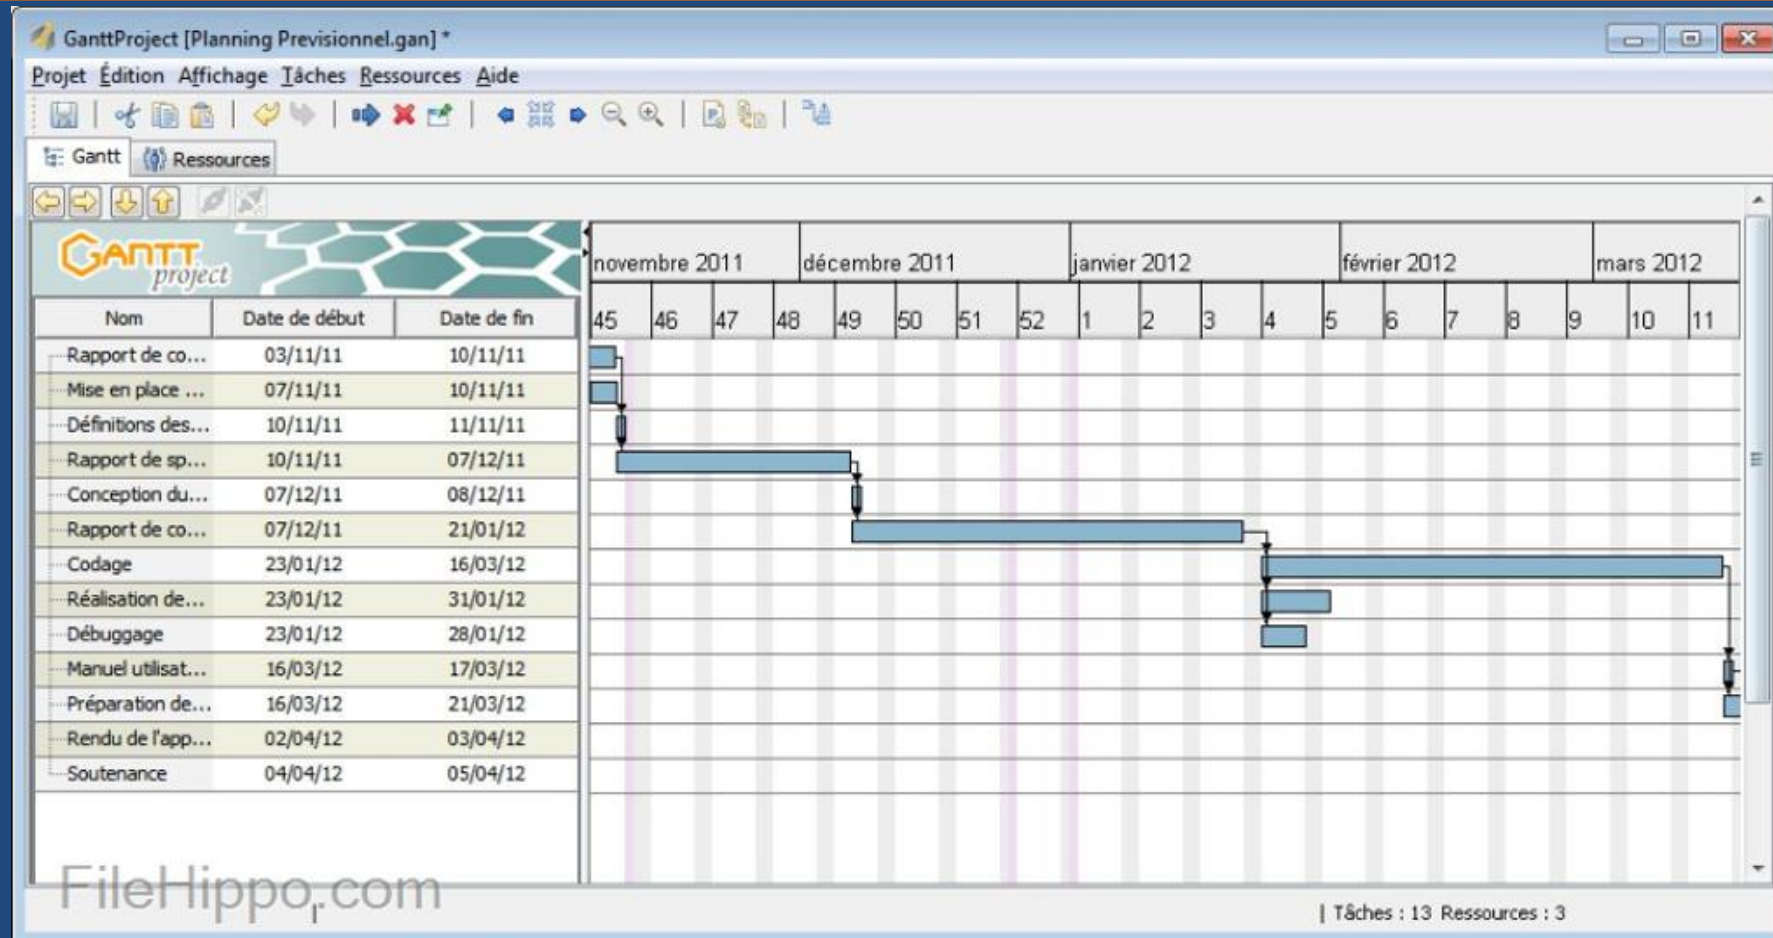
Powerpoint

Netzplanung „Lucid-Chart“

Microsoft Office – Powerpoint / Word

Atlassian JIRA – Tool für
Arbeitspaketmanagement

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT



<https://www.youtube.com/watch?v=htms1aOv9v0>

Gantt

Netzplan

PSP

Vorgang Einsatz

Vergrößern

Verkleinern

Einfügen

Kopieren

Ausschneiden

Vorgang einfügen

Löschen

einrücken

ausrücken

Verbinden

Trennen

Information

Kalender

Notiz

Ressource zuweisen

Basisplan speichern

Basisplan löschen

Suchen

Zu vorgang verschieben


Aktualisieren

Ansichten

Zwischenablage

Vorgang

		Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger
1		Planung und Administartives	40 tage	02.04.12 08:00	25.05.12 17:00	
2		Proof of Concept	15 tage	02.04.12 08:00	20.04.12 17:00	
3	I	Erstellung Businessplan	15 tage	02.04.12 08:00	20.04.12 17:00	
4	n	Businessplan erstellt	0 tage	02.04.12 08:00	02.04.12 08:00	
5	d	Erste Entwürfe erstellen	10 tage	02.04.12 08:00	13.04.12 17:00	
6	i	Materialtests durchführen	15 tage	16.04.12 08:00	04.05.12 17:00	5
7	c	Modellbau für Testzwecke	15 tage	07.05.12 08:00	25.05.12 17:00	6
8	a	Erster Test	0 tage	25.05.12 17:00	25.05.12 17:00	1
9	t	Start Investorensuche	0 tage	31.05.12 08:00	31.05.12 08:00	8
10	O	Investorensuche	24 tage	31.05.12 08:00	03.07.12 17:00	9
11	r	Recherche nach potentiellen Investoren	4 tage	31.05.12 08:00	05.06.12 17:00	
12	s	Akquise	15 tage	06.06.12 08:00	26.06.12 17:00	11
13	p	Präsentationen durchführen	5 tage	27.06.12 08:00	03.07.12 17:00	12
14	a	Ausreichend Sponsorenverträge vorhanden	0 tage	03.07.12 17:00	03.07.12 17:00	10
15	l	Start Baugenehmigung	0 tage	10.07.12 08:00	10.07.12 08:00	14
16	t	Baugenehmigung	14 tage	10.07.12 08:00	27.07.12 17:00	15
17		Prüfung ob Baugenehmigung erforderlich	4 tage	10.07.12 08:00	13.07.12 17:00	
18		ggfs. Baugenehmigung beantragen	10 tage	16.07.12 08:00	27.07.12 17:00	17
19		ggfs. Baugenehmigung erteilt	0 tage	27.07.12 17:00	27.07.12 17:00	16
20		Start Design / Entwurf	0 tage	27.07.12 17:00	27.07.12 17:00	19
21		Design/Entwurf	15 tage	30.07.12 08:00	17.08.12 17:00	20
22		Design technisch optimieren	10 tage	30.07.12 08:00	10.08.12 17:00	
23		Design vertriebstechnisch ergänzen	3 tage	10.08.12 08:00	14.08.12 17:00	22EE+2 tage
24		technische Zeichnungen anfertigen	5 tage	13.08.12 08:00	17.08.12 17:00	23EA-2 tage
25		Zeichnungen fertig	0 tage	17.08.12 17:00	17.08.12 17:00	21
26		Beginn Bau Einzelkomponenten	0 tage	17.08.12 17:00	17.08.12 17:00	25
27		Bau Einzelkomponenten	15 tage	20.08.12 08:00	07.09.12 17:00	26

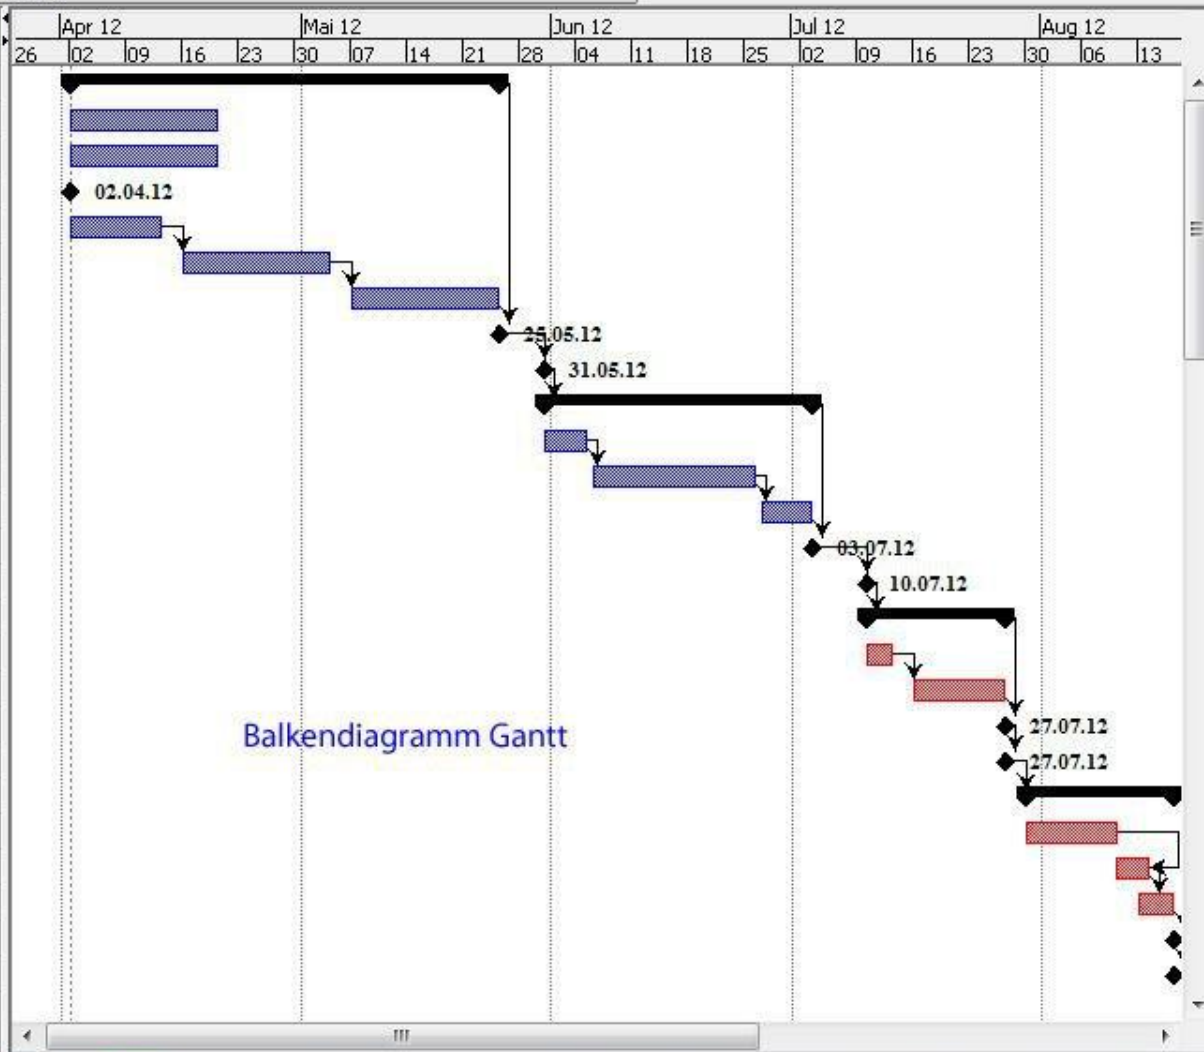

MY TASKS

INBOX

DASHBOARD

Search

Website launch

Board

Conversations

Calendar

Progress

Files

Apollo Enterpris...

+7

+

Public to Marketing

Backlog

Final QA

Dec 30

12

Forms submit data properly

3

Videos have updated branding

Dec 29

Internal links across pages

External links across pages

1

Ready to do

CSS/HTML validated

Dec 19

Tracking codes inserted

Dec 2

2

Format web copy into code

Dec 19

Cross-browser testing

Dec 21

2

Mobile-friendly site parallels

In progress

CSS is optimized

Tomorrow

Sync with Google Analytics

Nov 30

6

SEO keyword optimizations

Dec 1

13

Cookies notice

Dec 5

1

Favicon renders properly

Dec 7

Web copy reviewed

Done

Font and image licensing

Nov 30

Page hierarchy

Tomorrow

22

Sharing icons updated and working

Monday

Scripts and images are optimized

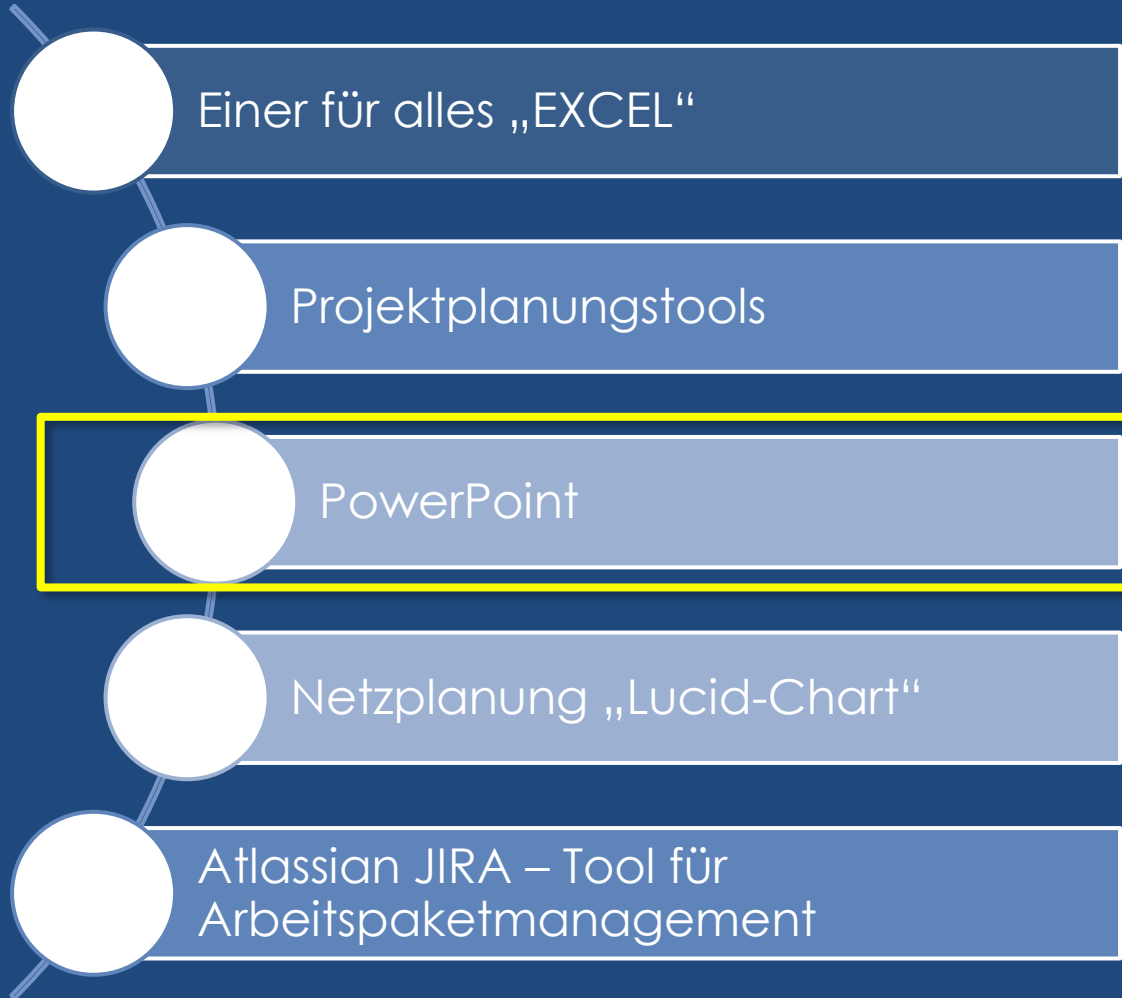
+ Add column

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

POWERPOINT

- NUTZUNG

- PROJEKTSTATUSBERICHT
- ÜBERSICHT PROJEKTPLAN (ADDIN)
- PRÄSENTATIONEN



WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

LUCID-CHART / MS VISIO / ...

- NUTZUNG = DIAGRAMME ALLER ART

- NETZPLÄNE
- ZEITPLÄNE
- PROZESSABLÄUFE
- ORGANIGRAMME
- SKIZZEN
- ...

Einer für alles „EXCEL“

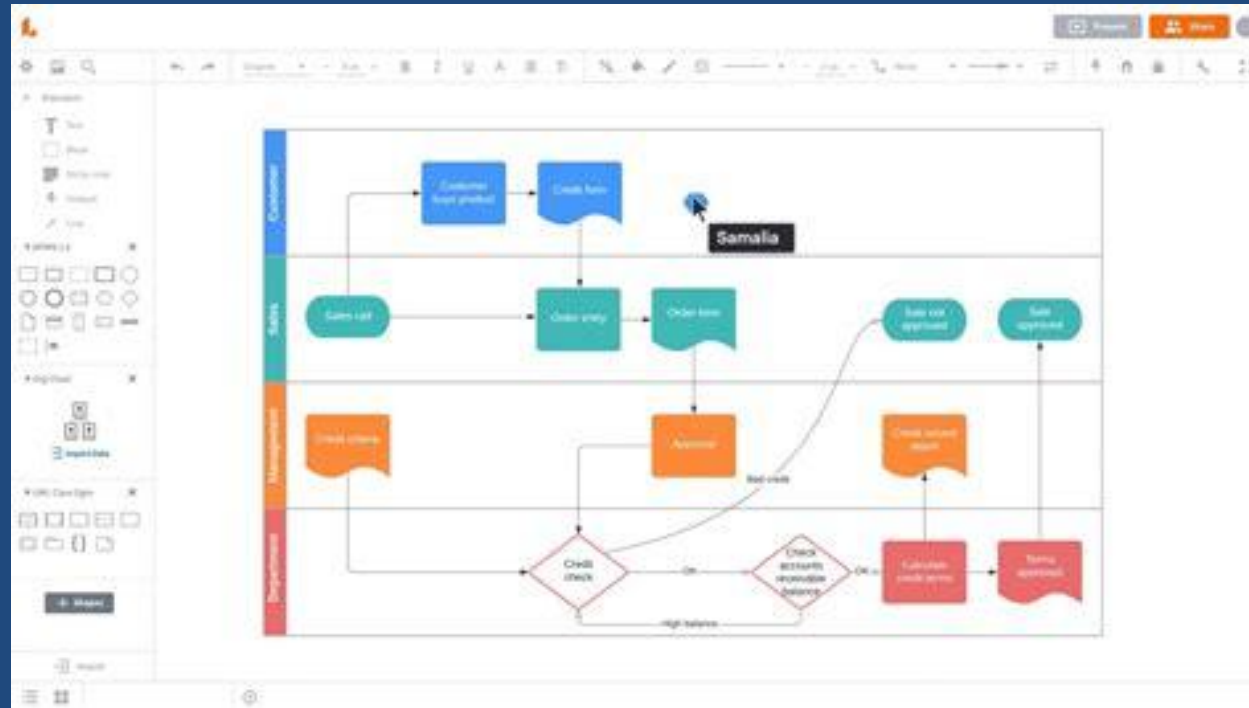
Projektplanungstools

PowerPoint

Netzplanung „Lucid-Chart“

Atlassian JIRA – Tool für
Arbeitspaketmanagement

WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT



WERKZEUGE IM PROJEKTMANAGEMENT

BEISPIELE – JIRA

• VORTEILE

- PLANUNGS- UND CONTROLLING ARBEITSPAKETE
- EINFACH ZU HANDHABEN
- IDEAL FÜR AGILE METHODEN
- WEB-APP / MOBILE APP

• NACHTEILE

- KOMPLETTE PROJEKTPLANUNG NICHT IM FOKUS
- EINFACH RESSOURCENPLANUNG



🏠

Support Customers using Mobile

Details

Financials

Resource Plan

Work Plan ▾

Reporting ▾

📁

+

+

−

←

→

↺

↻

📅

🕒

View: Planning ▾

🔍

📄

📅

📊

🔍

🔍

🔄

🔍

Schedule ▾

WBS		Name	Status	Duration	Start	Due	Effort	Assigned	Dec 2021		
		Support Customers using Mobile	In Progress	212 days	12/06/2021	09/27/2022	2016 hours		05 Dec	12 Dec	1
1		Scope	In Progress	8 days	12/06/2021	12/15/2021	64 hours				
1.1		Determine project scoping	Completed	1 day	12/06/2021	12/06/2021	8 hours				
1.2		Secure core resources	In Progress	3 days	12/07/2021	12/09/2021	24 hours	EB			
1.3		Secure project sponsorship	In Progress	2 days	12/10/2021	12/13/2021	16 hours	GB			
1.4		Define preliminary resources	Not Started	2 days	12/14/2021	12/15/2021	16 hours	JB			
1.5		Scope complete	Not Started	0 days	12/15/2021	12/15/2021	0 hours				
2		Analysis/Software Requirements	In Progress	19 days	12/16/2021	01/11/2022	152 hours				

Tasks ▾

New Item

ALL ACTIVITIES

Add Activity

NOT STARTED (1) <

IN PROGRESS (1) <

COMPLETED (1) <

DEFERRED (0) <

WAITING FOR SOMEONE ELSE <

Get final approval for resources

Validate resource list

Create a list of potential resources

List of Resource out of vacation

Ü08 - ÜBUNG – WERKZEUGE

RAHMENBEDINGUNGEN

- WIR SIND WIEDER IN DER PLANUNG UNSERES CRM PROJEKTS

AUFGABE

- WELCHE 3 WERKZEUGE SOLLTEN IN DEM PROJEKT VERWENDET WERDEN?
- WELCHE 2 WERDEN AUSGESCHLOSSEN?

PROJEKTABSCHLUSS


PROJEKTABSCHLUSS

- LETZTE PHASE EINES PROJEKTS
- FESTSTELLEN, DASS ZIELE ERREICHT WURDEN – LETZTER MEILENSTEIN
- OFFENE PUNKTE DOKUMENTIEREN
- AUCH NICHT ERFOLGREICHE PROJEKTE MÜSSEN ABGESCHLOSSEN WERDEN
- ÜBERGABE BEI EXTERNEN PROJEKTEN
- KANN FÜR FEEDBACK UND LEARNINGS GENUTZT WERDEN



PROJEKTABSCHLUSSBERICHT

- ENTHÄLT:
 - PROJEKTZIELE UND VORGABEN
 - WICHTIGE LIEFERGEGENSTÄNDE
 - ERZIELTE ERGEBNISSE
 - LESSONS LEARNED
 - FINANZÜBERSICHT



AI IM PROJEKTMANAGEMENT

ANWENDUNGSFÄLLE

- ROUTINETÄTIGKEITEN IM PM
 - MEETINGPROTOKOLLE
- HILFE BEI DER DOKUMENTENFLUT
 - DATENERFASSUNG
 - NACHVERFOLGUNG
 - BERICHTERSTATTUNG
- SCHWIERIGKEITEN BEI KOMPLEXEN AUFGABEN
 - DATENQUALITÄT RIESEN PROBLEM
 - REPRODUZIERT FEHLER DER VERGANGENHEIT
- WENIG IMPACT AUF ZWISCHENMENSCHLICHES

USE CASES OF AI IN PROJECT MANAGEMENT



PROJEKTMANAGEMENT FÜR STUDIERENDE

UND WAS BRINGT MIR DAS GANZE JETZT FÜR MEIN STUDIUM?



Zeit ist Geld.

Benjamin Franklin

WAS HABEN WIR ALLES GEMACHT?

LERNEINHEITEN UND INHALTE

LEHR- UND LERNEINHEITEN

Projektmanagement

PRÄSENZZEIT

27

SELBSTSTUDIUM

47

Definition von Projekt und Projektmanagement - Projektauftrag - Projektziele - Anforderungen - Wirtschaftlichkeit - Machbarkeit - Risikomanagement - Projektaufbauorganisation - ggf. Teamfähigkeit - Projektablauforganisation - Phasenkonzepte - Vorgehensmodelle sowie deren Integration in Projektmanagement - Agiles Projektmanagement - Netzplantechnik - Projektstrukturplan - Aufwandsschätzung - Terminplan - ggf. Ressourcenplan - ggf. Kostenplan - Projektdurchführung und -controlling - Fortschrittskontrolle - ggf. erster Überblick über Qualitätssicherung - ggf. Berichtswesen - Projektsteuerung - Projektabschluss - ggf. Projektmanagement-Werkzeuge - Fallbeispiele

WAS DAVON KÖNNEN WIR IM STUDIUM ANWENDEN?



WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Projektziele

- BEI GROßEN, UNÜBERSICHTLICHEN AUFGABEN
- ZIELE DEFINIEREN – NICHT INS BLAUE HINEINARBEITEN
- SICH SELBST KLAR WERDEN, WAS MAN ERREICHEN MÖCHTE
- SMART

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Machbarkeit

- GERADE BEI PARALLELEN AUFGABEN UND HOHER WORKLOAD
- ANSATZ ZUM PRIORISIEREN UND EINSCHÄTZEN VON MÖGLICHKEITEN

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Risikomanagement

- WELCHE RISIKEN ERGEBEN SICH AUS DER AUFGABENSTELLUNG?
- WER ÜBERNIMMT WELCHES RISIKO? WER TRÄGT VERANTWORTUNG?
- WIE WIRKEN SICH DIE RISIKEN AUF DIE GESTELLTE AUFGABE AUS?

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



- ZUSAMMENSTELLEN DES PROJEKTTEAMS – AUCH NACH SKILLS UND WER MIT WEM KANN
- VERTEILEN DER ROLLEN
- FESTLEGEN VON VERTRETUNGSREGELN
- DHBW STUDIUM IST TEAMARBEIT

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Terminplanung

- ÜBERSICHT FÜR FERTIGSTELLUNG ON-TIME
- VERSCHIEDENE METHODEN FÜR DIE ZEITPLANUNG
 - GANT-CHART
 - TODO-LISTE
 - KANBAN-BOARD
 - TIMEBOXING

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?

Terminplanung

- ÜBERSICHT FÜR FERTIGSTELLUNG ON-TIME
- VERSCHIEDENE METHODEN FÜR DIE ZEITPLANUNG
 - GANT-CHART
 - TODO-LISTE
 - KANBAN-BOARD
 - TIMEBOXING

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



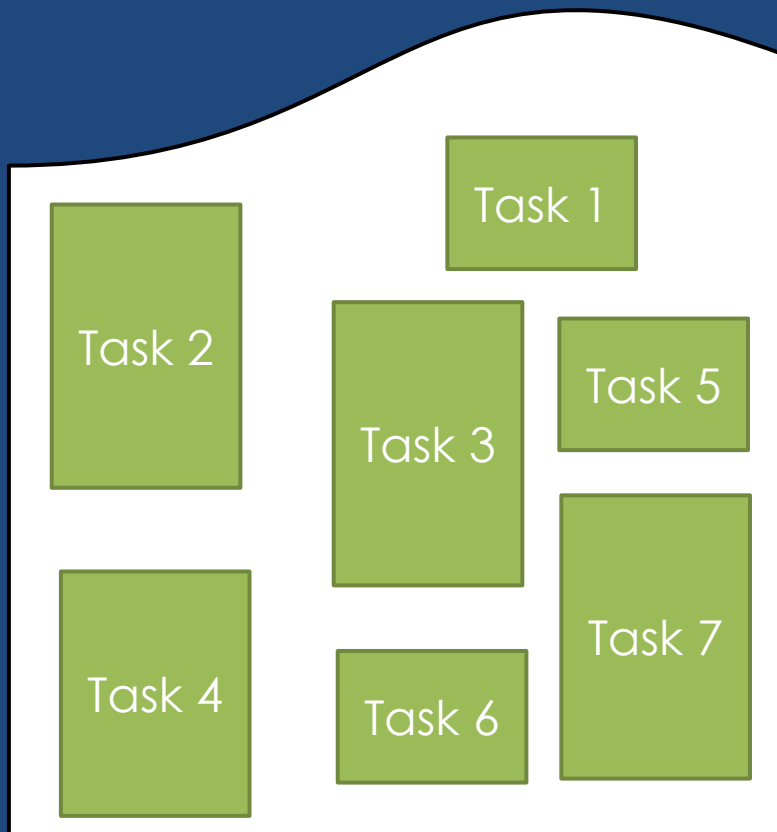
Terminplanung

TIMEBOXING

TIMEBOXING IST EINE TECHNIK DER PROJEKTPLANUNG. EINE TIMEBOX IST HIERBEI EIN FESTER ZEITRAHMEN FÜR DAS PROJEKT ODER EINEN VORGANG IM PROJEKT.

WAS WIRD GEMACHT?


TIMEBOXING









Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Task 1	Task 1	Task 1	Task 1	Task 1	Task 1	
					Task 2	
					Task 3	
					Task 4	
					Task 5	
					Task 6	
					Task 7	
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6
						Task 7
						Task 1
						Task 2
						Task 3
						Task 4
						Task 5
						Task 6

WAS WIRD GEMACHT?

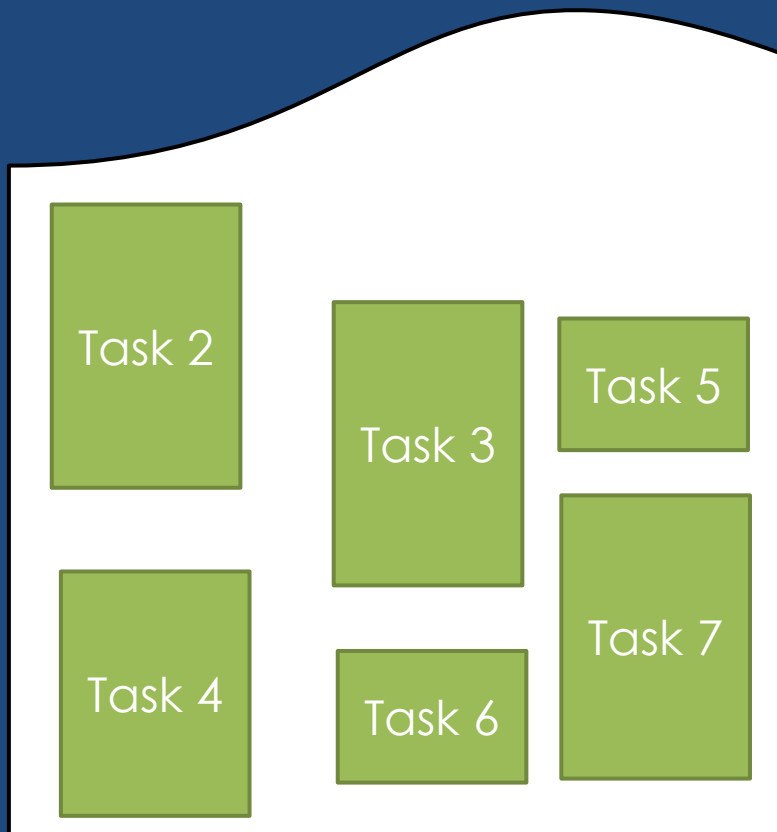
TIMEBOXING






Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						
						
						
						
						
						

WAS WIRD GEMACHT?

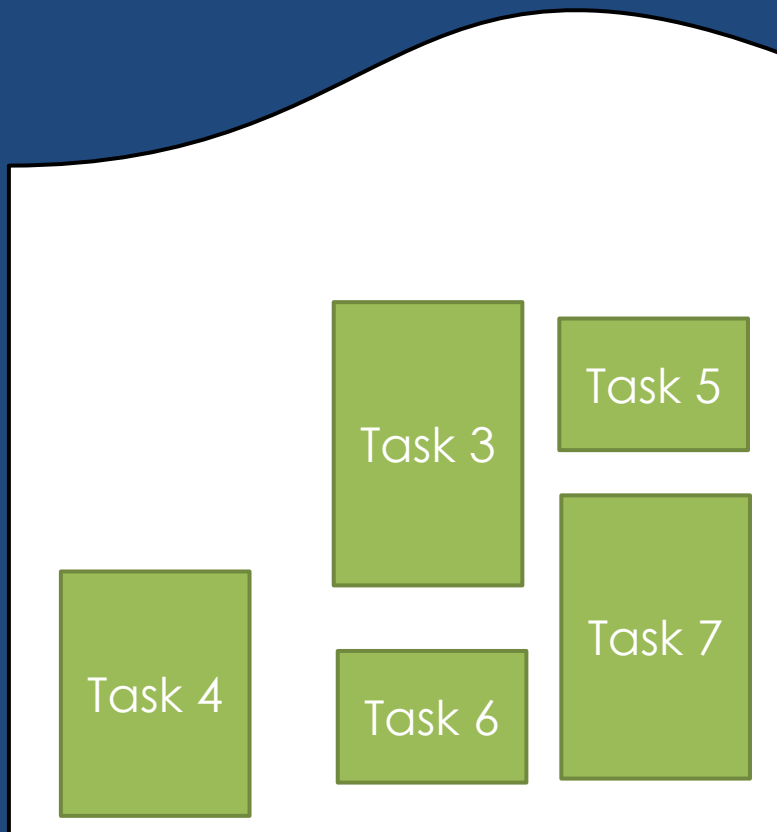
TIMEBOXING













Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						
						
						
						
						
						

WAS WIRD GEMACHT?

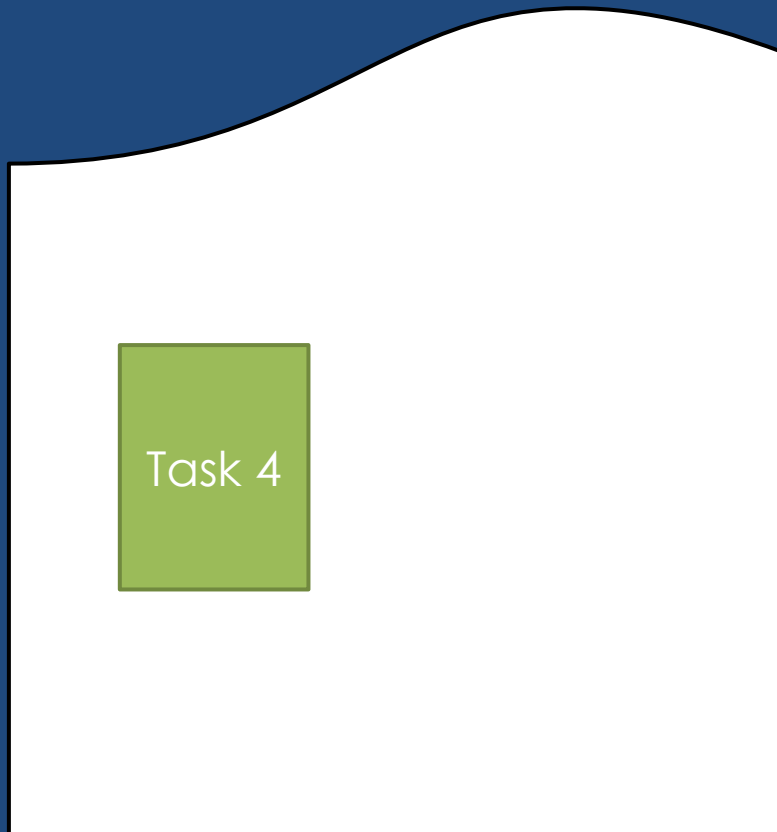TIMEBOXING



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					 	
						
						
						

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?

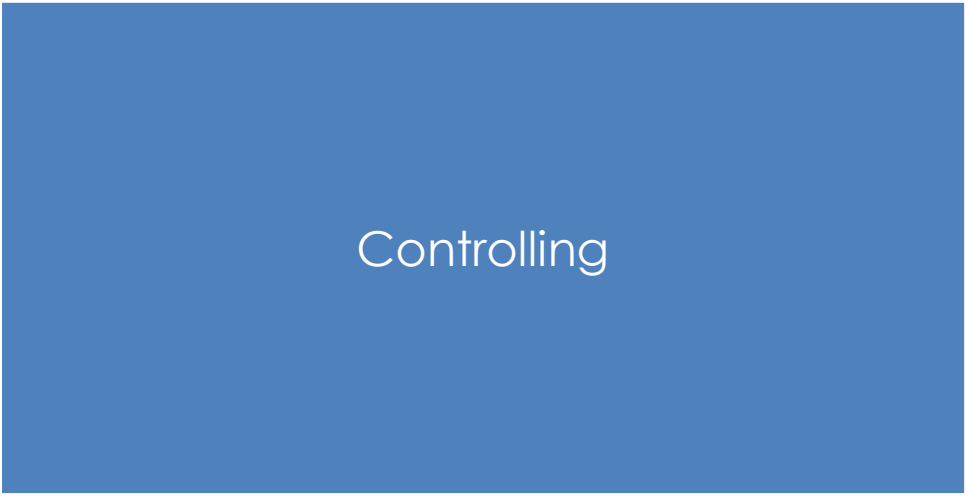


Terminplanung

VORTEILE:

- KLARE UND GENAUE PLANUNG DER AUFGABEN
- BEI VERSCHIEBUNGEN BEWUSSTE ENTSCHEIDUNGEN
- KEIN VERPASSEN VON AUFGABEN MEHR

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Controlling

- STEUERN UND LENKEN DER AUFGABEN – FRÜHWARNSYSTEM
- KORRIGIEREN DER PLANUNG UND AUFWÄNDE WENN NÖTIG
- AM BALL BLEIBEN – ABER NICHT ÜBERTREIBEN

WOFÜR KANNST DU DAS BRAUCHEN?



Werkzeuge

- PLÄNE UND VORGEHENSWEISEN DOKUMENTIEREN
- ÜBERBLICK BEHALTEN
- PASSENDE WERKEZUGE FÜR AUFGABEN WÄHLEN
